


Michoacán

Modernización Carretera Zitácuaro-Maravatío

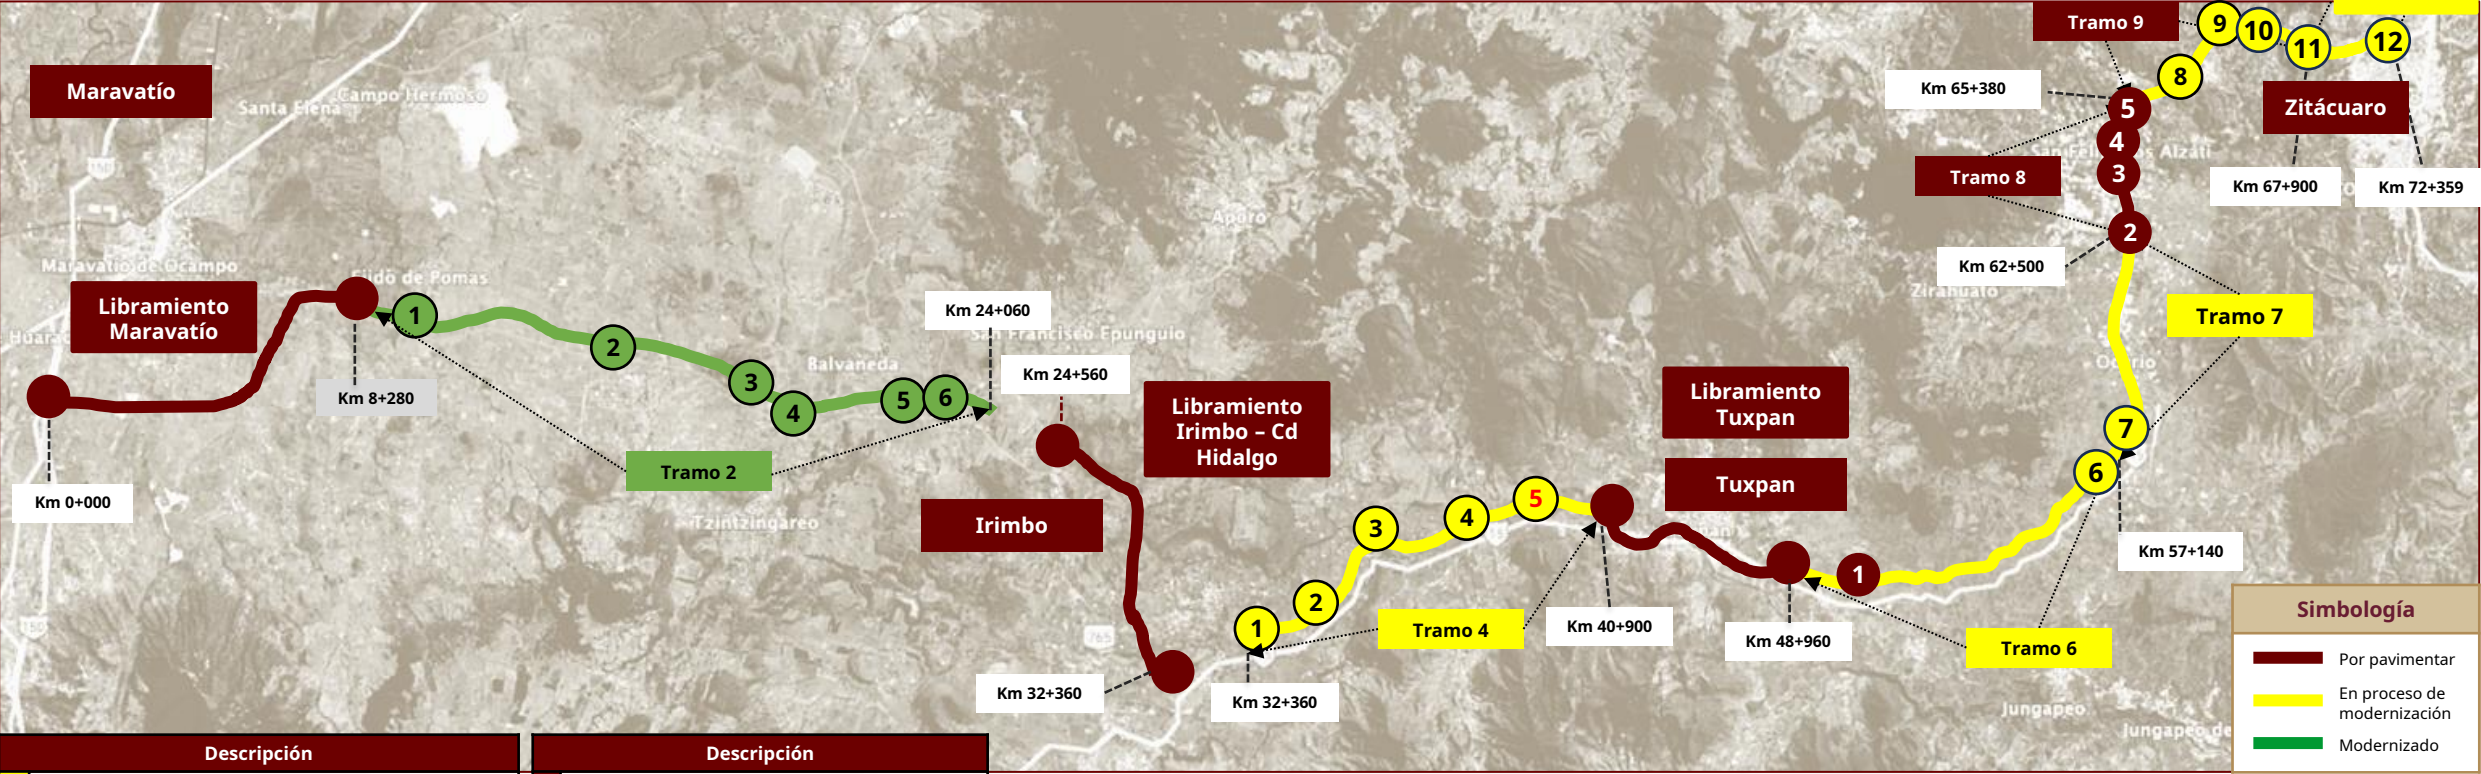


Descripción	
1	Entronque Santa Rosa km 32+420 (79.00%), Falta tendido de carpeta asfáltica.
2	Entronque Ziranda-Jaripeo km 32+420 (76.89%)
3	Puente Turundeo Km 36+460 (90.25%)
4	Entronque Turundeo I km 37+550 (76.54%).
5	Entronque Turundeo II km 38+780 (87.63%), Falta tendido de carpeta asfáltica.
6	Entronque Jungapeo km 56+700 (63.60%)
7	Entronque Piedras de Lumbre km 57+700 (58.35%)
8	Entronque Valle Verde km 67+220 (57.43%)
9	Entronque Curungueo I Km 68+240 (52.12%)
10	Entronque Curungueo II Km 68+780 (52.12%)
11	Puente San Juan Viejo Km 69+860 (35.95%)
12	PSV Zitácuaro Km 72+160 (58.34%)


Descripción	
1	Puente Obispo Km 50+400
2	Entronque Zirahuato km 62+620
3	Entronque San Felipe I km 64+400
4	Entronque San Felipe II Km 64+640
5	Entronque Macutzio km 65+620


Nota:
Las Estructuras en proceso remarcadas en color rojo, no presentan avance en el periodo semanal.


Avance físico


- Programado: 54.17%
- Real: 47.91 %
- Semanal: 0.68 %
- Financiero: 0.00%


**Inversión:** 4,575.3 mdp
Inversión 2020-2025:3,321 mdp

**Meta:** 71.3 Km
Meta 2020-2025: 41 km

**Inicio:** septiembre 2020
Reinicio: 27 de enero de 2024
Término: 30 de enero de 2027

 4,800 empleos generados

 126,000 habitantes beneficiados

 Ahorro en tiempo: 25 min

Concesionaria: Red de carreteras de occidente

Michoacán


Modernización Carretera Zitácuaro-Maravatío

TERRACERIAS						
Concepto	Total	Ejecutado	Faltante	Del 22 ago al 28 ago 25		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
Cortes (m3)	705,558.00	676,728.66	28,829.34	4,190.52	6,469.73	CONTINUAN TRABAJOS EN TRAMOS 4, 6, 7 Y 9
Terraplén (m3)	445,687.00	322,733.02	122,953.98	8,280.92	2,703.79	EL AVANCE DEPENDE DE LOS FRENTES DE TRABAJOS DISPONIBLES. SE REACTIVAN TRABAJOS EN TRAMO 7.
Subyacente (m3)	256,097.00	224,963.24	31,133.76	1,045.73	1,465.49	CONTINUAN TRABAJOS EN TRAMOS 4, 6, 7 Y 9
Subrasante (m3)	170,688.00	148,757.83	21,930.17	1,922.88	1,100.72	EL AVANCE DEPENDE DE LOS FRENTES DE TRABAJOS DISPONIBLES. SE REACTIVAN TRABAJOS EN TRAMO 7.

PAVIMENTOS						
Concepto	Total	Ejecutado	Faltante	Del 22 ago al 28 ago 25		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
Base Hidráulica (m3)	125,659.04	92,326.80	33,332.24	402.46	1,122.75	CONTINUAN LOS TRABAJOS EN TRAMOS 4, 6 Y 7
Bacheo (m3)	1,800.00	1,137.00	663.00	0.00	15.00	SE REALIZAN TRABAJOS DE BACHEO EN TODOS LOS TRAMOS.
Fresado (m3)	10,676.00	9,613.81	1,062.19	0.00	25.10	CONTINUAN LOS TRABAJOS EN TRAMOS 4, 6, 7 Y 9.
Rayado Carpeta (Ha)	30.24	21.34	8.90	0.00	0.13	CONTINUAN LOS TRABAJOS EN TRAMOS 4, 6, 7 Y 9.
Geomalla (m2)	84,520.00	59,065.80	25,454.20	0.00	1,189.00	CONTINUAN LOS TRABAJOS EN TRAMOS 4, 6, 7 Y 9.
Base Asfáltica (m3)	120,414.05	95,512.48	24,901.57	0.00	820.25	CONTINUAN LOS TRABAJOS EN TRAMOS 4, 6, 7 Y 9.
Carpeta Asfáltica (m3)	45,247.80	12,747.26	32,500.54	558.69	115.26	INICIA EL TENDIDO DE CARPETA ASFÁLTICA EN TRAMO 4 (PRUEBA), SE ESTÁN REALIZANDO LOS ESTUDIOS DE CALIDAD CORRESPONDIENTES.

ESTRUCTURAS						
Concepto	Total	Ejecutado	Faltante	Del 22 ago al 28 ago 25		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
PUENTE TURUNDEO	1.00	1.44	0.00	0.00	0.00	COLADO DE GUARNICIÓN Y PARAPETO, RELLENO DE CEPAS DE APOYOS.
PIV JUNGAPEO	1.00	0.93	0.07	0.00	0.00	CONTINUA EL CORTE DE TN EN GAZAS
PSV SAN JUAN VIEJO	1.00	0.22	0.78	0.00	0.01	COLADO DE PLANTILLA Y DESCABECE DE PILAS DE APOYOS 1 Y 2.
PSV ZITÁCUARO	1.00	0.73	0.27	0.00	0.01	COLADO Y ARMADO DE LOSA DE COMPRESIÓN ENTRE EJE A3 - A4

Avance: Programado, Físico y Financiero (%)

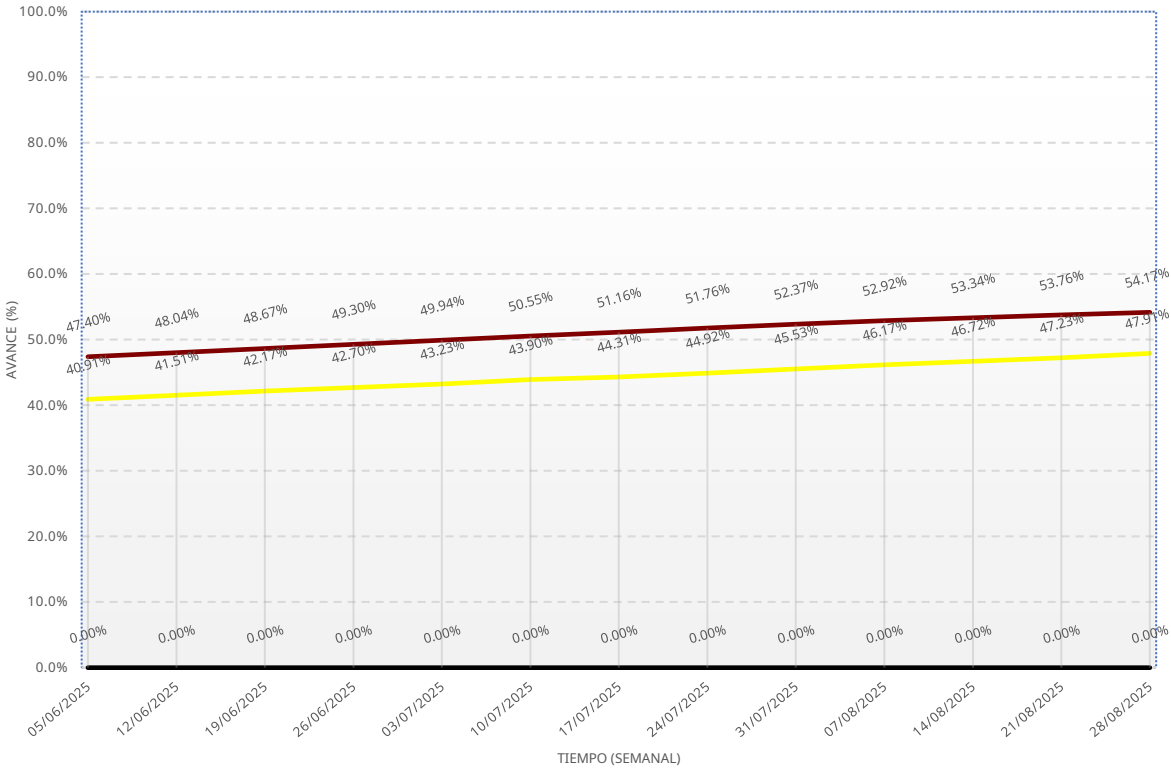

Avance Programado Avance Físico Avance Financiero

* No presenta avance financiero

	15 de agosto al 21 de agosto	22 de agosto al 28 de agosto
Fuerza de Trabajo (personas)	280	281
Maquinaria	182	183
