

# Michoacán

## Uruapan-Nueva Italia


**Avance físico**







• Programado: 10.52 %

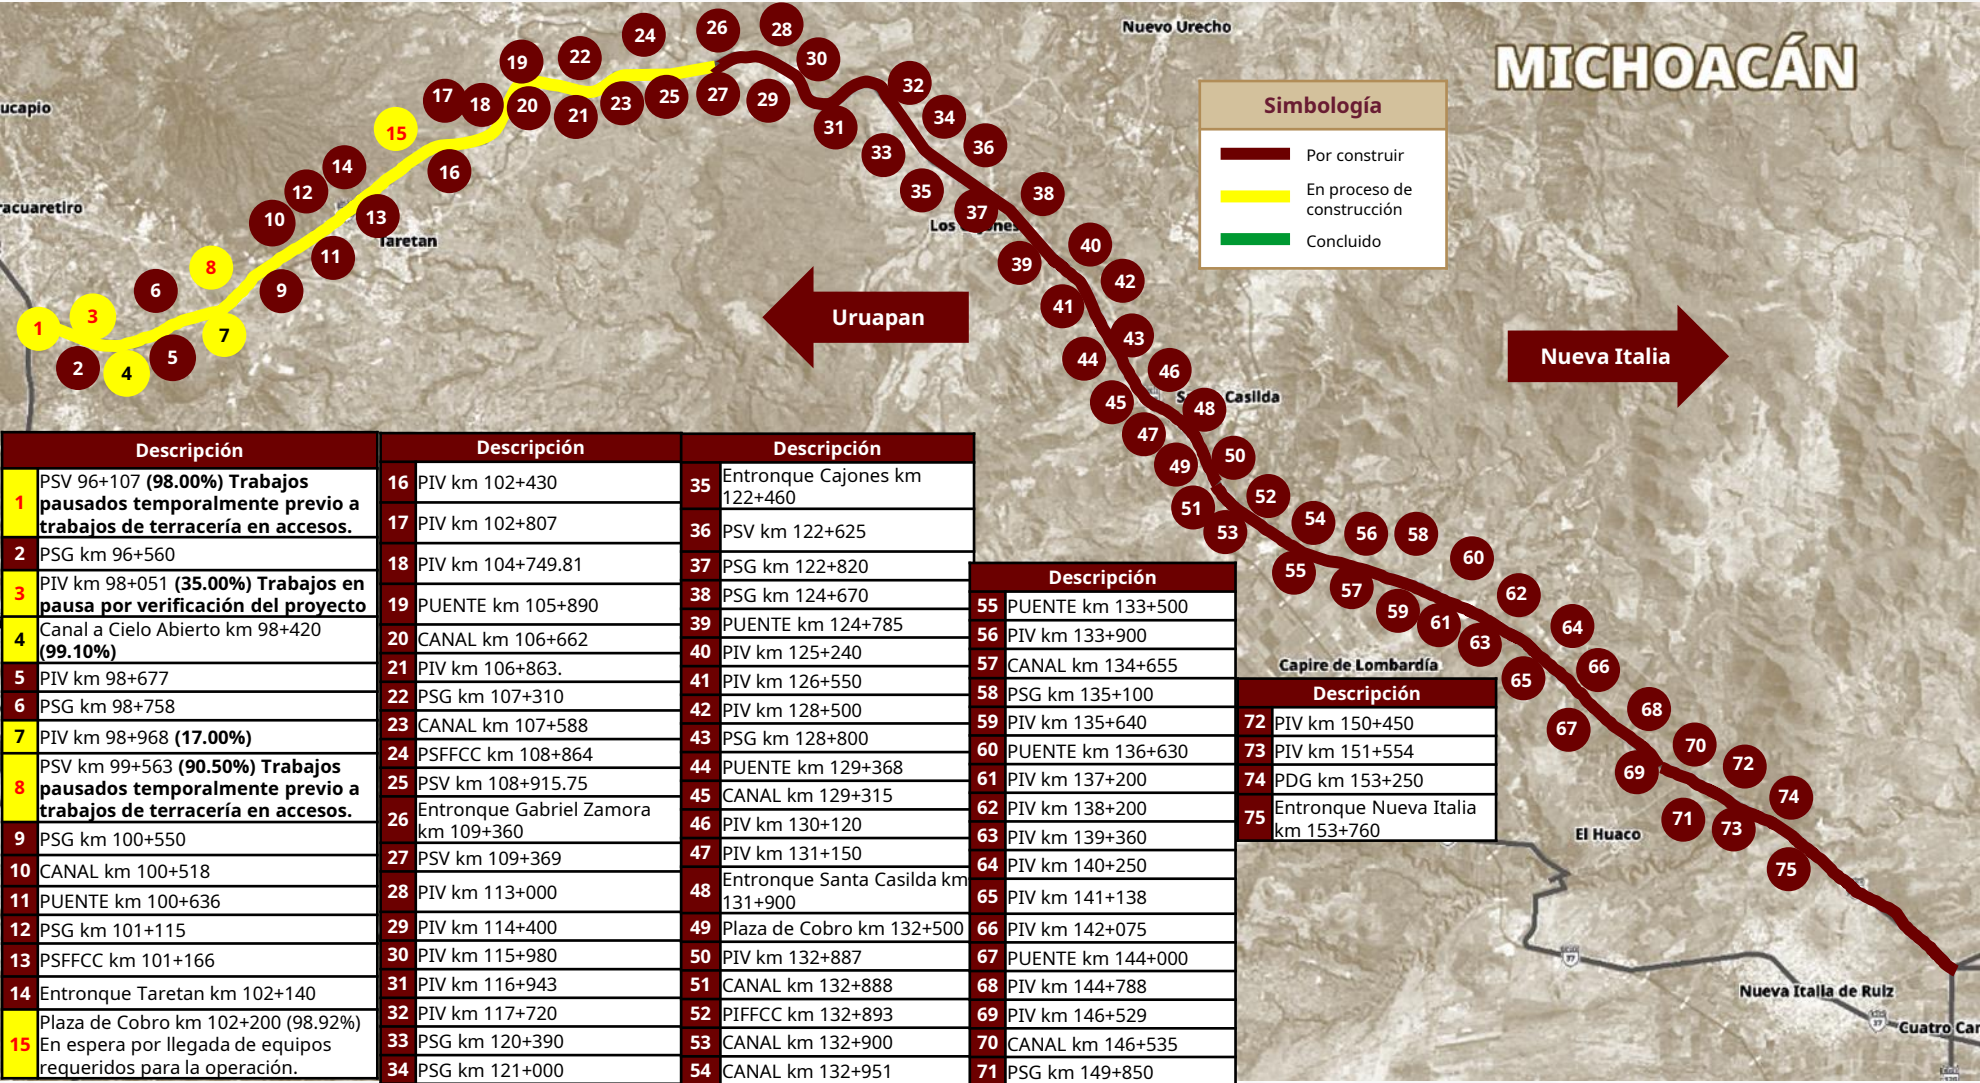• Semanal: 0.12 %

• Real: 10.14 %

• Financiero: 0%




-  **Inversión: 7,049 mdp**
-  **Inicio:** noviembre de 2023  
**Término:** agosto de 2027
-  **Meta: 67.09 km**  
65 km (tronal)  
2.09 km (estructuras)  
2 plazas de cobro, 10 puente,  
5 entronques, 65 cruces y  
múltiples obras de drenaje.
-  **21,147** empleos generados  
7,049 Directos  
14,098 Indirectos
-  **1,800,000** habitantes beneficiados
-  **25 minutos** de ahorro en tiempo
- Concesionaria : PINFRA.**

# Michoacán

## Uruapan-Nueva Italia

Avance: Programado, Físico y Financiero (%)

Elemento	Meta	Ejecutado acumulable	Faltante	30/10/2025 al 06/11/2025		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
Base Hidráulica	65 km	7.40 km	57.60 km	.200 km	.200 km	
Subbase	65 km	8.30 km	56.70 km	.200 km	.200 km	
Subyacente	65 km	10.40 km	54.60 km	.200 km	.200 km	
Km 98+968 PIV Demolición	3	2	1	1	1	Retiro de materia producto de demolición

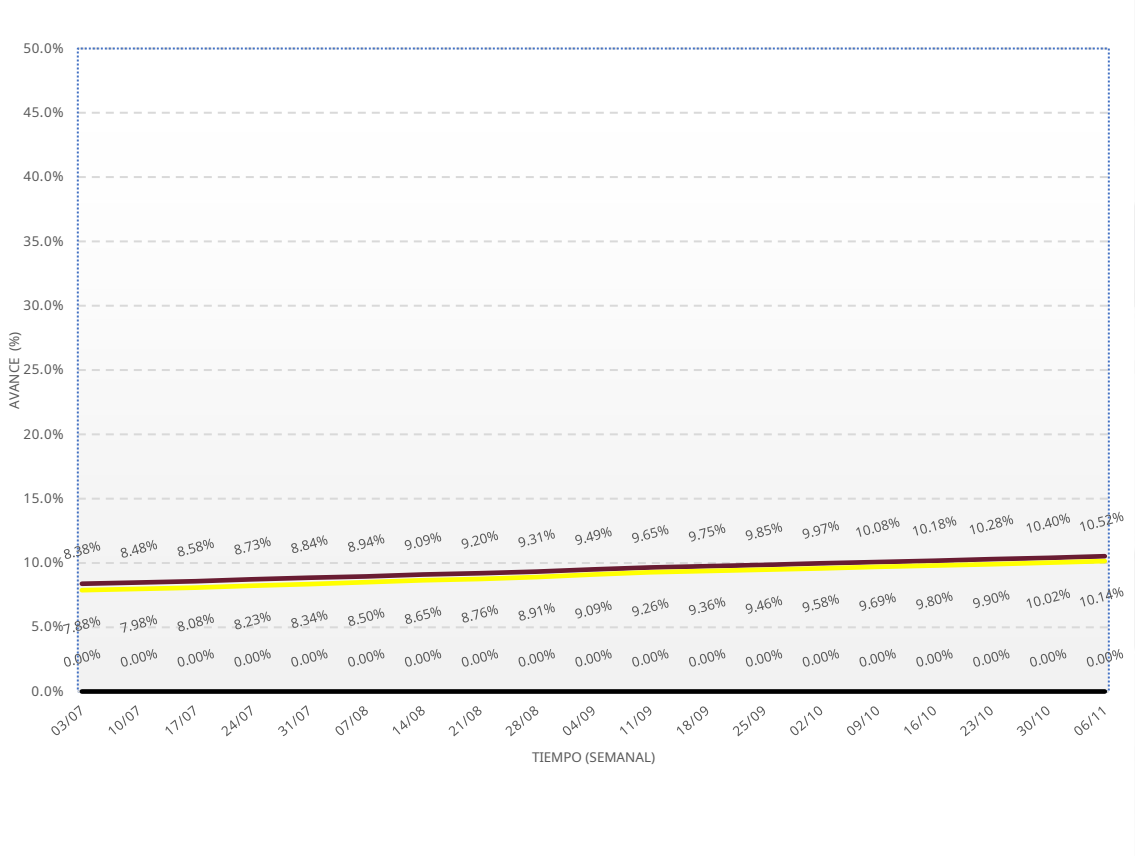

Avance Programado Avance Físico Avance Financiero

	Del 23 de octubre al 30 de octubre.	Del 30 de octubre al 06 de noviembre.
Fuerza de Trabajo (personas)	780	780
Maquinaria	245	245



2025  
Año de  
La Mujer  
Indígena
