


Nayarit

Las Varas-Puerto Vallarta (Tramo III)



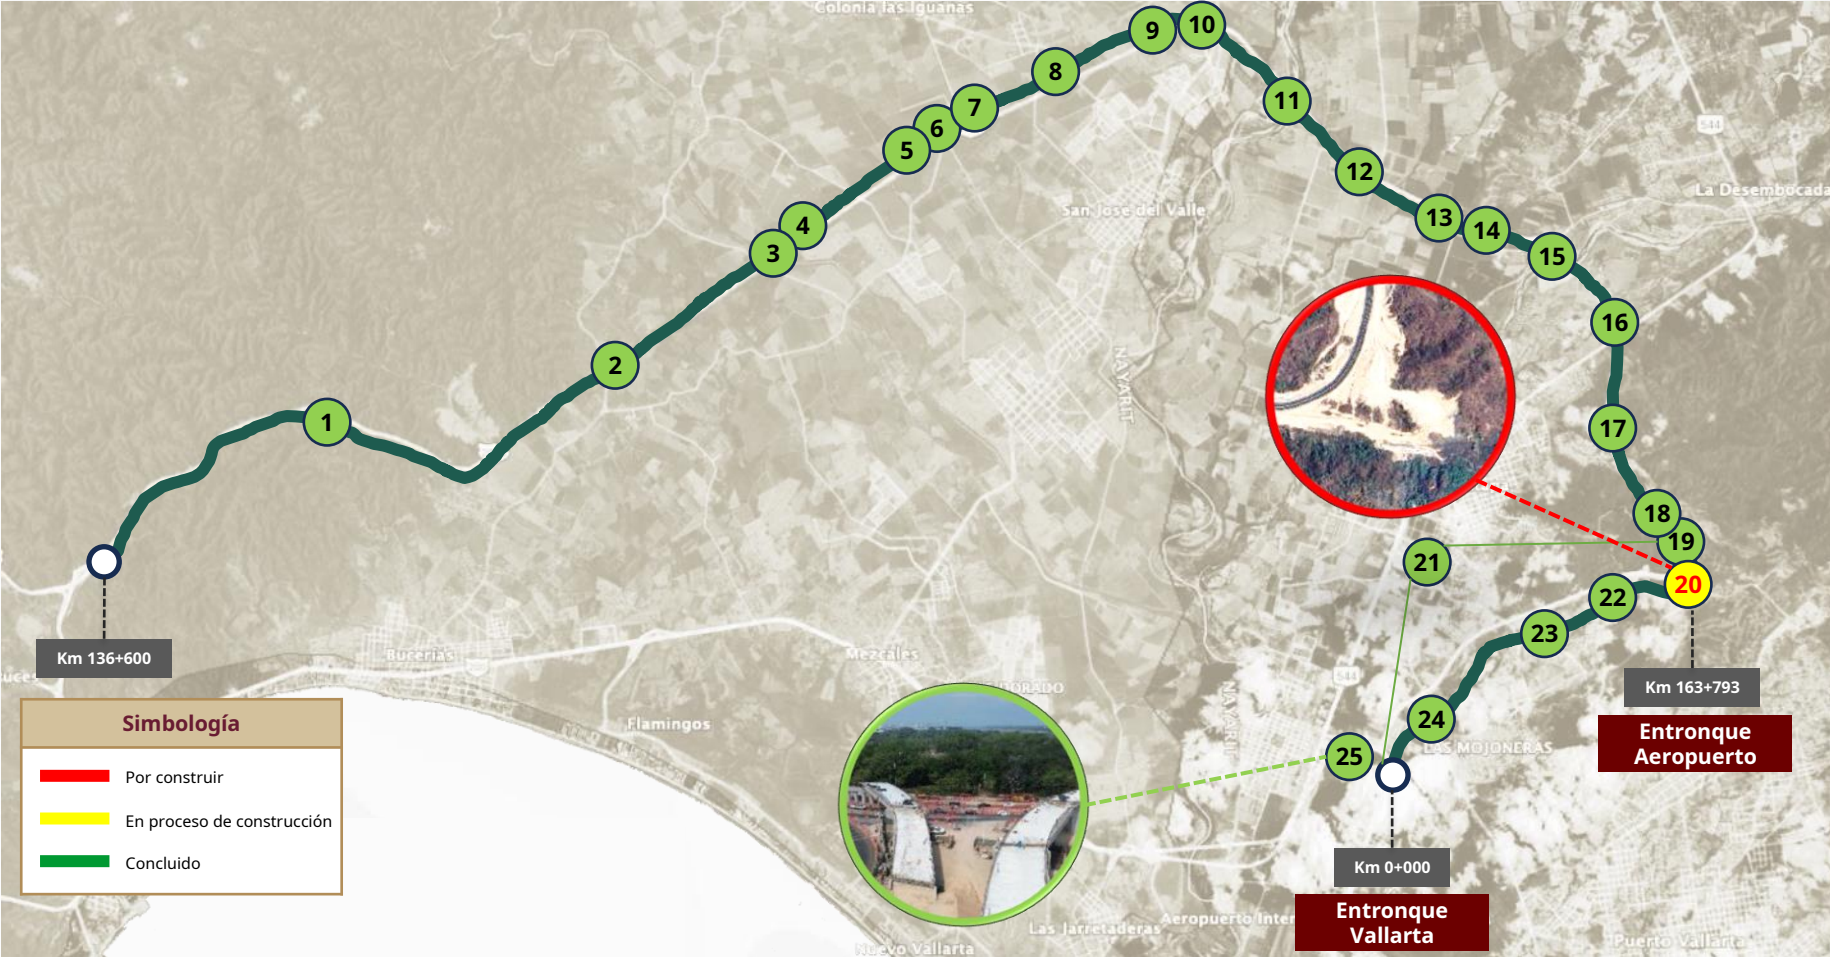

Simbología

Por construir


En proceso de construcción


Concluido

**Inversión total:** 2,577 mdp


**Inicio:** septiembre de 2022
Término: septiembre de 2025, inaugurada y puesta en operación diciembre de 2024 (pendiente complementaria)


Concesionaria: IDEAL


**Meta:** 34.9 km
8 puentes, 13 estructuras de cruce,
2 entronques, 1 plaza de cobro y 1 ramal


**Avance físico:**

- Programado: 100.00%
- Real: 96.55%
- Semanal: 1.34 %
- Financiero: 92.25%

**Avance de obra pendiente:** Real: 3.45%

**7,731** empleos generados
2,577 directos y **5,154** indirectos

**Más de 50,000** habitantes beneficiados

**30 minutos** de ahorro en tiempo


Descripción	
1	Puente rio Las Animas km 240+401
2	PIV 2V a zona agrícola km 144+237
3	PSV 1 V Sin Nombre km 146+700
4	Puente canal de riego km 146+800
5	PIV El Naranjo km 148+260
6	Plaza de cobro La Misión 148+700
7	Puente canal con camino de servicio km 149+597
8	PSV a valle de Candras km 151+496.22
9	PSV km153+225
10	PSV a San José del Valle km 153+538.25
11	Puente Rio Ameca km 154+903.25
12	Puente Canal km 156+754.01
13	PIV a San José del Valle km 157+663
14	Puente canal de riego km 158+876
15	Puente Mascota km 159+302
16	PSV Pto. Vallarta- Las Palmas km 160+427
17	Puente Santo Domingo km 162+181
18	PSV km 163+005
19	PSV km 163+452
20	Entronque Aeropuerto km 163+793, (15.0%) Sin asignación de recursos por la concesionaria.
21	Ramal Aeropuerto
22	PSV km 4+690
23	PSV km 3+018.9
24	PSV A.V. México km 1+000.13
25	Entronque Vallarta km 0+000, (100.0%)

Nayarit

Las Varas-Puerto Vallarta (Tramo III)

Avance: Programado, Físico y Financiero (%)

Elemento	Meta	Ejecutado acumulado	Faltante	26/09/25 al 02/10/2025		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
Entronque Vallarta. Eje 10						
Losa de acceso	28.8	28.8	0	0	14.2	Losa acceso 1
Parapeto	687.3	687.3	0	0	0	Terminado
Guarnición para MME	363.0	363	0	0	0	Terminado
Muro de contención	492.9	492.9	0	0	0	Terminado
Juntas de Calzada	10	10	0	0	1	Apoyo 0
Señalamiento Horizontal y Vertical	1 lote	1 lote	0	1 lote	1 lote	Terminado
Entronque Vallarta. Eje 20						
Losa de acceso	26.9	26.9	0	0	11.7	Losa de acceso 2
Parapeto	479.6	479.6	0	0	0	Terminado
Muro de contención	636.2	636.2	0	0	0	Terminado
Juntas de Calzada	7	7	0	0	1	Apoyo 7
Señalamiento Horizontal y Vertical	1 lote	1 lote	0	1 lote	1 lote	Terminado

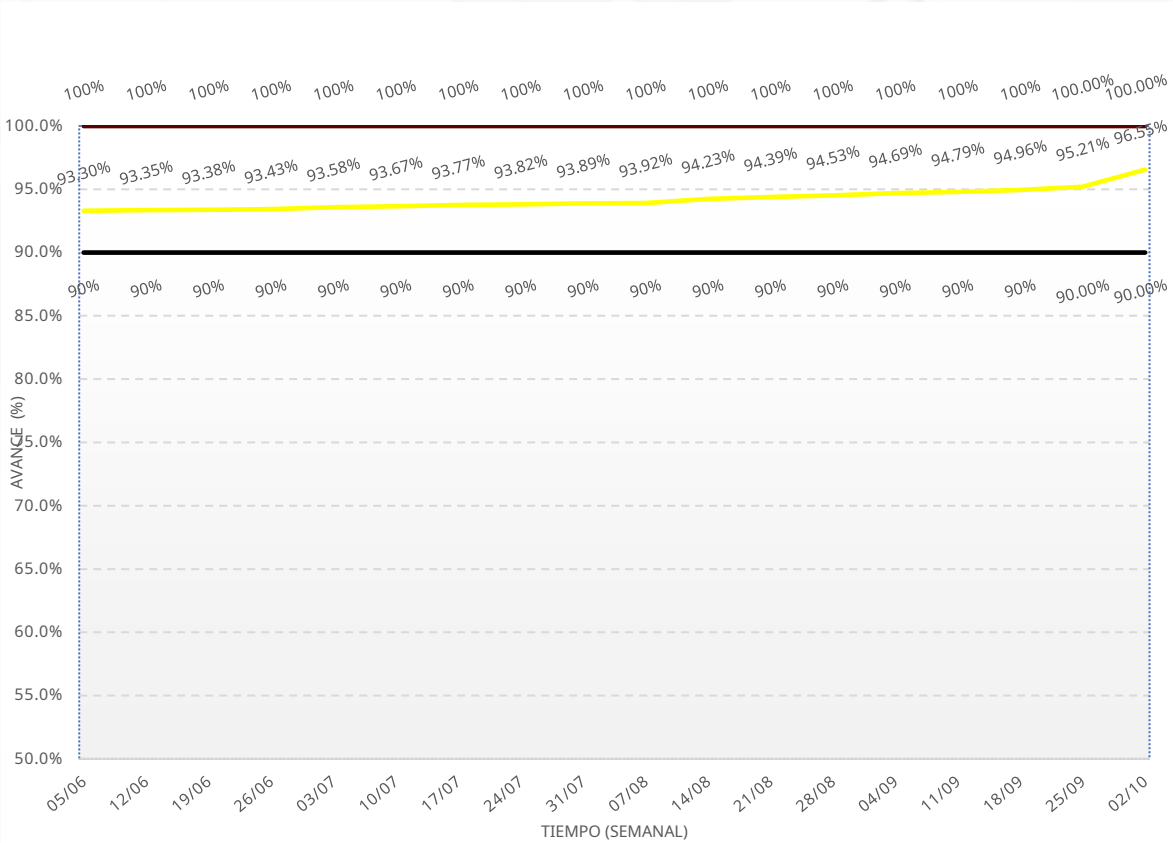

	19 de septiembre al 25 de septiembre	26 de septiembre al 02 de octubre
Fuerza de Trabajo (personas)	297	275
Maquinaria	15	12
