

# Nayarit

## Tramo Tepic-Compostela



2025  
Año de  
La Mujer  
Indígena

### Avance físico

- Programado: 100%
- Real: 88.28%
- Semanal: 1.31%
- Financiero: 78.73%

Concesionaria: FONADIN

**Inversión:** 2,473.43 mdp

- Meta:** 28 km
- 1 Plaza de cobro,
  - 10 Puentes,
  - 2 PSFC,
  - 1 Entronque (solo gasas)
  - 19 Cruces
  - Ramal Aeropuerto

**Inicio:** Marzo 2023  
**Término:** 31-Oct-2025

- 2,900 empleos generados
- 490 mil habitantes beneficiados
- 35 minutos de ahorro en tiempo

# Nayarit

## Tramo Tepic-Compostela

Elemento	Meta	Ejecutado acumulable	Faltante	23/05/25 al 29/05/2025		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
Terraplén (m3)	1,982,866.26	1,947,899.62	34,966.64	3,100.00	3,375.00	Con el incremento de maquinaria y turnos extendidos se pretende disminuir los atrasos
Subyacente (m³)	290,689.00	250,570.49	40,118.51	7,500.00	8,571.00	
Puente 16.01 km 16+393.50						
Obras de drenaje	77	75	2	1	2	
P.S.F.C. 21.01 km 21+601.50						
Junta de dilatación (pza)	2	0	2	2	0	Se movió personal para apoyo en las estructuras principales. En revisión fuerza de trabajo necesaria.
Estabilización de taludes						
Cortes (m3)	2,443,497.56	2,321,214.23	122,283.33	2,000.00	2,351.20	Con el incremento de maquinaria y turnos extendidos se pretende disminuir los atrasos




2025  
Año de  
La Mujer  
Indígena



Gobierno de  
México

Comunicaciones  
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

Avance: Programado, Físico y Financiero (%)

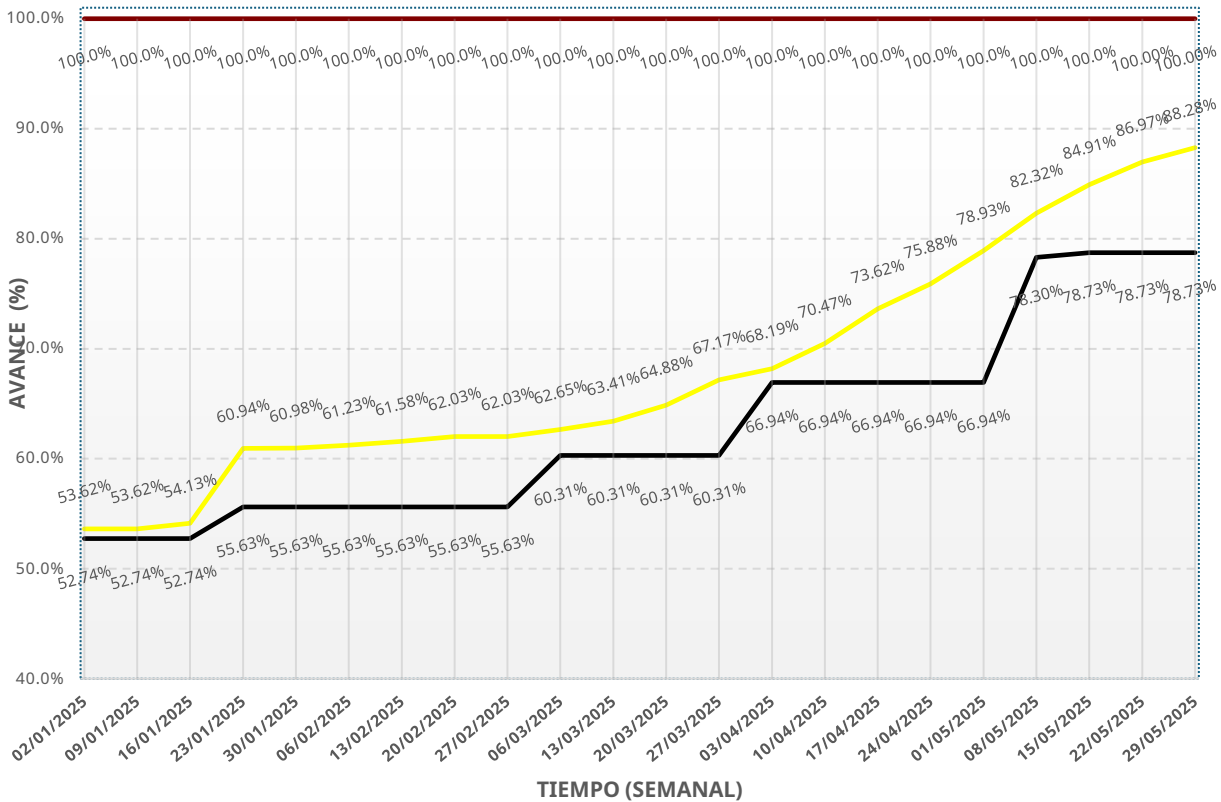

Avance Programado Avance Físico Avance Financiero

	16 de mayo al 22 de mayo	23 de mayo al 29 de mayo
Fuerza de Trabajo (personas)	520	520
Maquinaria	119	119
