

# Nayarit

## Tramo Tepic-Compostela



**2025**  
Año de  
**La Mujer Indígena**

### Avance físico

- Programado: 100 %
- Real: 94.13 %
- Financiero: 85.80 %
- Semanal: 0.58 %

Concesionaria: FONADIN

**Inversión:** 2,473.43 mdp

- Meta:** 28 km
- 1 Plaza de cobro,
  - 10 Puentes,
  - 2 PSFC,
  - 1 Entronque (solo gasas)
  - 19 Cruces
  - Ramal Aeropuerto

**Inicio:** Marzo 2023  
**Término:** 31-Oct-2025


- 5,500** empleos generados
- 490 mil** habitantes beneficiados
- 35 minutos** de ahorro en tiempo

# Nayarit

## Tramo Tepic-Compostela

Avance Programado - Físico - Financiero (%)

Elemento	Meta	Ejecutado acumulable	Faltante	11/07/25 al 17/07/2025		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
Terraplén (m3)	1,982,866.26	1,963,144.62	19,721.64	1,000.00	1,100.00	
Subyacente (m³)	290,689.00	264,436.49	26,252.51	1,650.00	1,800.00	
Puente 16.01 km 16+393.50						
Cortes (m³) Estabilización de taludes	2,443,497.56	2,333,472.63	110,024.93	6,500.00	6,750.00	
P.S.F.C. 21.01 km 21+601.50						
Junta de dilatación (pza)	2	0.85	1.15	0.1	0.15	Se movió personal para apoyo en las estructuras principales. En revisión fuerza de trabajo necesaria.

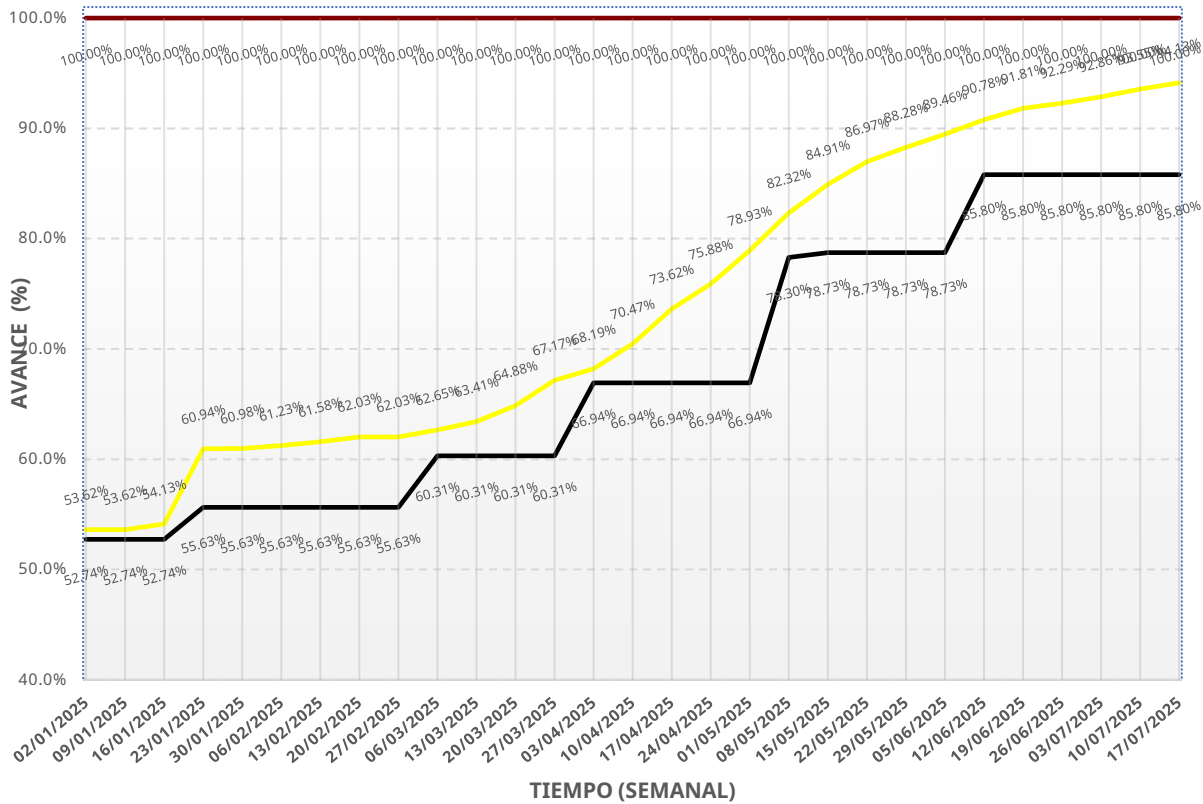

Avance Programado    Avance Físico    Avance Financiero

	04 de julio al 10 de julio	11 de julio al 17 de julio
Fuerza de Trabajo (personas)	480	480
Maquinaria	86	86
