


Colima

Tramo Armería-Manzanillo

Avance físico:

- Programado: 90.06%
- Semanal: 0.03 %
- Real: 31.91%
- Financiero: 20.79%

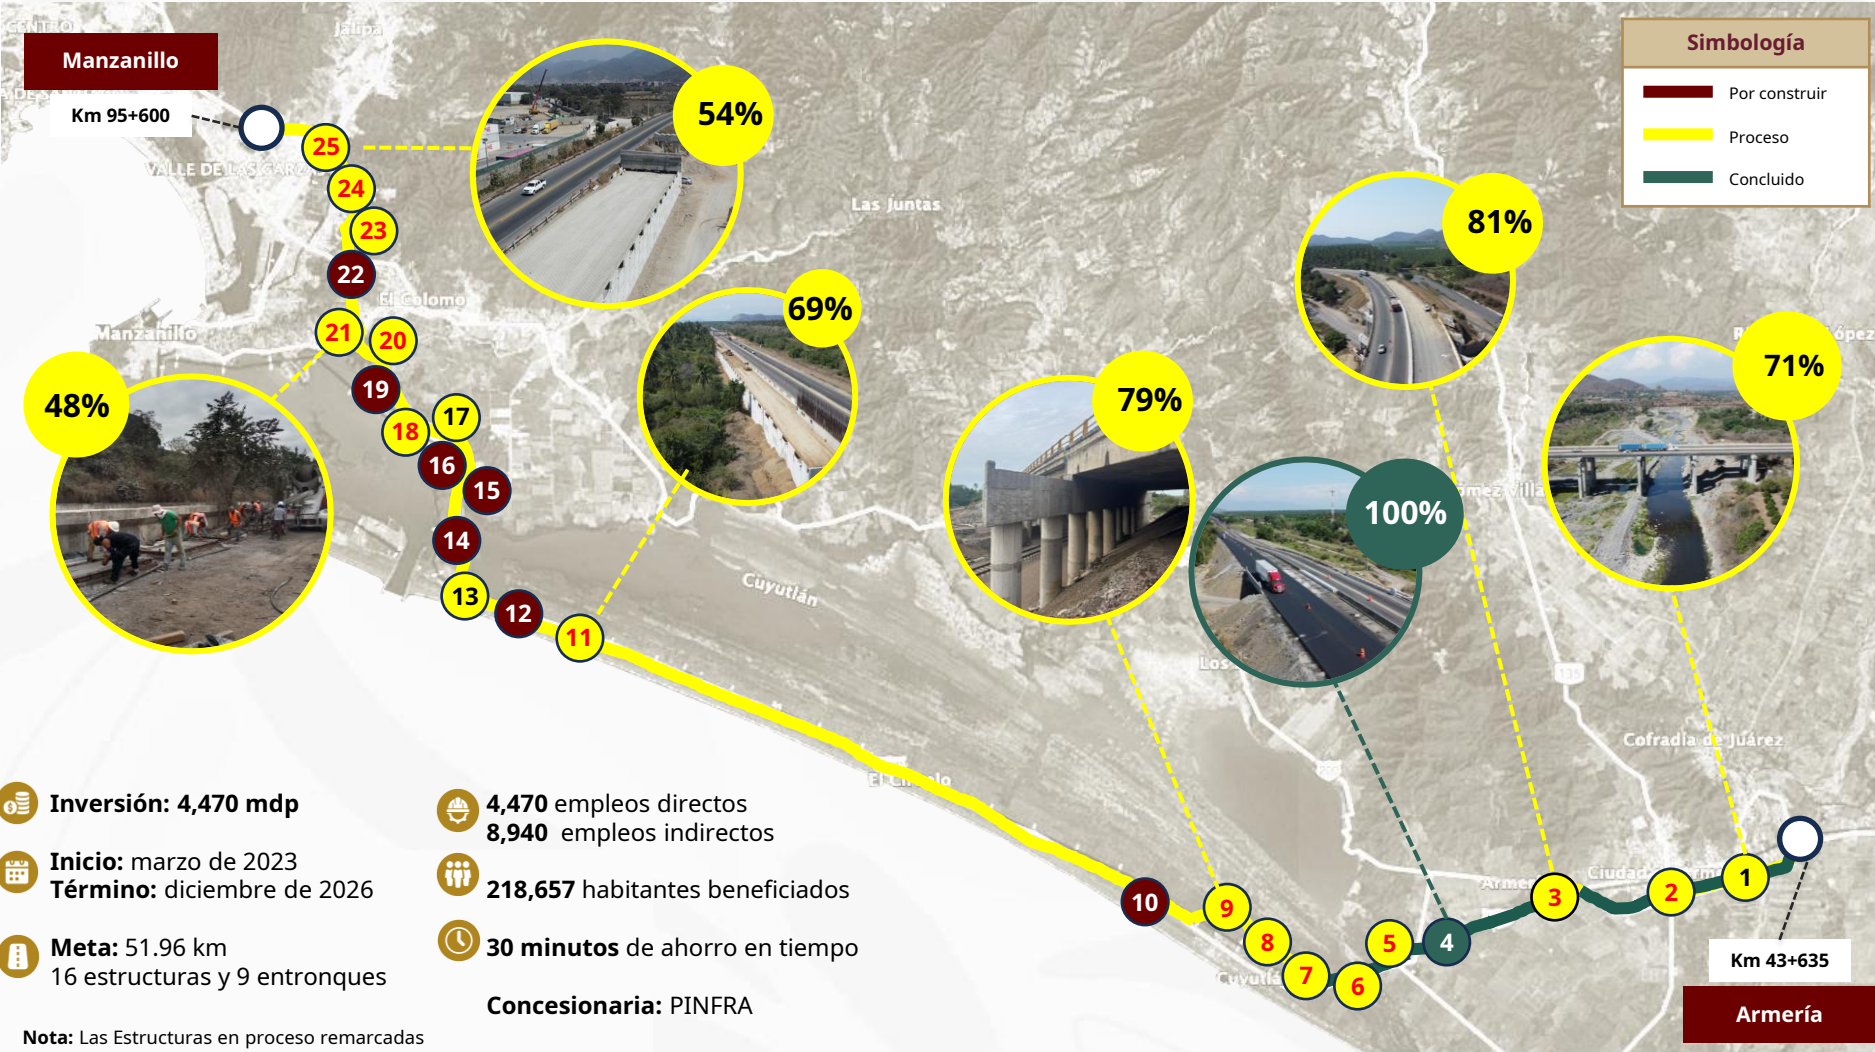

**Inversión: 4,470 mdp**

**Inicio:** marzo de 2023
Término: diciembre de 2026

**Meta:** 51.96 km
16 estructuras y 9 entronques

**4,470** empleos directos
8,940 empleos indirectos

**218,657** habitantes beneficiados

**30 minutos** de ahorro en tiempo

Concesionaria: PINFRA

Descripción	
1	Puente Armería I km 45+500 (75%)
2	Entronque Paraíso km 47+741 (78%) No esta programado avance.
3	PSFFCC Armería II km 50+100 (81.10%) Sin trabajos programados para esta semana
4	PSV Tilapia km 54+350 (100%)
5	Puente Palo Verde I km 55+950 (41.03%). Condiciones de perforación adversas.
6	Puente Palo Verde II km 56+650 (17%). Retraso en logística de perforación
7	PIV Ent. Salinero II km 59+500 (9%). Retraso por logística en demolición de PIV existente.
8	Entronque Salineros km 59+551 (5%). Falta regularizar programa
9	PSFFCC Salinero I km 60+500 (79.45%) Sin trabajos programados para esta semana
10	Entronque Cuyutlán km 60+880
11	PIV Retorno en U km 77+600 (69%) Sin trabajos programados para esta semana
12	Entronque Retorno en U km 77+600
13	PSFFCC Tepalcates I km 79+900 (13%)
14	Entronque Tepalcates I km 80+100
15	Puente Nuevo Tepalcates II km 81+323
16	Entronque Tepalcates II km 83+500
17	Puente Adjuntas km 85+950 (37.97%)
18	PSV Panteones km 87+300 (21%). Falta de Fuerza de Trabajo
19	Entronque Panteones km 87+630
20	PIV Minatitlán Lib km 92+000 (4%). Se detuvieron trabajos por interferencia con instalaciones de CFE.
21	PIV Minatitlán Lib II km 92+000 (48%) Sin trabajos programados para esta semana
22	Entronque Minatitlán km 92+731
23	PIV Minatitlán Lib I km 93+000 (15.75%) Se detuvieron los trabajos con interferencia con ferroadyuto de Peña Colorada y cableado de CFE
24	Entronque Jalipa km 94+100 (9%). Hay que cambiar el tránsito al cuerpo izquierdo del paso del puente
25	Puente Jalipa km 94+158 (54%) Se debe cambiar el tránsito al CD, no se ha cambiado ya que no se encuentra terminado el MME.


Nota: Las Estructuras en proceso remarcadas en color rojo, no presentan avance en el periodo semanal.

Colima

Tramo Armería-Manzanillo

Elemento	Meta	Ejecutado	Faltante	19/09/25 al 25/09/25		Observaciones
		acumulado		Programado	Ejecutado	
Volúmenes de Obra en Troncal						
Cortes (m³)	210,113	264,428	0	0	456	El programa origen para los trabajos que se ejecutan en la troncal llegó a su fin. Se está solicitando a la concesionaria entregue la reprogramación de los trabajos para concluir dentro del plazo establecido
Terraplenes (m³)	813,909	499,538	314,371	0	1,287	
Base y sub base (m³)	260,119	143,011	117,108	0	1,051	

Nota: Los precios y avances mostrados en este reporte son con respecto a los catálogos y contrato vigente. El volumen programado proviene de un programa provisional. Se está trabajando en un nuevo programa.

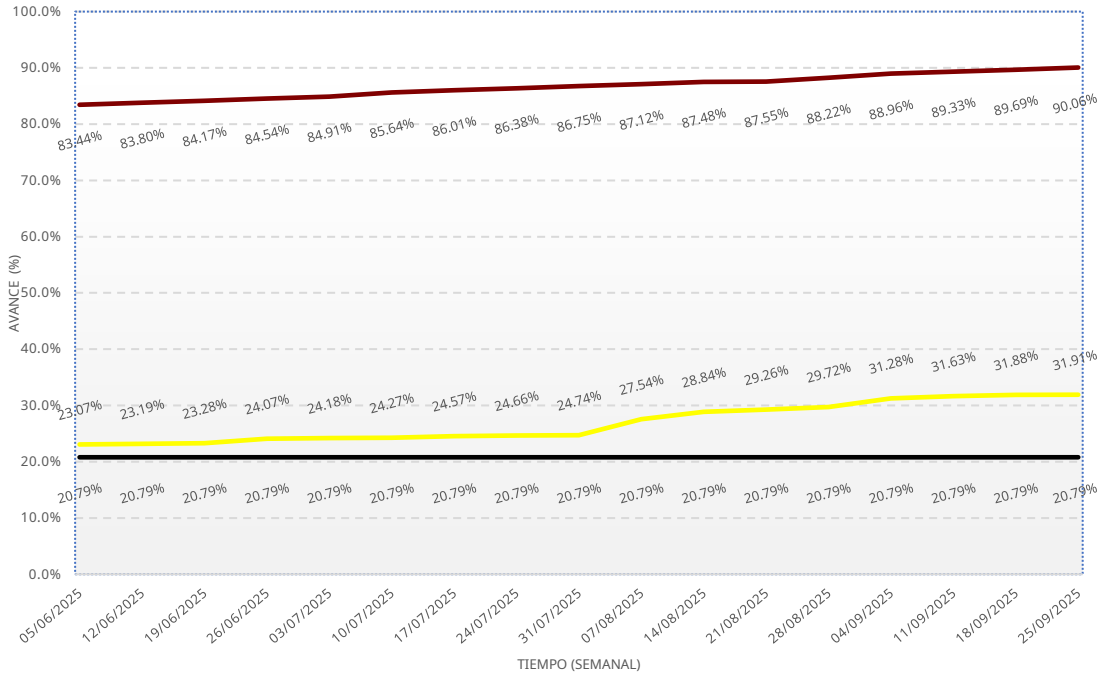

Avance Programado Avance Físico Avance Financiero

	12 de septiembre al 18 de septiembre	19 de septiembre al 25 de septiembre
Fuerza de Trabajo (personas)	210	152
Maquinaria	99	70

