


Michoacán

Modernización Carretera Zitácuaro-Maravatío

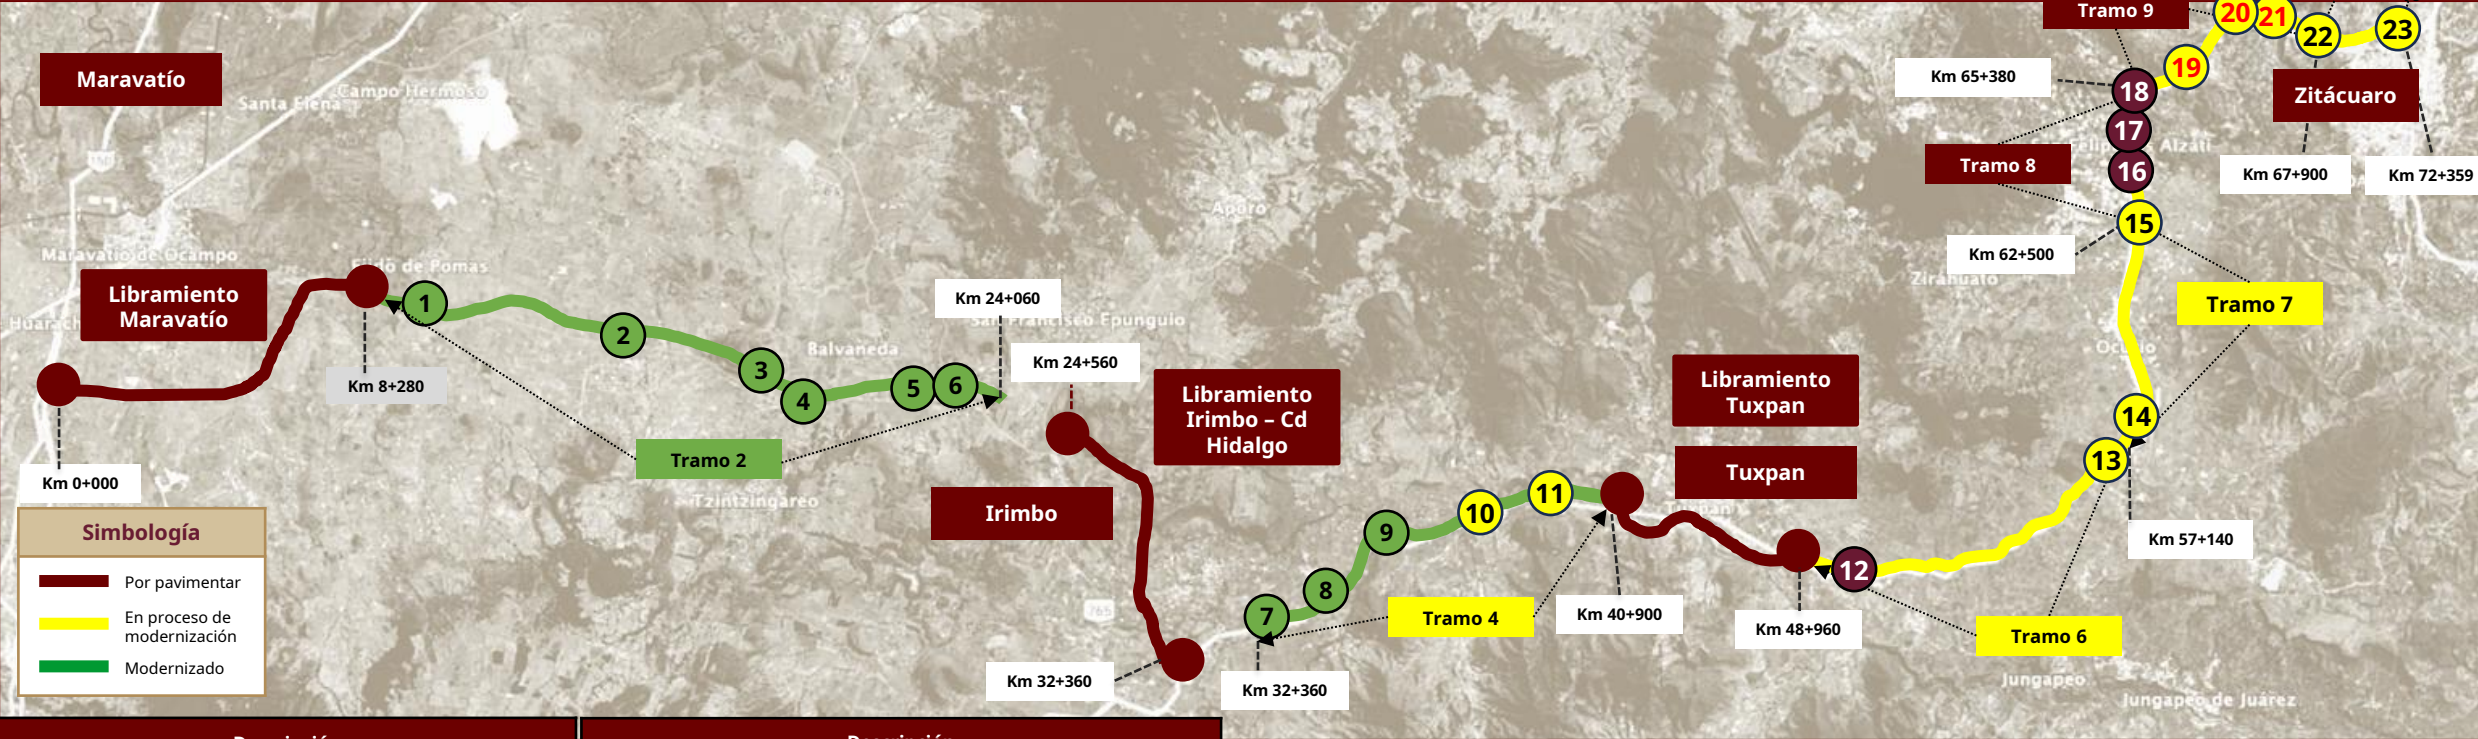

Descripción		Descripción	
1	Entronque Pomas km 9+380	13	Entronque Jungapeo km 56+700 (73.92%)
2	Entronque San Vicente km 14+500	14	Entronque Piedras de Lumbre km 57+700 (67.81%)
3	PIP km 18+370	15	Entronque Zirahuato km 62+500 (54.22%)
4	Entronque Zinzingareo km 18+700	16	Entronque San Felipe I km 64+400 (0.00%), Sin Iniciar
5	Entronque Senguio km 21+280	17	Entronque San Felipe II Km 64+640 (0.00%), Sin Iniciar
6	PIP km 22+280	18	Entronque Macutzio km 65+620 (0.00%), Sin Iniciar
7	Entronque Santa Rosa km 32+420	19	Entronque Valle Verde km 67+220 (69.04%), Falta tendido de carpeta asfáltica.
8	Entronque Ziranda-Jaripeo km 33+500	20	Entronque Curungueo I Km 68+240 (70.82%), Falta tendido de carpeta asfáltica.
9	Puente Turundeo Km 36+460	21	Entronque Curungueo II Km 68+780 (70.82%), Falta tendido de carpeta asfáltica.
10	Entronque Turundeo I km 37+550 (99.99%)	22	Puente San Juan Viejo Km 69+860 (83.99%)
11	Entronque Turundeo II km 38+780 (99.84%)	23	PSV Zitácuaro Km 72+160 (84.32%)
12	Puente Obispo Km 50+400 (0.00%), Sin Iniciar		

Avance físico

- Programado: 58.47%
- Real: 56.01%
- Semanal: 0.57%
- Financiero: 8.11%

Nota:

Las Estructuras en proceso remarcadas en color rojo, no presentan avance en el periodo semanal, o no han iniciado.



Inversión: 4,575.3 mdp



4,800 empleos generados



Meta: 71.3 Km, 2 puentes, 1 PSV, 3 PIP's y 17 entronques



126,000 habitantes beneficiados



Inicio: septiembre 2020
Reinicio: 27 de enero de 2024
Término: 31 de diciembre de 2026




Ahorro en tiempo: 25 min

Concesionaria: Red de carreteras de occidente

Michoacán

Modernización Carretera Zitácuaro-Maravatío

Avance Programado - Físico - Financiero (%)

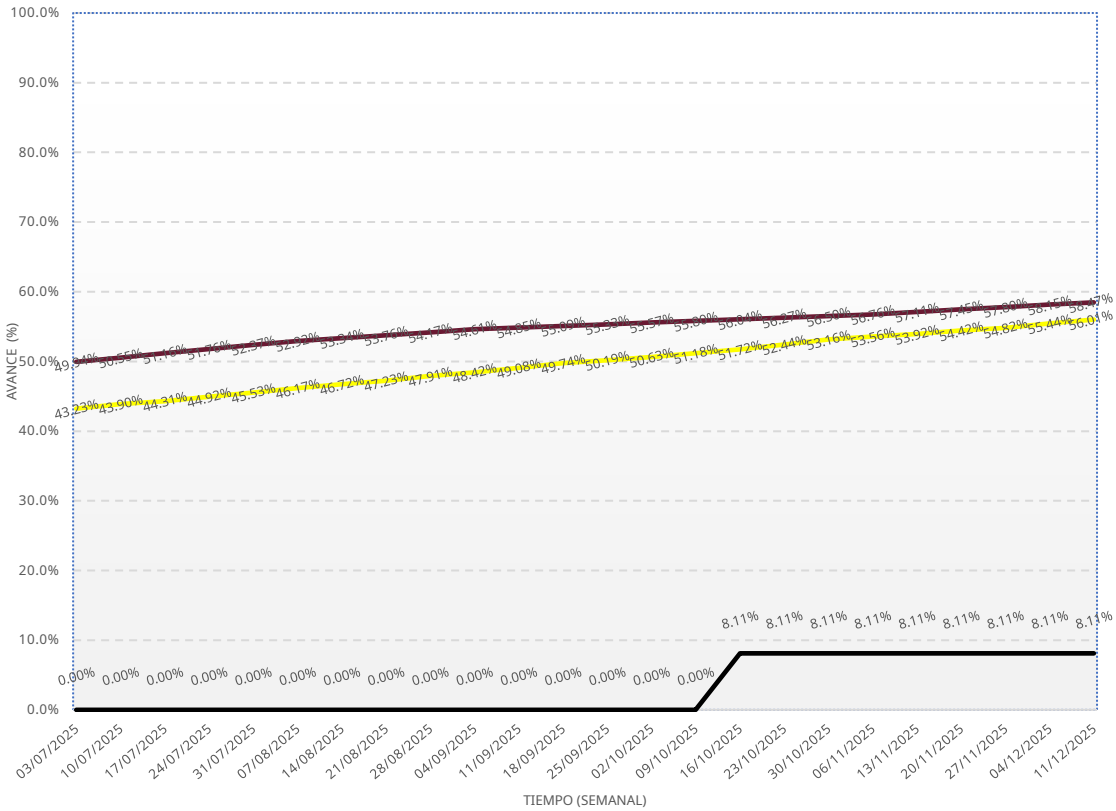

■ Avance Programado ■ Avance Físico ■ *Avance Financiero
* No presenta avance financiero

	28 DE NOVIEMBRE AL 04 DE DICIEMBRE 25	05 AL 11 DE DICIEMBRE 25
Fuerza de Trabajo (personas)	287	285
Maquinaria	195	192
Frentes de trabajo	Tramos 4, 6, 7, 8 y 10	Tramos 4, 6, 7, 8 y 10

TERRACERIAS						
Concepto	Total	Ejecutado	Faltante	Del 05 dic al 11 dic 25		Observaciones
				Programa do	Ejecutado	
Cortes (m3)	705,558.00	717,333.19	-11,775.19	0.00	3,039.74	
Terraplén (m3)	445,687.00	362,400.25	83,286.75	113.11	260.97	
Subyacente (m3)	256,097.00	243,569.31	12,527.69	50.00	7.99	SE REACTIVAN TRABAJOS DE AMPLIACIÓN DE CORONA EN TRAMO 7
Subrasante (m3)	170,688.00	160,354.71	10,333.30	773.11	8.88	SE REACTIVAN TRABAJOS DE AMPLIACIÓN DE CORONA EN TRAMO 7
PAVIMENTOS						
Concepto	Total	Ejecutado	Faltante	Del 05 dic al 11 dic 25		Observaciones
				Programa do	Ejecutado	
Base Hidráulica (m3)	125,659.04	111,030.02	14,629.02	597.16	2,771.95	
Bacheo (m3)	1,800.00	1,500.25	299.75	33.33	45.00	
Fresado (m3)	10,676.00	10,317.06	358.94	0.00	24.65	
Rayado Carpeta (Ha)	30.24	26.60	3.64	0.00	0.13	
Geomalla (m2)	84,520.00	75,266.60	9,253.40	311.11	911.20	
Base Asfáltica (m3)	120,414.05	108,811.35	11,602.70	656.89	1,980.97	
Carpeta Asfáltica (m3)	45,247.80	23,365.86	21,881.94	258.49	81.08	SE DIO PRIORIDAD AL TENDIDO DE BASE ASFÁLTICA
ESTRUCTURAS						
Concepto	Total	Ejecutado	Faltante	Del 05 dic al 11 dic 25		Observaciones
				Programa do	Ejecutado	
PIV JUNGAPEO	1.00	1.00	0.00	0.00	0.10	CONTINÚA EL CORTE DE TN EN GASAS Y CONFORMACIÓN DE SUBRASANTE
PSV SAN JUAN VIEJO	1.00	0.61	0.39	0.05	0.00	MONTAJE DE TABLETAS
PSV ZITÁCUARO	1.00	0.90	0.10	0.00	0.00	CONFORMACIÓN DE TERRAPLÉN DE ACCESO Y SALIDA.
BALIZAMIENTO	157,137.60 ml	61,084.07 ml	96,053.53 ml	0.00 ml	3,019.93 ml	CONTINÚA LA COLOCACION EN TRAMO 4.
CUNETAS	12,028.95 ml	10,224.16 ml	1,804.79 ml	0.00 ml	257.98 ml	CONTINÚA LA COLOCACION EN TRAMO 4 Y TRAMO 6.
BOTONES	12,041.00 pza	6,551.00 pza	5,490.00 pza	0.00 pza	759.00 pza	CONTINÚA LA COLOCACIÓN EN TRAMO 4.
