

Nayarit

Tramo Tepic-Compostela



Avance físico:

- Programado: 100%
- Real: 84.91%
- Semanal: 2.59%
- Financiero: 78.73%

Concesionaria: FONADIN

Inversión: 2,473.43 mdp

Meta: 28 km

- 1 Plaza de cobro,
- 10 Puentes,
- 2 PSFC,
- 1 Entronque (solo gasas)
- 19 Cruces
- Ramal Aeropuerto

Inicio: Marzo 2023
Término: 15-Sep-2025

2,900 empleos generados


490 mil habitantes beneficiados

35 minutos de ahorro en tiempo

Nayarit

Tramo Tepic-Compostela

Elemento	Meta	Ejecutado acumulable	Faltante	09/05/25 al 15/05/2025		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
Terraplén (m3)	1,982,866.26	1,941,190.47	41,675.79	4,550.00	4,675.26	
Subyacente (m³)	290,689.00	236,924.49	53,764.51	2,745.00	2,866.45	
Puente 16.01 km 16+393.50						
Columnas	8	8	0	2	3	
Cabezales	8	3	5	0.40	0.50	
Pavimentos						
Base asfáltica	40,872.00	21,071.40	19,800.60	2,400.00	1,053.00	Se presentó una falla mecánica en la planta de asfalto , lo cual origino el atraso en el suministro.
Estabilización de taludes						
Cortes (m3)	2,443,497.56	2,314,967.63	128,529.93	4,535.00	4,780.54	Con el incremento de maquinaria y turnos extendidos se pretende disminuir los atrasos

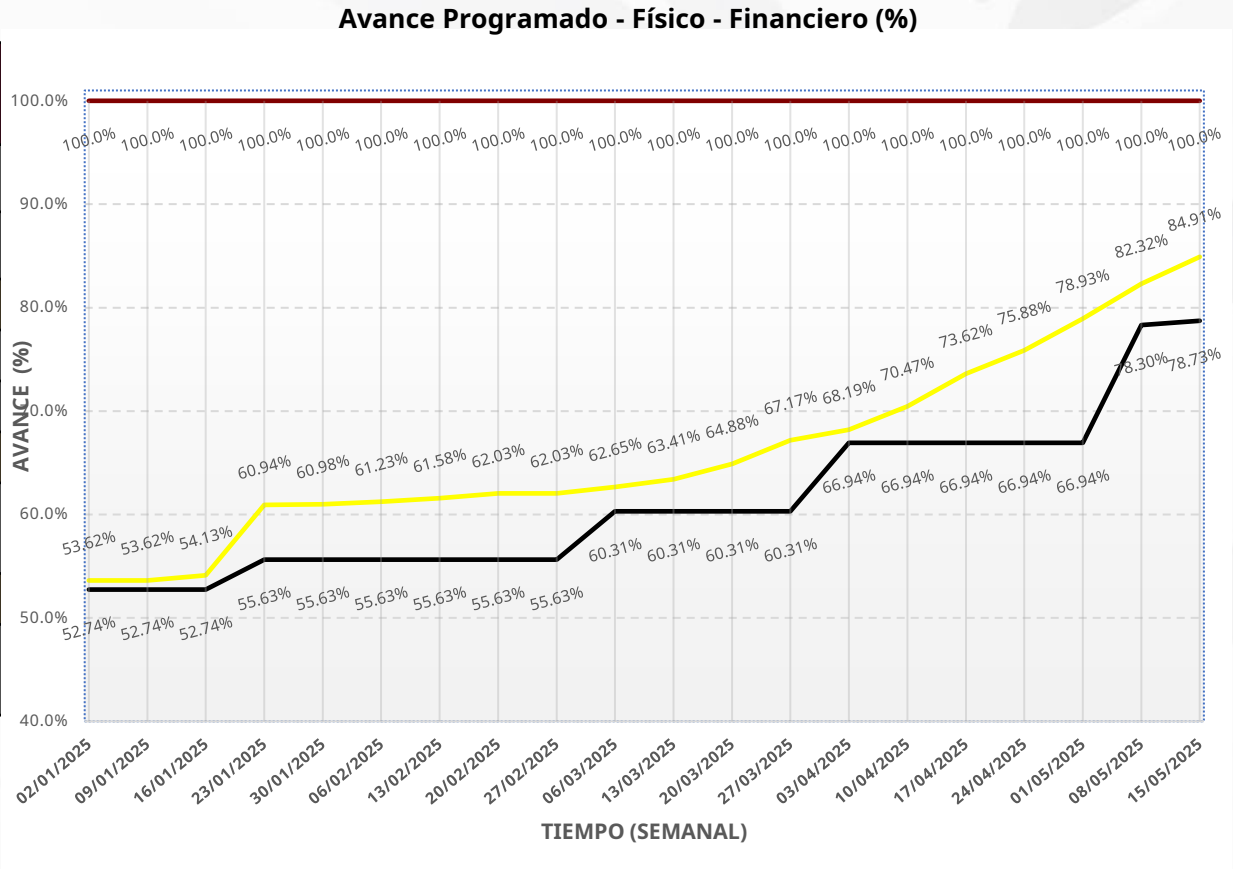

Avance Programado Avance Físico Avance Financiero

	02 de mayo al 08 de mayo	09 de mayo al 15 de mayo
Fuerza de Trabajo (personas)	520	520
Maquinaria	119	119
