


Michoacán

Tramo Pátzcuaro-Uruapan

Avance físico

- Programado: 99.21%
- Real: 92.43%
- Semanal: 0.46 %
- Financiero: 69.85%

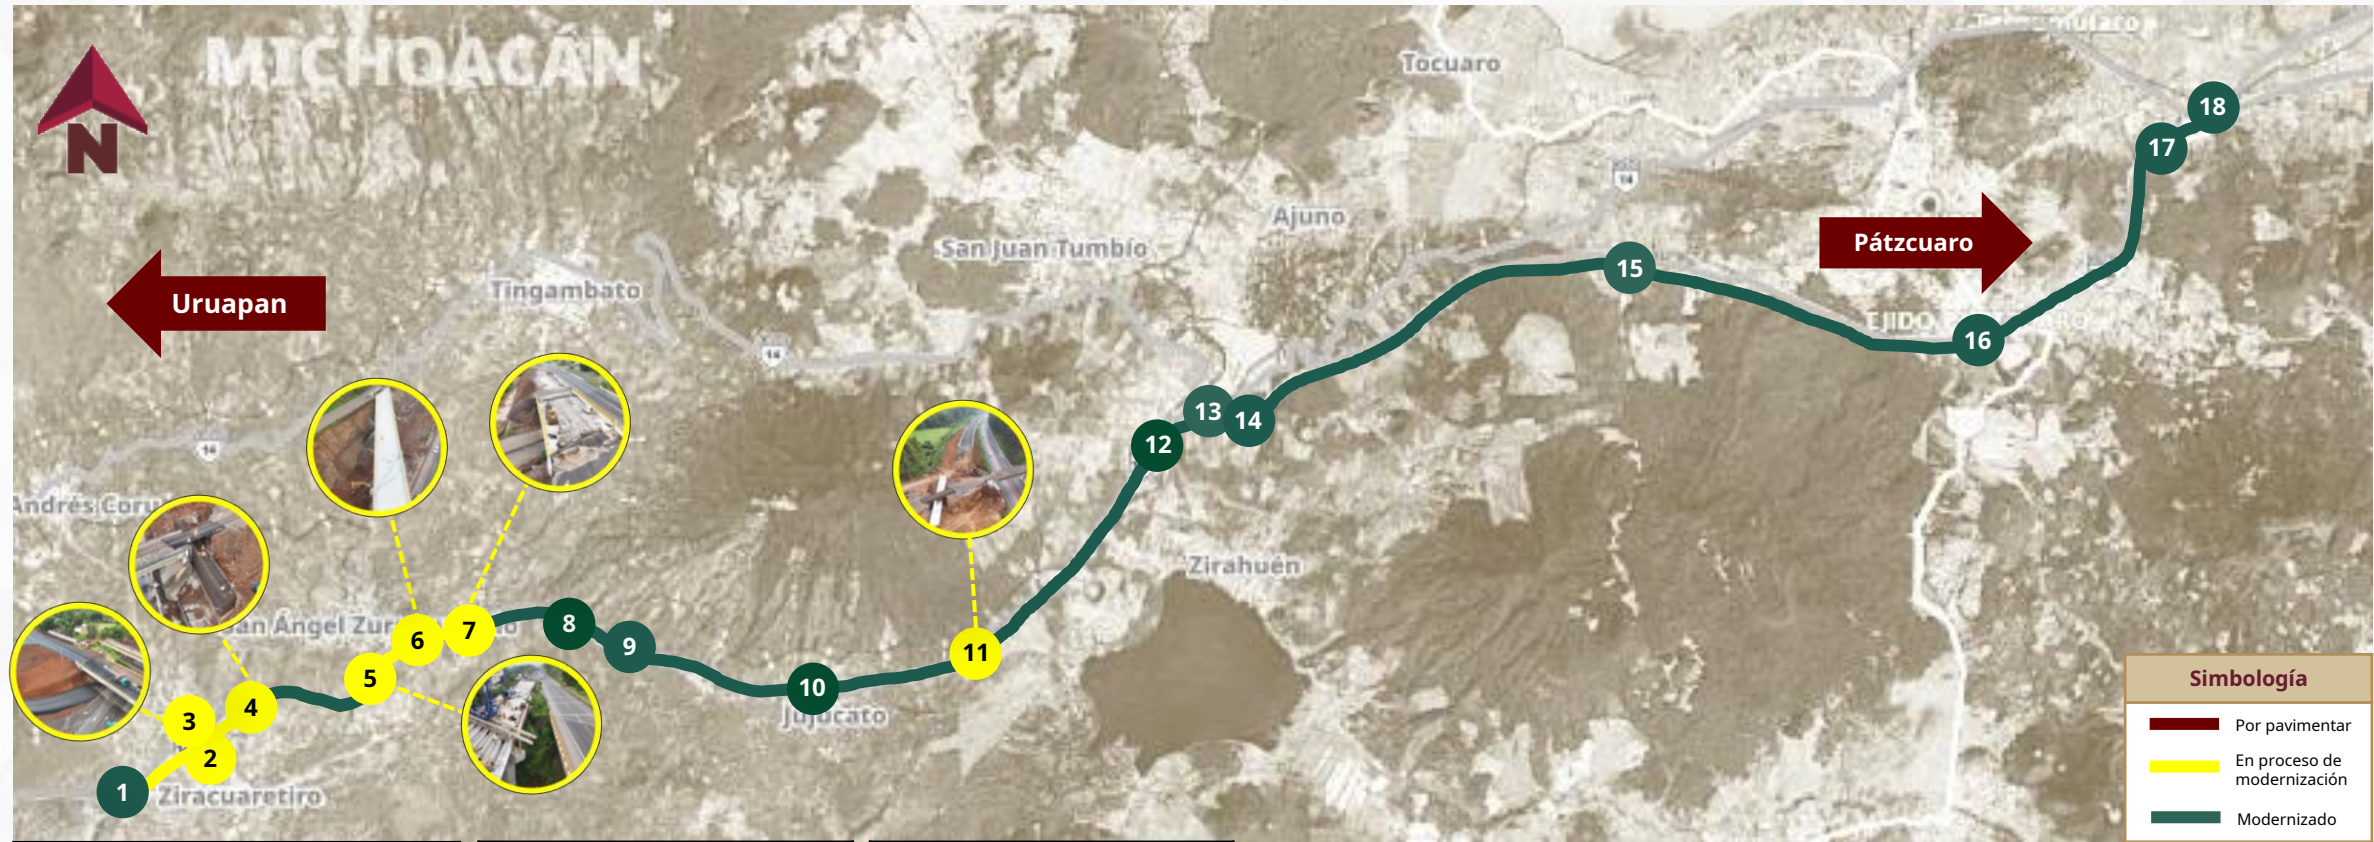

Descripción	
1	Entronque Zirimicuaro km 93+500
2	Puente canal km 92+210 (97.68%)
3	Entronque Caracha km 92+100, (75.69%).
4	PIFFCC km 91+754, (37.10%).
5	Puente Canintzio km 88+283, (72.12%)
6	PIV km 88+054, (94.40%)

Descripción	
7	Entronque San Ángel km 87+400, (97.15%)
8	Rampa de emergencia II km 86+500
9	Rampa de emergencia I km 84+100
10	Entronque Jujucato km 79+489
11	PIFFCC km 73+584, (34.51%)
13	Viaducto Zirahuén km 70+278
13	Entronque Zirahuén km 68+600

Descripción	
14	Caseta de cobro remota Zirahuén 68+600
15	Plaza de cobro Zirahuén km 60+500
16	Entronque Pátzcuaro II km 53+600
17	Entronque Pátzcuaro I km 47+500
18	Entronque las trojas km 47+00

 **Inversión:** 1,792 mdp

 **Inicio:** Julio 2017
Término: 30 septiembre 2025

 **Meta:** 46.79 km; 58 Totales
(1 plaza de cobro, 1 puente
1 viaducto, 8 entronques,
45 cruces, 2 rampas de frenado)

 **200 mil** habitantes beneficiados

 **25 minutos** de ahorro en tiempo.


Concesionaría : PINFRA.

Michoacán

Tramo Pátzcuaro-Uruapan

Elemento	Meta	Ejecutado acumulado	Faltante	22/08/2025 al 28/08/2025		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
Troncal						
PIFCC km 73+584. Cabezales	2	1	1	1	1	Habilitado de cimbra de madera previo a armado de acero de refuerzo para cabezal #1
PSV km 87+494 Accesos	2	0	2	1	1	Conformación y tendido de carpeta asfáltica
PIV km 88+054 Accesos	2	1	1	1	1	Trabajos de corte y retiro de material en acceso C1 (demolición antigua estructura)
Puente Canintzio km 88+283 Losas de compresión.	7	6	1	1	1	Colado de concreto para losa (claro 3-4)
Puente Canintzio km 88+283 Parapeto de concreto.	14	4	10	1	1	Habilitado de cimbra de acero para parapeto de concreto (claro 4-5 y 5-6)
PIFCC km 91+754. Cabezales	2	1	1	1	1	Armado de acero de refuerzo para muro “pantalla” en cabezal #1

Avance: Programado, Físico y Financiero (%)

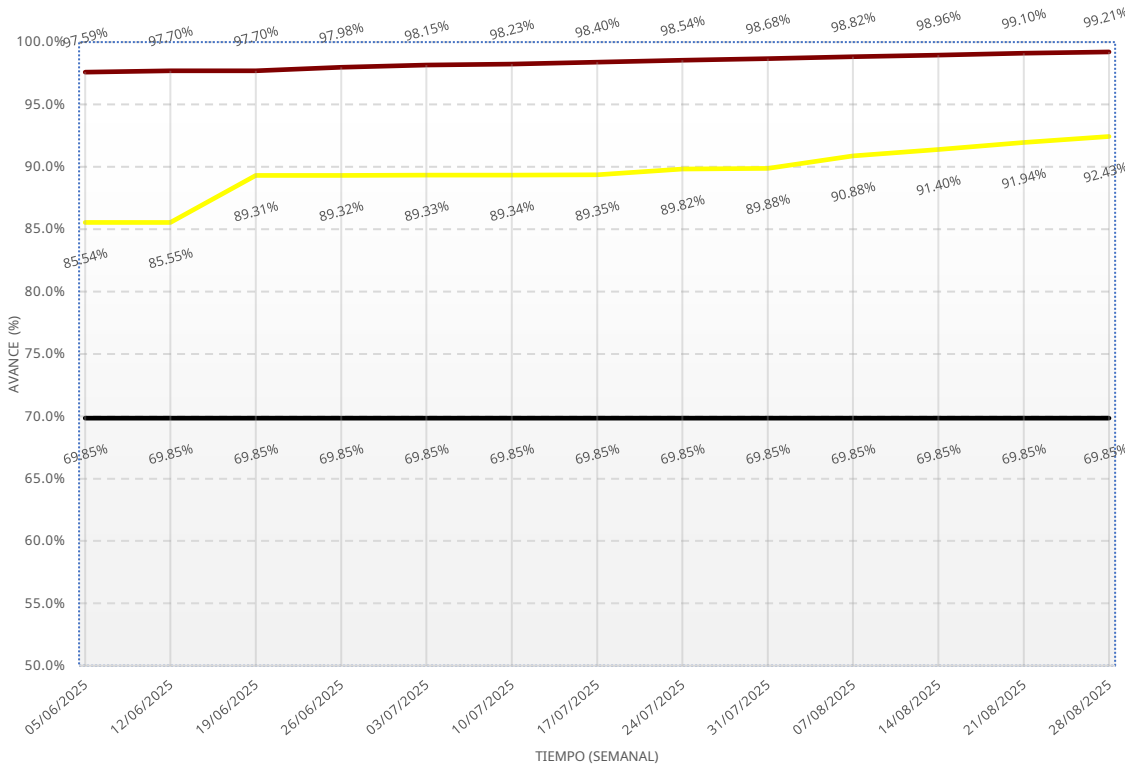

	15 de agosto al 21 de agosto	22 de agosto al 28 de agosto
Fuerza de Trabajo (personas)	340	120
Maquinaria	45	33



2025
Año de
La Mujer
Indígena
