

Nayarit


Tramo Tepic-Compostela





Avance físico


- Programado: 100 %
- Real: 95.69 %
- Financiero: 88.28 %
- Semanal: 0.51 %


Concesionaria: FONADIN


 **Inversión:** 2,473.43 mdp

-  **Meta:** 28 km
- 1 Plaza de cobro,
 - 10 Puentes,
 - 2 PSFC,
 - 1 Entronque (solo gazas)
 - 19 Cruces
 - Ramal Aeropuerto

 **Inicio:** Marzo 2023
Término: 31-Oct-2025

 **5,500** empleos generados

 **490 mil** habitantes beneficiados

 **35 minutos** de ahorro en tiempo

Nayarit

Tramo Tepic-Compostela




Gobierno de
México

Comunicaciones
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

Elemento	Meta	Ejecutado acumulable	Faltante	01/08/25 al 07/08/2025		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
Terraplén (m³)	1,982,866.26	1,963,394.62	19,471.64	150.00	250.00	
Puente 16.01 km 16+393.50						
Cortes (m³) Estabilización de taludes	2,443,497.56	2,350,872.63	92,624.93	7,500.00	8,100.00	
P.S.F.C. 21.01 km 21+601.50						
Junta de dilatación (pza)	2	0.96	1.04	0	0	Se movió personal para apoyo en las estructuras principales. En revisión fuerza de trabajo necesaria.

Avance: Programado, Físico y Financiero (%)

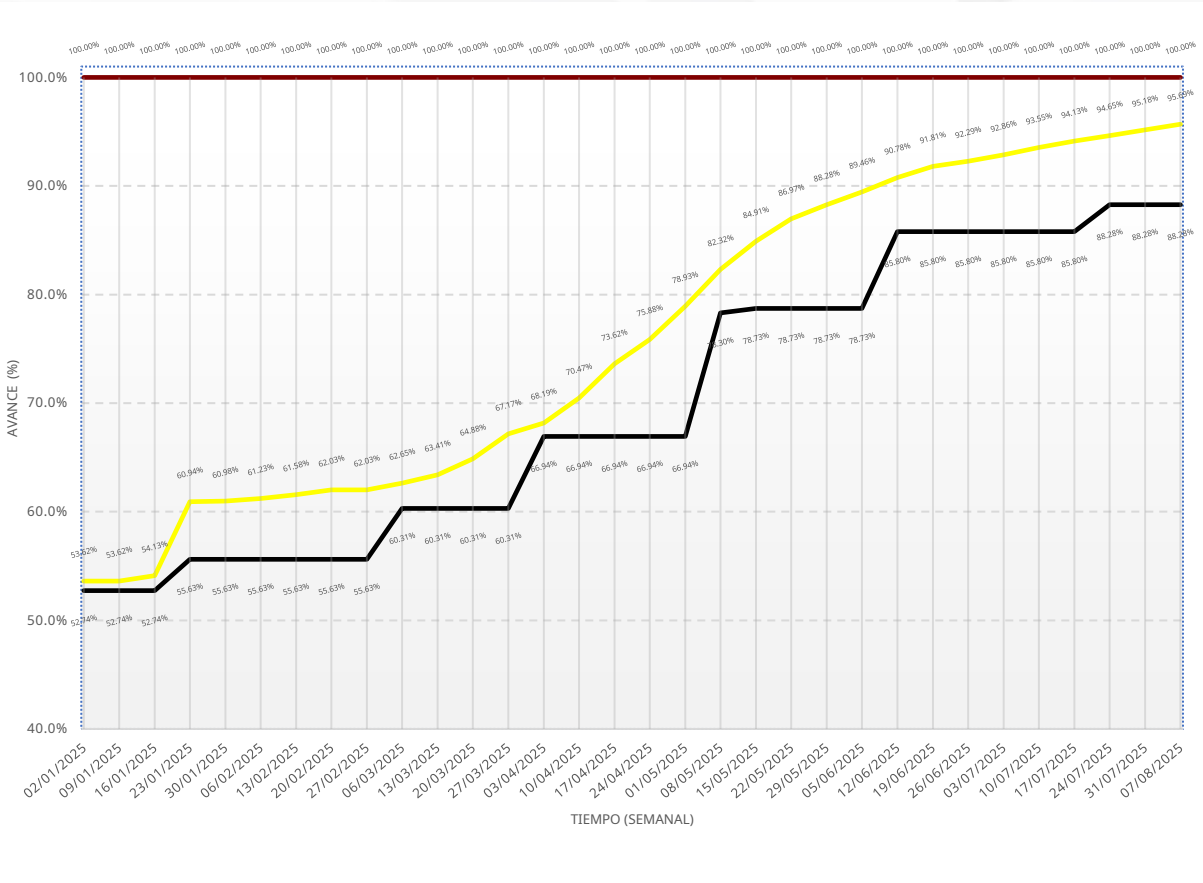

	Avance Programado	Avance Físico	Avance Financiero
	25 de julio al 31 de julio		01 de agosto al 07 de agosto
Fuerza de Trabajo (personas)	480		480
Maquinaria	86		86
