

# Colima


## Tramo Colima - Armería



**Comunicaciones**

Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

**Avance físico** • Programado: 20.64% • Real: 2.67% • Financiero: 0.53%

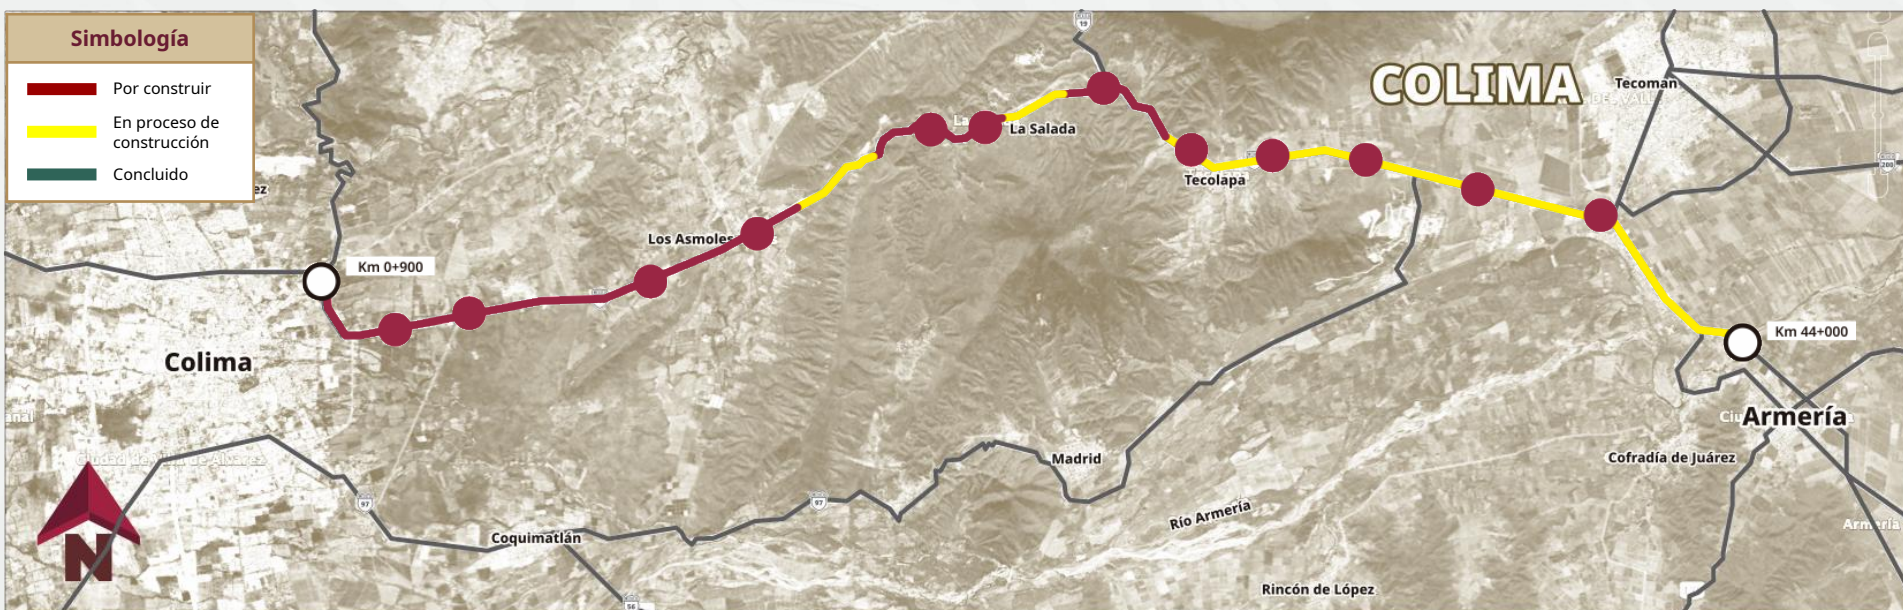

**Inversión:**  
3,613 mdp

**Inicio:** 03 Marzo 2025  
**Término:** 15 Octubre 2026

**Meta:** 43.1 km  
7 estructuras y 5 entronques

**Avance físico:**  
Programado: 20.64 %  
Real: 3.17 %  
Semanal: 0.50 %  
Financiero: 0.53 %

**10,842** empleos generados

3,614 empleos directos  
7,228 empleos indirectos

**312,000** habitantes beneficiados

**30 minutos** de ahorro en tiempo

| Descripción |  |
|-------------|--|
| 1           | Retorno a nivel Km+2.650 (Club de Golf)      |
| 2           | Vuelta izquierda Km 4+940(Loma de Fátima)    |
| 3           | Retorno a nivel Km 10+700 (Las Golondrinas)  |
| 4           | Entronque Los Asmoles Km 14+750 un PIV       |
| 5           | Estructura Pte. Lupita Km 19+420             |
| 6           | Estructura Pte. La Grulla Km 19+780          |
| 7           | Entronque Ixtlahuacán Km 24+300 un PTE       |
| 8           | PSV Tecolapa km 27+600                       |
| 9           | Estructura Pte. La Vainilla Km 31+650        |
| 10          | Entronque La Calera K 33+780 un PSV          |
| 11          | Estructura Caseta de Cobro Tecomán Km 35+960 |
| 12          | Entronque Tecomán Km 39+320 dos PSV          |

# Colima

## Tramo Colima-Armería


Actualizada



Comunicaciones  
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

| Elemento                     | Intervención | Ejecutado<br>acumulado | Faltante | 16/01/26 al 22/01/26 |           | Observaciones  |
|------------------------------|--------------|------------------------|----------|----------------------|-----------|--|
|                              |              |                        |          | Programa<br>do       | Ejecutado |  |
| Volúmenes de Obra en Troncal |              |                        |          |                      |           |  |
| Despalme(m³)                 | 50,676       | 50,676                 |          |                      |           | Vol. Corresponden únicamente al tramo con proyecto del km. 14+000 al km. 43+000. Con base al programa en esta semana se esta cumpliendo con los volúmenes de obra. |
| Corte (m³)                   | 183,425      | 183,425                |          |                      |           |  |
| Terraplén (m³)               | 53,415       | 53,415                 |          |                      |           |  |
| Base Hidráulica(m³)          | 9,843        | 7,077.9                | 2765.1   |                      |           |  |
| Base Asfáltica(m³)           | 4,461        | 4,461                  |          |                      |           |  |

Avance Programado - Físico - Financiero (%)

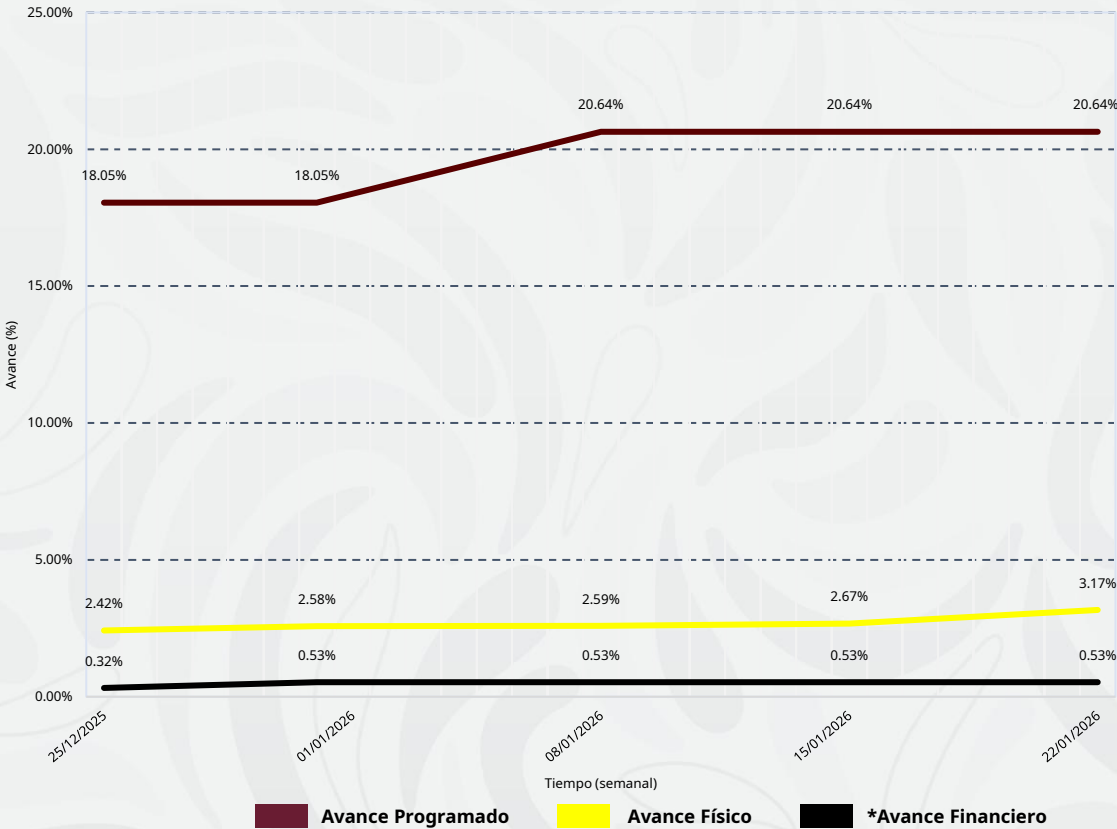

|                              | 09 al 15 de enero del 2026 | 16 al 22 de enero del 2026 |
|------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Fuerza de Trabajo (personas) | 149                        | 149                        |
| Maquinaria                   | 80                         | 80                         |
| Frente de Trabajo            | Km 14+000 al km 43+000     | Km 14+000 al km 43+000     |
