


# Jalisco

## Ampliación Libramiento Lagos de Moreno

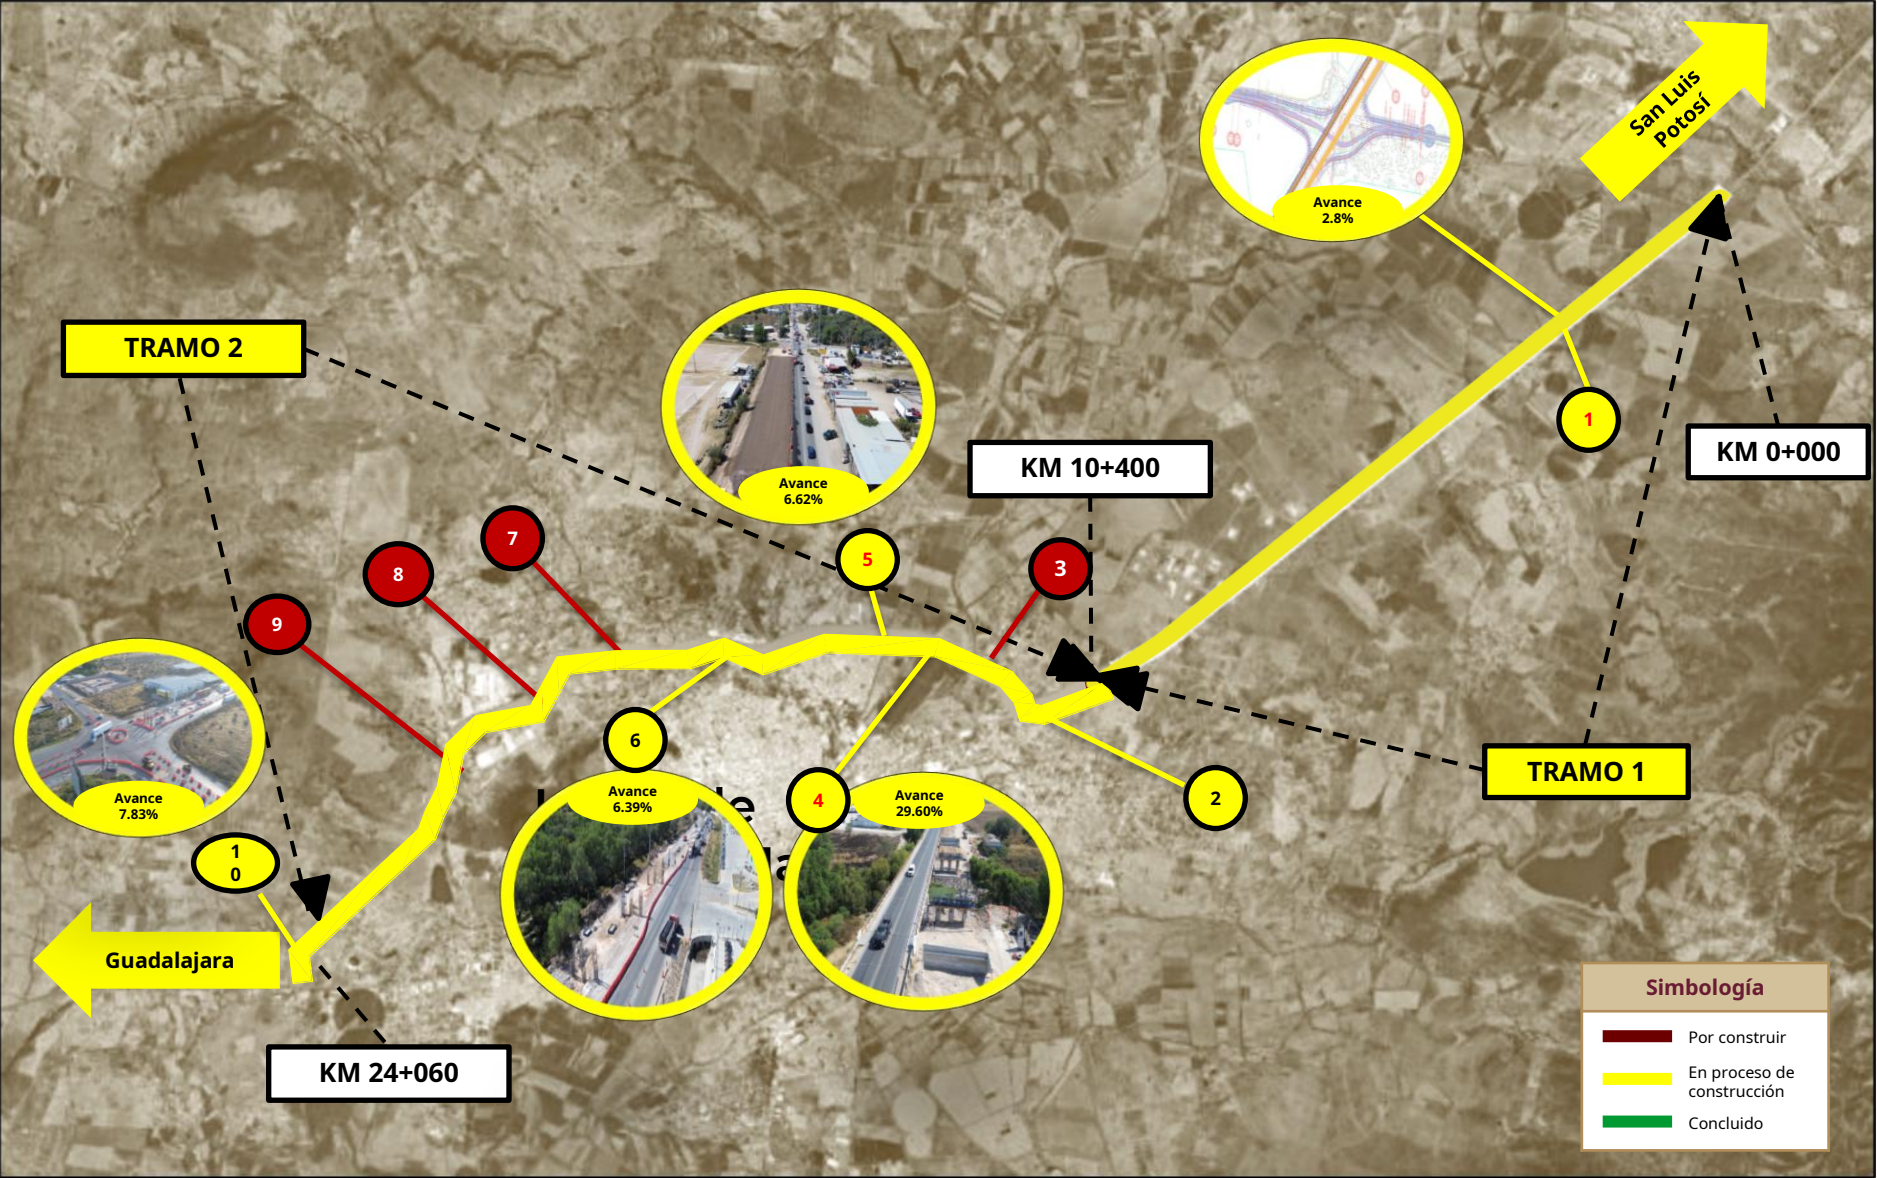

Descripción	
1	PIV con entronque "El Maguey" km 1+300 - <b>Avance 2.8%. Problemas de DDV.</b>
2	Entronque a desnivel Lagos de Moreno Este km 11+800 (adecuación)- <b>Avance 36.57%</b>
3	PIV con entronque "Fracc. Andalucía" km 12+120
4	Puente km 12+450 "Rio Lagos"- <b>Avance 29.60%</b> . Sin avance esta semana por logística de obra.(Proceso constructivo)
5	PIV con entronque "Sepúlveda" km 13+620 <b>Avance 6.62%</b> . Sin avance esta semana por logística de obra.(Proceso constructivo)
6	PSV con entronque "DRÄXLMAIER" km 15+900 <b>Avance 6.39%</b>
7	PIV con entronque "Santorini" km 17+800 (SE CANCELA ESTE PIV)
8	PIV con entronque "Encarnación" km 18+200
9	PSFC con retornos km 19+860
10	PIV con entronque Tipo Glorieta "Lagos de Moreno Oeste" km 23+920 <b>Avance 7.83%</b>

### Avance físico general

- Real: 41.63%
- Programado: 36.36%
- Semanal: 0.45%
- Financiero: 25.40 %



**Inversión: 2,345 mdp**



**Inicio:** 1 de marzo de 2025  
**Término:** 28 de febrero de 2028



**Meta:** 25 km, 4 entronques (el Entronque Santorini no se realizará), 1 puente, 2 PIV'S, 1 PSV, 1 PSFCC, 3 PIPR'S con rampa y 46 obras de drenaje



**2,345 empleos directos**  
**4,690 empleos indirectos**



**250,000 habitantes beneficiados**



**20 minutos de ahorro en tiempo**

# Jalisco


## Ampliación Libramiento Lagos de Moreno



Avance: Programado, Físico y Financiero (%)

TRAMO 2 -TERRACERIAS Y PAVIMENTOS TRONCAL							
Concepto	Unidad	Total	Ejecutado	Faltante	05/12/25 al 11/12/25		Observaciones
					Programado	Ejecutado	
Subrasante	m³	46,635	20,204	26,431	682	685	En proceso
Base hidráulica	m³	34,468	18,009	16,459	390	5,478	En proceso

TRAMO 2 - PSV AVANCE DE ESTRUCTURAS Y ENTRONQUES							
Concepto	Unidad	Total	Ejecutado	Faltante	05/12/25 al 11/12/25		Observaciones
					Programado	Ejecutado	
Entronque Lagos de Moreno Este	%	100%	36.57%	63.43%	0.00	25.60%	En proceso
Puente km 15+900	%	100%	6.39%	93.61%	0.00	0.01%	En proceso
PIV km 23+920	%	100%	7.83%	92.17%	0.00	0.01%	En proceso
Obras de drenaje	%	100%	8.90%	91.11%	1.92%	2.90%	En proceso

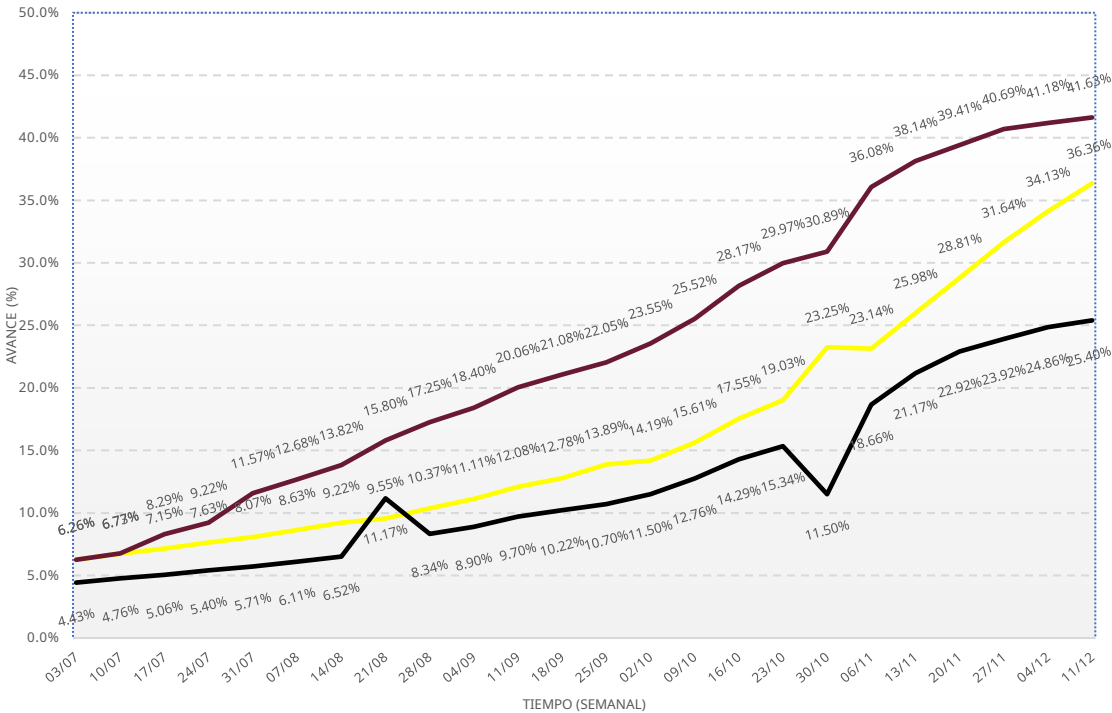

Avance Programado Avance Físico \*Avance Financiero

	28 de noviembre al 04 de diciembre	05 al 11 de diciembre
Fuerza de Trabajo (personas)	246	246
Maquinaria	69	69
Frentes de trabajo	Tramo 1 y Tramo 2	Tramo 1 y Tramo 2



2025  
Año de  
La Mujer  
Indígena
