


Nayarit

Tramo Tepic-Compostela

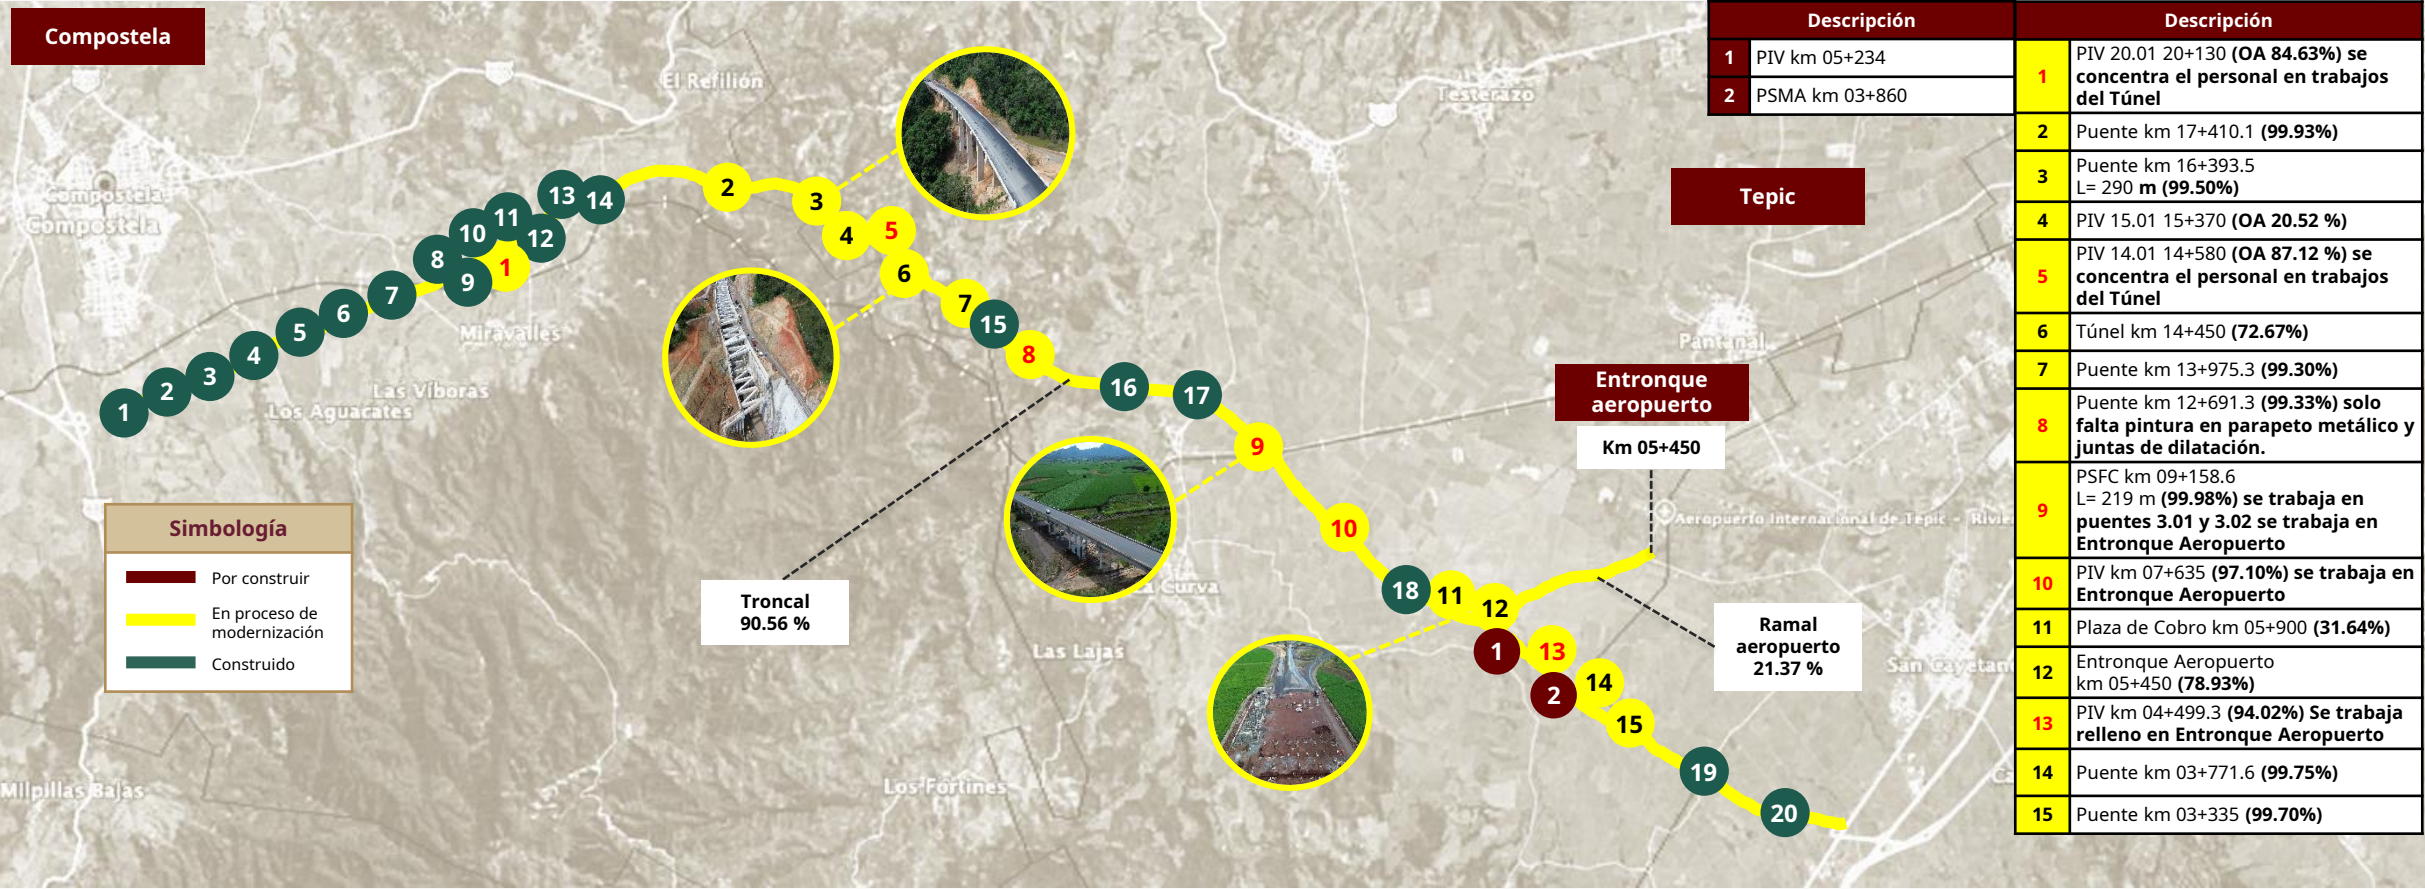


2025
Año de
La Mujer
Indígena


Avance físico:


- Programado: 100%
- Real: 98.08%
- Financiero: 88.28%
- Semanal: 0.27%


Concesionaria:
FONADIN


 **Inversión:** 2,473.43 mdp

-  **Meta:** 28 km
- 1 Plaza de cobro,
 - 10 Puentes,
 - 2 PSFC,
 - 1 Entronque (solo gasas)
 - 19 Cruces
 - Ramal Aeropuerto

 **Inicio:** Marzo 2023
Término: 31-Oct-2025

 **2,473** empleos directos generados
4,946 empleos indirectos generados

 **490 mil** habitantes beneficiados

 **35 minutos** de ahorro en tiempo

Nota: Las Estructuras en proceso remarcadas en color rojo, no presentan avance en el periodo semanal.

Nayarit

Tramo Tepic-Compostela




Gobierno de
México

Comunicaciones
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

Avance: Programado, Físico y Financiero (%)

| Elemento | Meta | Ejecutado acumulable | Faltante | 19/09/25 al 25/09/2025 | | Observaciones |
|--|--------------|----------------------|------------|------------------------|-----------|---|
| | | | | Programado | Ejecutado | |
| Terraplén (m3) | 1,982,866.26 | 2,005,949.62 | -23,083.36 | 15,000.00 | 16,660.00 | |
| Puente 16.01 km 16+393.50 | | | | | | |
| Columnas | 8 | 8 | 0 | | | Trabajos concluidos. |
| Cortes (m³) Estabilización de taludes | 2,443,497.56 | 2,423,372.63 | 20,124.93 | 2,350.00 | 2,500.00 | |
| P.S.F.C. 9.01 km 09+158.50 | | | | | | |
| Losa (claro) | 7 | 7 | 0 | | | Trabajos concluidos. |
| P.S.F.C. 21.01 km 21+601.50 | | | | | | |
| Junta de dilatación (pza) | 2 | 2 | 0 | | | Se movió personal para apoyo en las estructuras principales. En revisión fuerza de trabajo necesaria. |

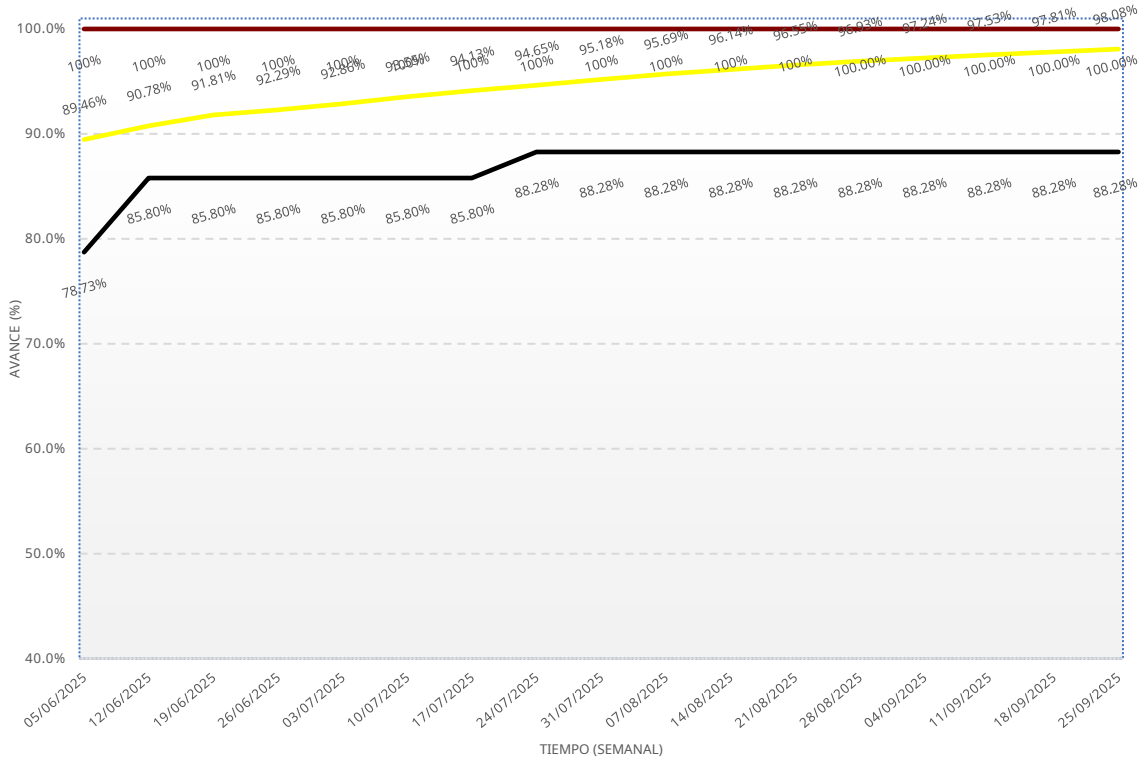

Avance Programado Avance Físico Avance Financiero

| | 12 de septiembre al 18 de septiembre | 19 de septiembre al 25 de septiembre |
|------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Fuerza de Trabajo (personas) | 450 | 450 |
| Maquinaria | 71 | 71 |
