

# Mitla-Entronque Tehuantepec II



**Gobierno de  
México**

**Comunicaciones**  
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

**Avance físico** • Programado: 100% • Semanal: 0.02%  
• Real: 99.60%

**Avance obra pendiente** • Real: 95.02%

**Avance financiero** • Real: 98.95%  
• Nota: De este porcentaje se tiene una deuda de 2,704.81 mdp por trabajos ejecutados.



Descripción	
1	PIV km 87+900. <b>40% Conflicto entre sindicatos de camioneros</b>
2	PIP km 91+530. <b>100%</b>
3	PIPR km 92+436. <b>100%</b>
4	PIV km 92+438. <b>100%</b>
5	PIP km 92+680. <b>0%</b>
6	Entronque Llano Crucero km 92+690. <b>82% Problemas D.V.</b>
7	Entronque Llano Laguna km 98+200. <b>100%</b>


Descripción	
8	Entronque Cerro Pascale km 100+500. <b>100%</b>
9	PIP km 106+570. <b>100%</b>
10	PIP km 108+570. <b>100%</b>
11	PIV km 109+247. <b>100%</b>
12	PIV km 110+460. <b>100%</b>
13	Entronque Danigare km 111+600. <b>100%</b>

**\*No hay avances debido a la falta de asfalto**

Descripción	
14	PIP km 112+270. <b>100%</b>
15	PIV km 114+766. <b>100%</b>
16	Entronque Agua Blanca Km 122+600. <b>100%</b>
17	Entronque Quiavicuzas Km 137+900. <b>100%</b>
18	PIPG Km 146+840. <b>95%</b>
19	PIPG km159+400. <b>95%</b>


**\*No hay avances debido a la falta de asignación de recursos**

**Inversión:** 29,749.2 mdp  
incluye I.V.A sin incluir  
reclamos


 **Término:** Inaugurada y puesta en operación 24 de enero de 2025 (pendiente obras complementarias)

\*Nota: De los pasos de servidumbre 9 están terminados, 2 con un 95%, 1 al 40% y 5 sin iniciar  
 \*El Túnel Tornillo se encuentra colapsado y en proceso de determinar su solución

**Meta:** 65 puentes, 14 viaductos, 10 túneles, 20 entronques, 2 casetas y 17 pasos de servidumbre. En proceso: Trabajos en la troncal, 1 entronque y 8 pasos de servidumbre

 **12,204** empleos generados

 **+1 millón 400 mil** habitantes beneficiados

 **2 hrs** de ahorro en tiempo

**Concesionaria: IDEAL**

# Oaxaca

## Mitla-Entronque Tehuantepec II




Gobierno de  
**México**

**Comunicaciones**  
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

Elemento	Intervención	Ejecutado acumulado	Faltante	11/08/25 al 14/08/25		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
Esta semana no hubo avances						

**\*Nota:** Los trabajos complementarios están en definición de alcance presupuestal

Avance: Programado, Físico y Financiero (%)

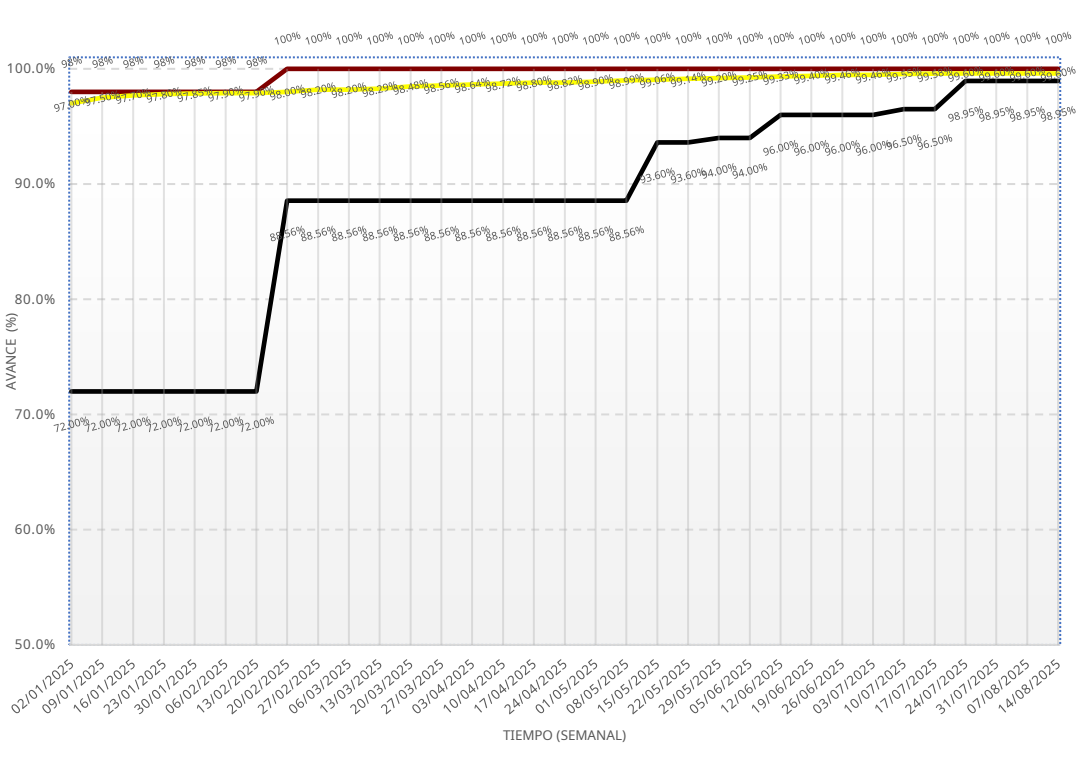

Avance Programado    Avance Físico    Avance Financiero

	01 de agosto al 07 de agosto	08 de agosto al 14 de agosto
Fuerza de Trabajo (personas)	200	100
Maquinaria	25	25
