


Michoacán

Uruapan-Nueva Italia

Avance físico

- Programado: 9.49 %
- Real: 9.09 %
- Semanal: 0.18 %
- Financiero: 0%

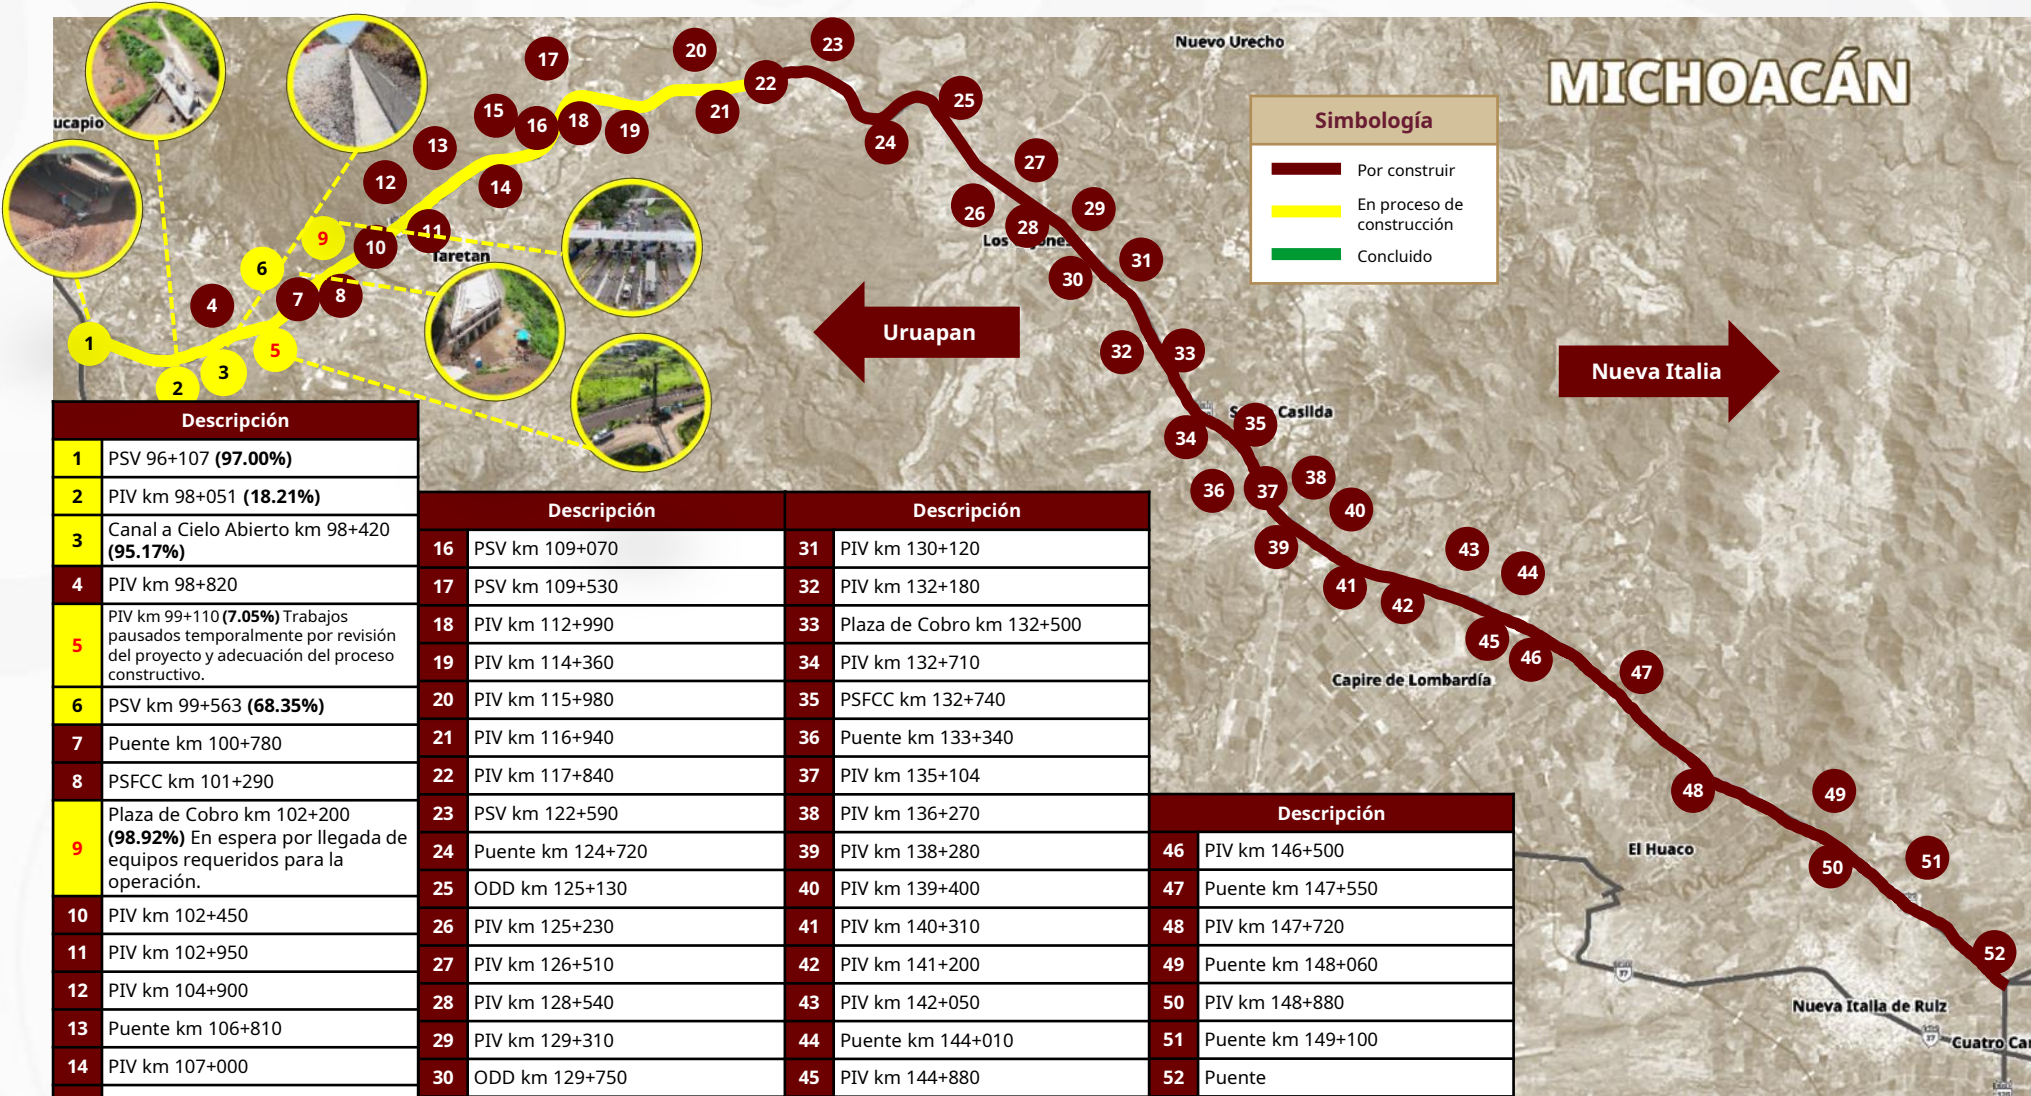

-  **Inversión: 7,049 mdp**
-  **Inicio:** noviembre de 2023
Término: agosto de 2027
-  **Meta: 67.09 km**
 - 65 km (troncal)
 - 2.09 km (estructuras)
 - 2 plazas de cobro, 10 puente, 6 entronques, 54 cruces y múltiples obras de drenaje.
-  **12,480 empleos generados**
-  **1,800,000 habitantes beneficiados**
-  **25 minutos de ahorro en tiempo**
- Concesionaria : PINFRA.**

Nota:
Las Estructuras en proceso remarcadas en color rojo, no presentan avance en el periodo semanal.

Michoacán

Uruapán-Nueva Italia




Gobierno de
México

Comunicaciones
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

Elemento	Meta	Ejecutado acumulable	Faltante	29/08/2025 al 04/09/2025		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
Subbase	65 km	6.93 km	58.07 km	.200 km	.200 km	
Subyacente	65 km	8.46 km	56.54 km	.200 km	.200 km	
PSV 96+107 Conos de derrame	2	1	1	1	1	Construcción de lavadero en acceso C1
PSV 98+051 Demoliciones	2	1	1	1	1	Retiro de parapeto metálico de antiguo PIV
PSV 99+563 Guarniciones	2	1	1	1	1	Retiro de cimbra de madera en parapeto de concreto y diafragmas exteriores acceso C1.

Avance: Programado, Físico y Financiero (%)

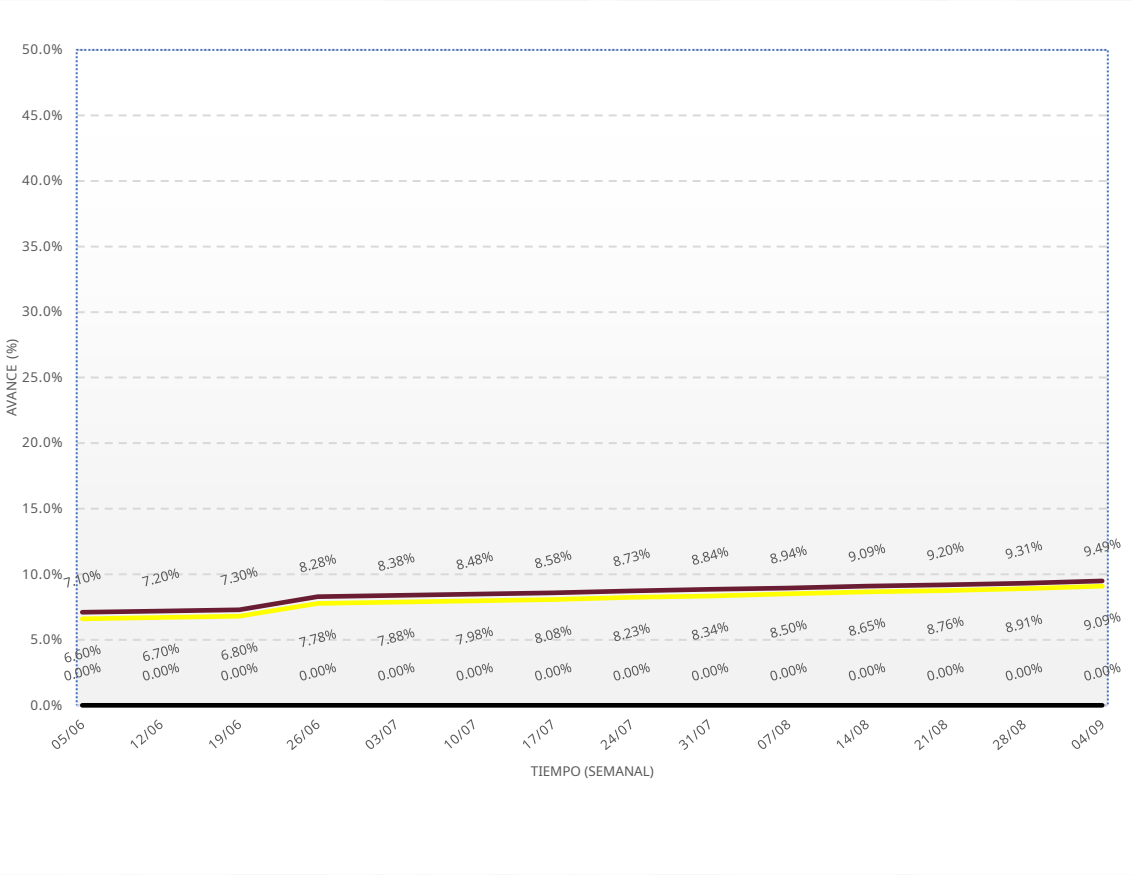

Avance Programado Avance Físico Avance Financiero

	Del 22 de agosto al 28 de agosto	Del 29 de agosto al 04 de septiembre.
Fuerza de Trabajo (personas)	1,500	223
Maquinaria	570	570



2025
Año de
La Mujer Indígena
