

Chiapas

Entronque San Cristóbal

Concesionaria de Autopistas del Sureste SA de CV

Avance físico

- Programado: 0.00%
- Real: 25.17%
- Semanal: 0.00%


Avances

En septiembre se prevé el reinicio de las obras para la conclusión del entronque. El proyecto ejecutivo se encuentra autorizado y el derecho de vía necesario modificado.



Gobierno de
México

Comunicaciones
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

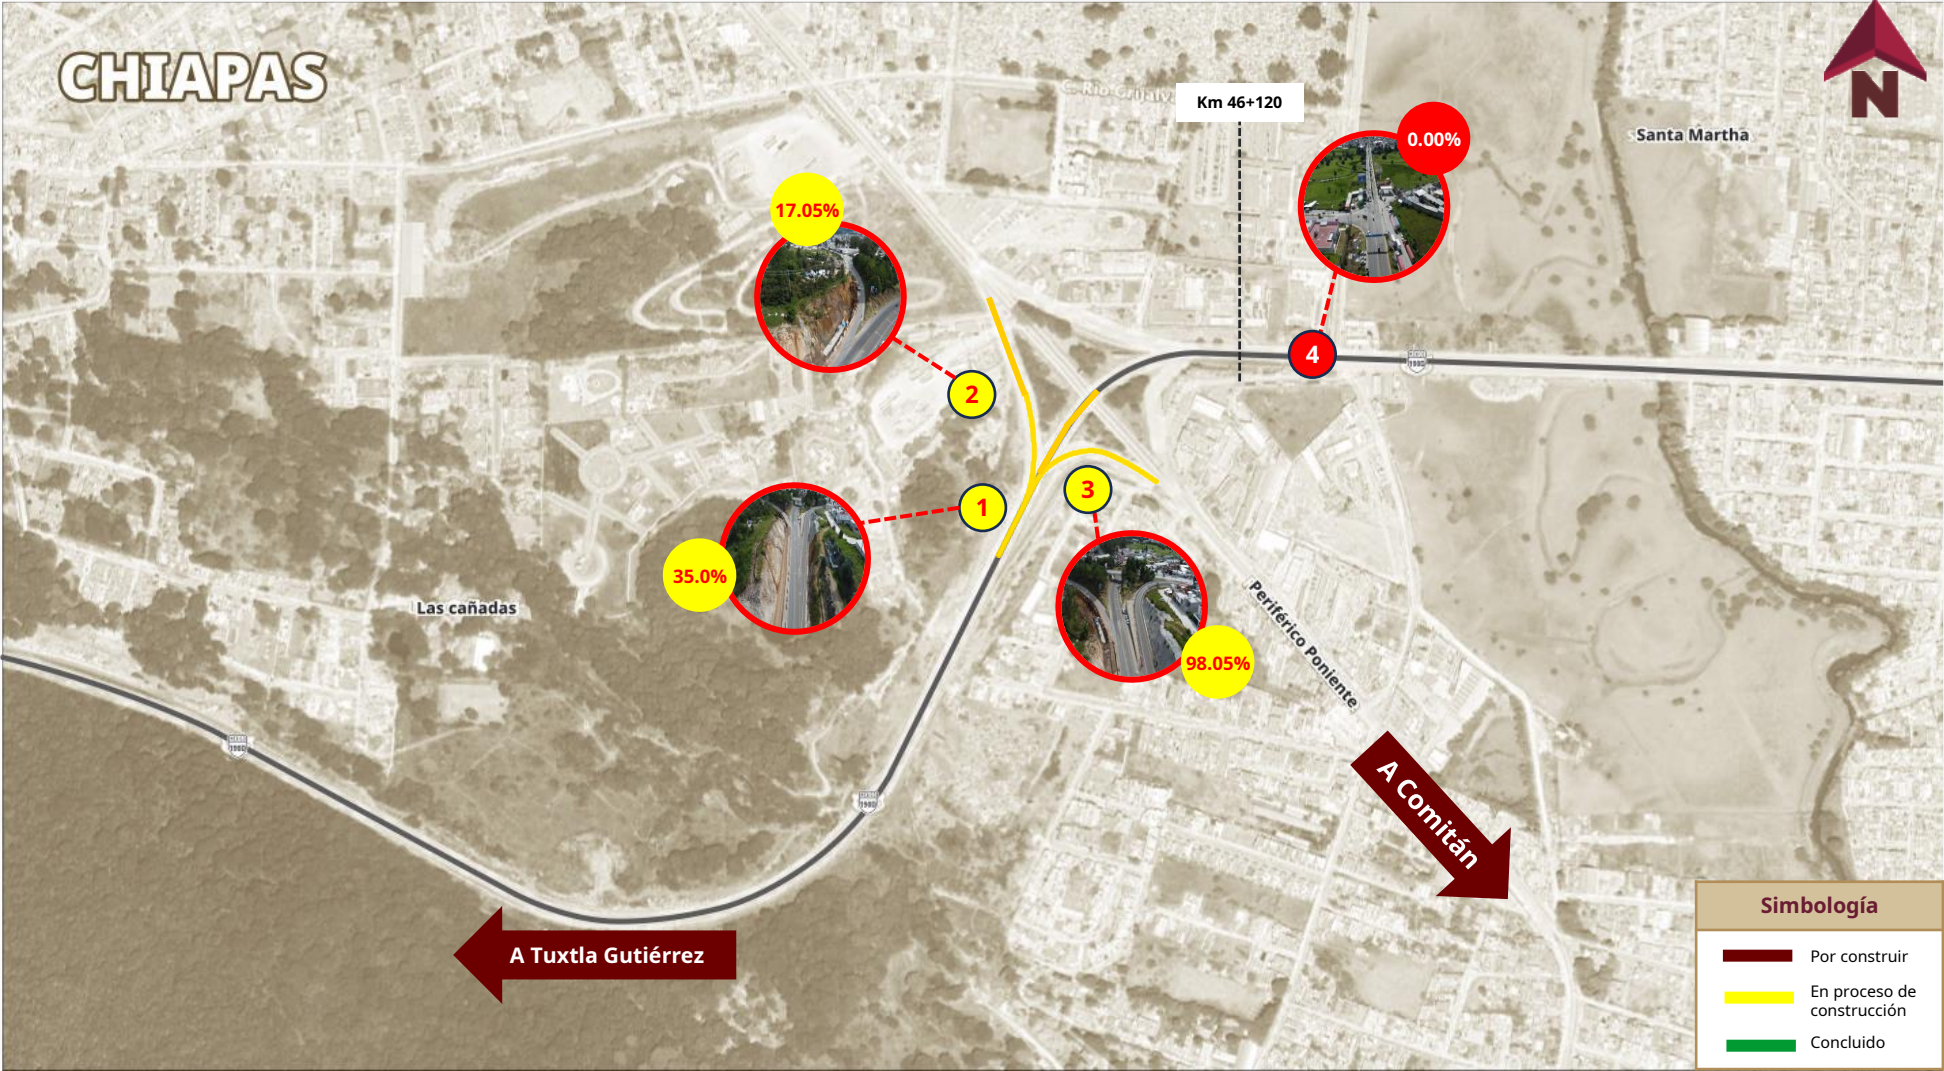

Inversión: 44.96 mdp

Meta: 1 Entronque

Avance físico:

- Real: 25.17%
- Financiero: 22.96%

Inicio:
Término: Por definir

135 empleos generados

200,000 mil habitantes beneficiados

- Mayor movilidad hacia los diferentes destinos.
- Disminución de accidentes.
- Se evitan vueltas prohibidas.

Descripción		Observaciones
1	Eje 50: 35.00%	El 22-Jul-2025, La Concesionaria entregó a la DGDC, la solicitud de reanudación de los trabajos, junto con el programa de obra para su autorización.
2	Eje 2: 17.05%	
3	Eje 20: 98.05%	
4	Eje 4 (Glorieta a nivel de piso): 0.00%	
