


Descripción	
1	Entronque El Maguey km 1+300 - Avance 2.8%
2	Entronque a desnivel Lagos de Moreno Este km 11+800
3	PIV Fracc. Andalucía Km 12+129
4	Puente Km 12+800
5	PIV Sepúlveda Km 13+620
6	PSV Draexlmaier Km 15+900
7	Entronque Santorini Km 17-800
8	Entronque Encarnación (Trébol) Km 18+200
9	PSFC Km 19+860
10	Entronque a desnivel Lagos de Moreno Oeste Km 23+920


Avance físico

- Programado: 7.15%
- Real: 8.29%
- Semanal: 1.52%
- Financiero: 5.06 %

 **Inversión: 1,605 mdp**

 **Inicio:** 1 de marzo de 2025
Término: 28 de febrero de 2028


Meta: 25 km **4,000** empleos generados

 **250,000** habitantes beneficiados

 **20 minutos** de ahorro en tiempo

Jalisco

Ampliación Libramiento Lagos de Moreno




PANORÁMICA TERRAPLÉN KM 4+400



Gobierno de México

Comunicaciones
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

Avance: Programado, Físico y Financiero (%)

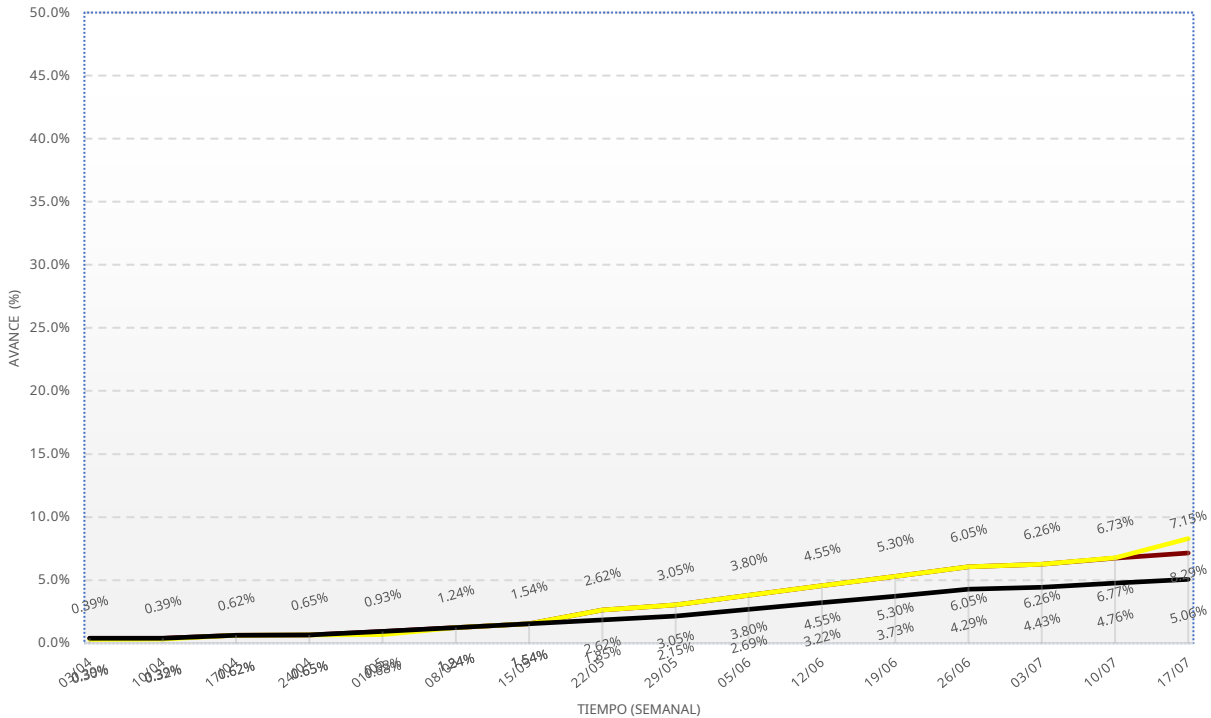

Avance Programado Avance Físico *Avance Financiero

	04 al 10 de julio de 2025	11 al 17 de julio de 2025
Fuerza de Trabajo (personas)	138	138
Maquinaria	49	50
