

Oaxaca

Mitla-Entronque Tehuantepec II



Gobierno de México

Comunicaciones

Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

Avance físico • Programado: 100% • Semanal: 0.02%
• Real: 99.60%

Avance obra pendiente • Real: 95.02%

Avance financiero

- Real: 97.96%
- Nota: De este porcentaje se tiene una deuda de 2,798 mdp por Trabajos ejecutados.



Descripción	
1	PIV km 87+900. 40% Conflicto entre sindicatos de camioneros
2	PIP km 91+530. 100%
3	PIPR km 92+436. 100%
4	PIV km 92+438. 100%
5	PIP km 92+680. 0%
6	Entronque Llano Crucero km 92+690. 82% Problemas D.V.
7	Entronque Llano Laguna km 98+200. 100%

Descripción	
8	Entronque Cerro Pascle km 100+500. 100%
9	PIP km 106+570. 100%
10	PIP km 108+570. 100%
11	PIV km 109+247. 100%
12	PIV km 110+460. 100%
13	Entronque Danigare km 111+600. 100%
14	PIP km 112+270. 100%

Descripción	
15	PIV km 114+766. 100%
16	Entronque Agua Blanca Km 122+600. 100%
17	Entronque Quiavicuzas Km 137+900. 100%
TT	Túnel El Tornillo km 139+400 (Colapsado)
18	PIPG Km 146+840. 95%*
19	PIPG km159+400. 95%*

***No hay avances debido a la falta de asignación de recursos**

 **Inversión:** 29,749.2 mdp incluye I.V.A sin incluir reclamos

 **Término:** Inaugurada y puesta en operación 24 de enero de 2025 (pendiente obras complementarias)

Meta: 65 puentes, 14 viaductos, 10 túneles, 20 entronques, 2 casetas y 17 pasos de servidumbre. En proceso: Trabajos en la troncal, 1 entronque y 8 pasos de servidumbre

- ❖ Nota: De los pasos de servidumbre 9 están terminados, 2 con un 95%, 1 al 40% y 5 sin iniciar
 - ❖ El Túnel Tornillo se encuentra colapsado y en proceso de determinar su solución



9,749 empleos generados y
9,498 empleos indirectos



1 millón 400 mil habitantes
eneficiados



hrs de ahorro en tiempo

Oaxaca

Mitla-Entronque Tehuantepec II



Gobierno de
México


Comunicaciones
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

Elemento	Intervención	Ejecutado acumulado	Faltante	07/11/25 al 13/11/25		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
Perforación de pilares	38	17	21	0	0	
Armado y colado de pilares	38	17	21	0	0	• Armado de pilares.

❖ Nota: A partir de esta fecha, ya no existirán avances debido a la considerable deuda que se tiene con las empresas contratadas por la concesionaria a la fecha y la falta de recursos presupuestales.



2025
Año de
La Mujer
Indígena

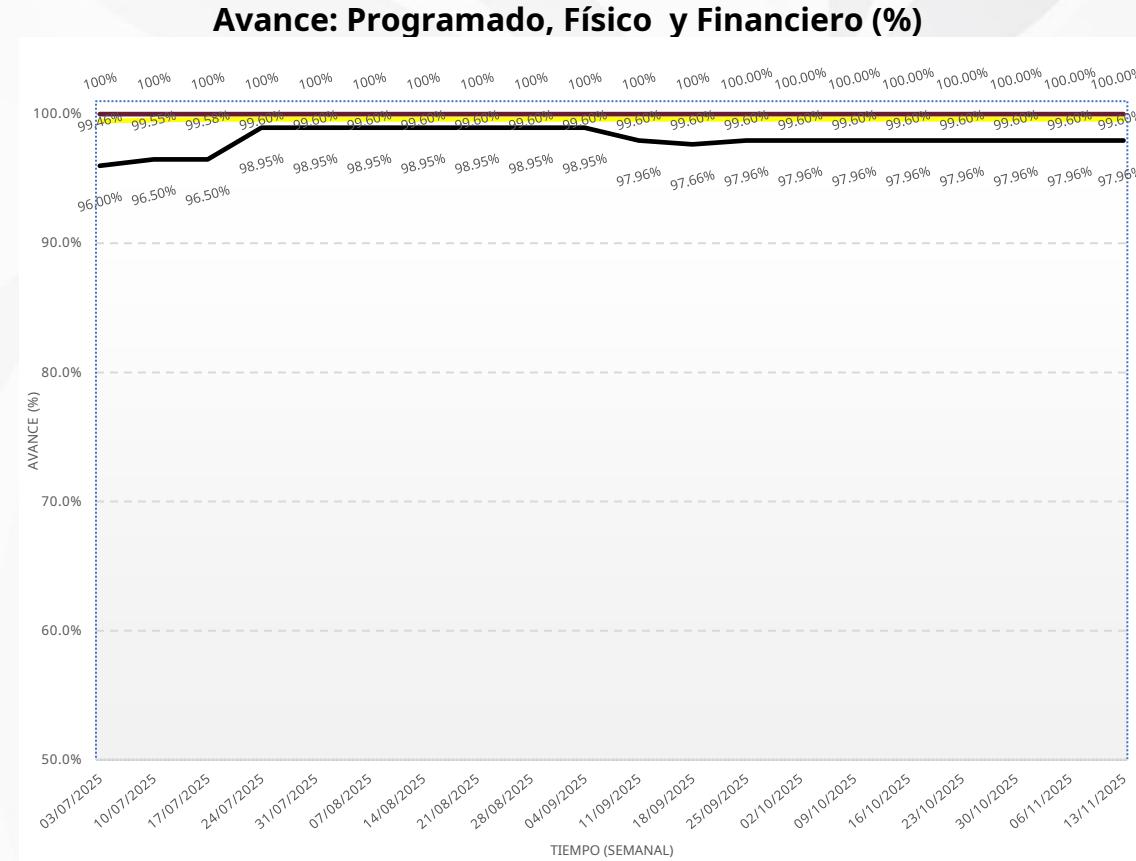

■ Avance Programado ■ Avance Físico ■ Avance Financiero

	31 de octubre al 06 de noviembre	07 de noviembre al 13 de noviembre
Fuerza de Trabajo (personas)	30	30
Maquinaria	9	9
