
## **Nayarit**

### Tramo Tepic-Compostela





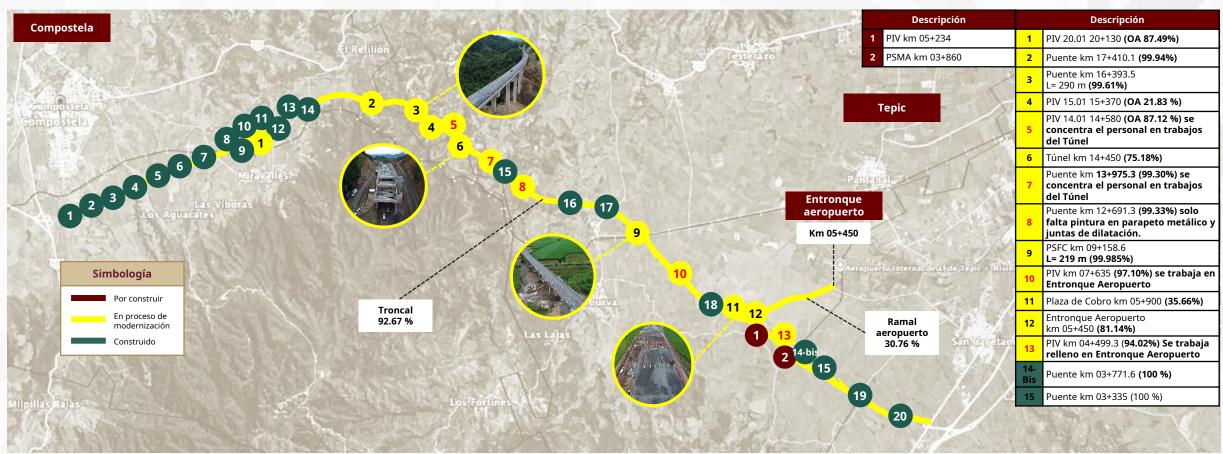

#### Avance físico

• Programado: 100 %

• Real: 98.33 %

• Financiero: 88.28 %


• Semanal: 0.25 %

Concesionaria: FONADIN

**[]** Inversión: 2,473.43 mdp

- **Meta:** 28 km
  - 1 Plaza de cobro,
  - 10 Puentes,
  - 2 PSFC,
  - 1 Entronque (solo gazas)
  - 19 Cruces
  - Ramal Aeropuerto

**Inicio:** Marzo 2023 **Término:** 31-Oct-2025



**iii) 490 mil** habitantes beneficiados

🕔 **35 minutos** de ahorro en tiempo

# **Nayarit**


## Tramo Tepic-Compostela

Elemento	Meta	Ejecutado acumulabl e	Faltante	26/09/25 al 02/10/2025			
				Programad o	Ejecutado	Observaciones	
Terraplén (m3)	1,982,866.26	2,012,449.62	-29,583.36	5,000.00	6,500.00		
Puente 16.01 km 16+393.50							
Columnas	8	8	0			Trabajos concluidos.	
Obras de drenaje	77	77	0			Trabajos concluidos.	
P.S.F.C. 9.01 km 09+158.50							
Losa (claro)	7	7	0			Trabajos concluidos.	
P.S.F.C. 21.01 km 21+601.50							
Junta de dilatación (pza)	2	2	0			Se movió personal para apoyo en las estructuras principales. En revisión fuerza de trabajo necesaria.	





#### Avance: Programado, Fisico y Financiero (%)

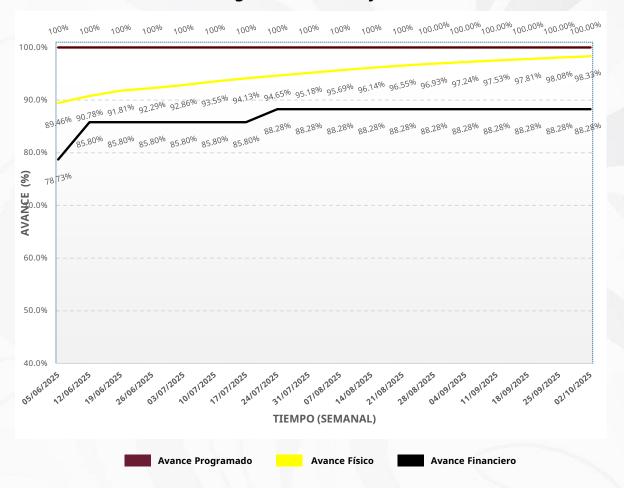

	19 de septiembre al 25 de septiembre	26 de septiembre al 02 de octubre	
Fuerza de Trabajo (personas)	450	450	
Maquinaria	71	71	
