

# Michoacán

## Tramo Pátzcuaro - Uruapan


### Avance físico

- Programado: 100.00%
- Semanal: 0.08 %
- Real: 98.70%
- Financiero: 69.85%



Gobierno de  
México

Comunicaciones  
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

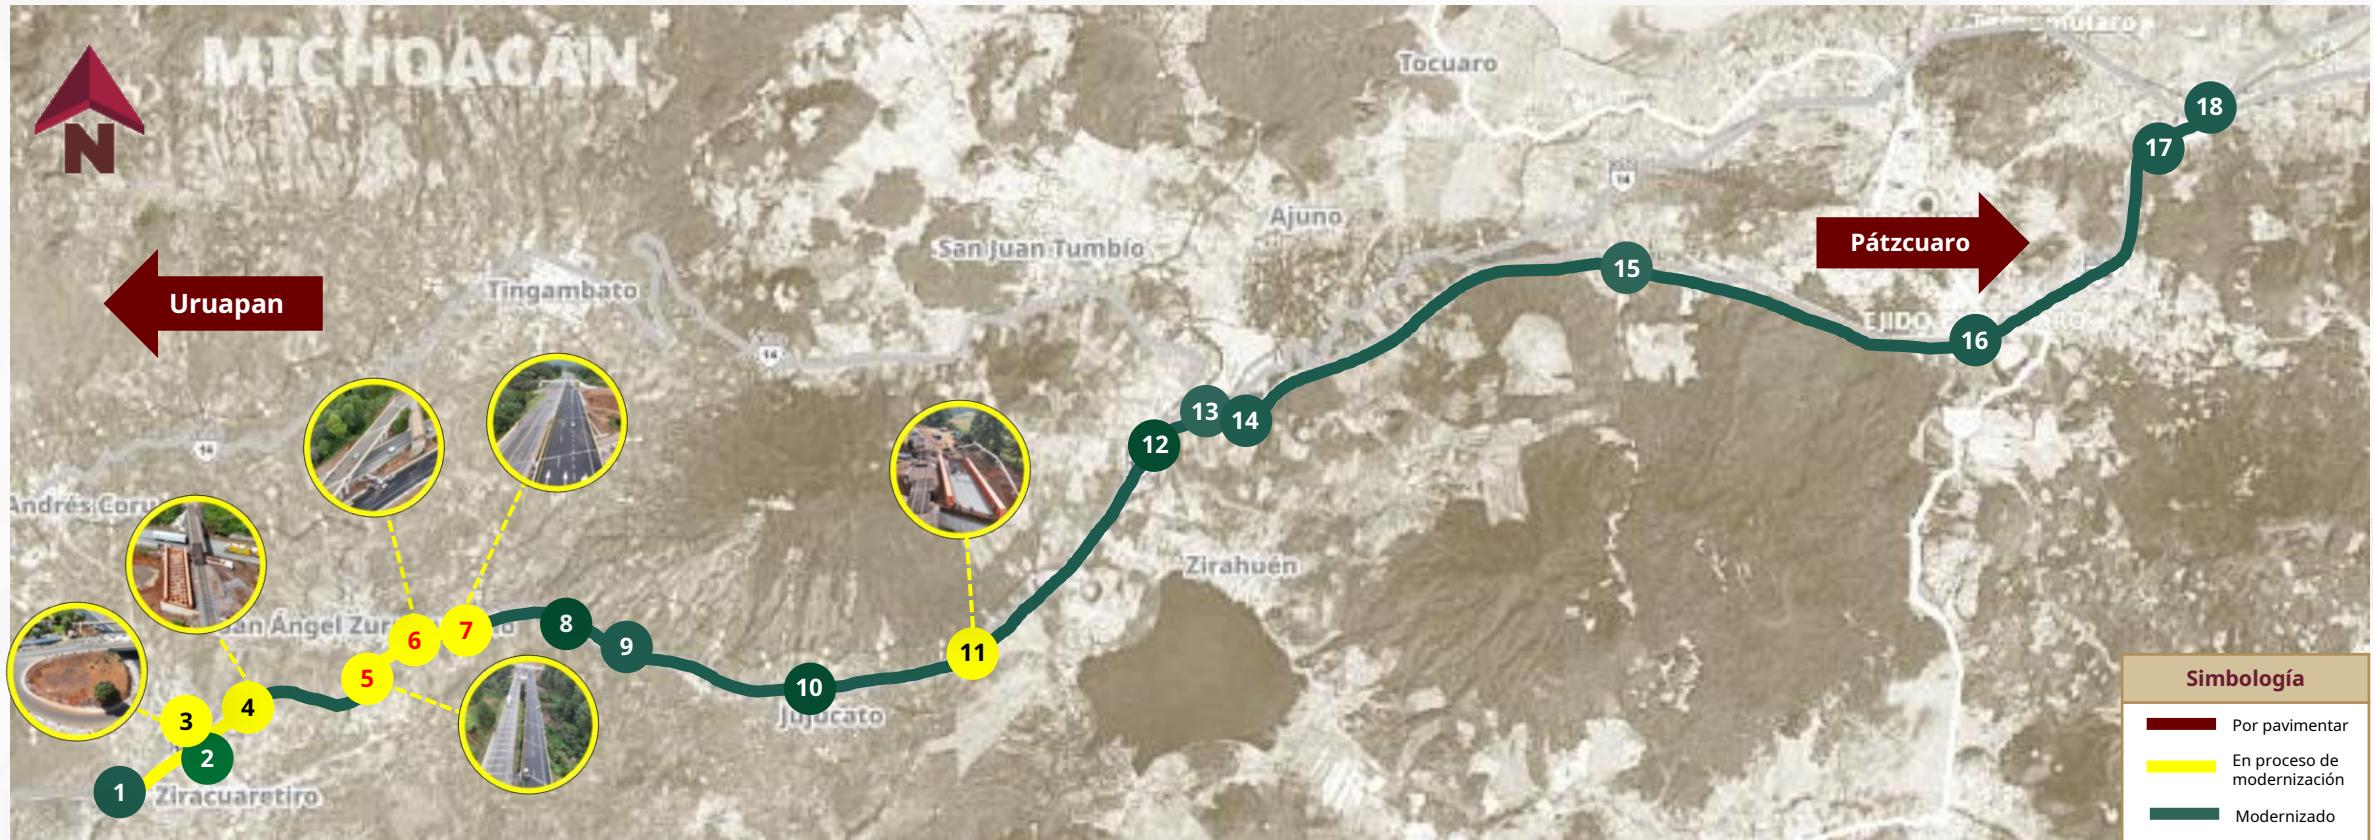

Descripción	
1	Entronque Zirimicuaro km 93+500
2	Puente canal km 92+210
3	Entronque Caracha km 92+100, (94.00%).
4	PIFCC km 91+754, (40.60%).
5	Puente Canintzio km 88+283, (99.95%) En espera de verificación para recepción de los trabajos
6	PIV km 88+054, (99.95%) En espera de verificación para recepción de los trabajos

Descripción	
7	Entronque San Ángel km 87+400, (99.95%) En espera de verificación para recepción de los trabajos
8	Rampa de emergencia II km 86+500
9	Rampa de emergencia I km 84+100
10	Entronque Jujucato km 79+489
11	PIFCC km 73+584, (43.00%)
12	Viaducto Zirahuén km 70+278
13	Entronque Zirahuén km 68+600

Descripción	
14	Casetas de cobro remota Zirahuén 68+600
15	Plaza de cobro Zirahuén km 60+500
16	Entronque Pátzcuaro II km 53+600
17	Entronque Pátzcuaro I km 47+500
18	Entronque las trojas km 47+000

**Inversión:** 1,792 mdp

**Inicio:** Julio 2017

**Término:** 30 septiembre 2025

**Meta:** 46.79 km; 58 Totales (1 plaza de cobro, 1 puente, 1 viaducto, 8 entriones, 45 cruces, 2 rampas de frenado).

**200 mil habitantes beneficiados**

**25 minutos de ahorro en tiempo.**

**1,792 empleos directos generados**  
**3584 empleos indirectos generados**

**Concesionaria :** PINFRA.

# Michoacán

Tramo Pátzcuaro - Uruapan




Gobierno de  
México

Comunicaciones  
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

Elemento	Meta	Ejecutado acumulado	Faltante	13/11/2025 al 20/11/2025		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
<b>Troncal</b>						
PIFCC km 73+584. Superestructura	1	0	1	1	1	Suministro, colocación y vibrado de concreto hidráulico para guarnición
Entronque Caracha Km 92+197 Losa de acceso	2	0	2	2	2	Colado de concreto hidráulico para losa de acceso C1 en PIV.
PIFCC km 91+754. Superestructura	1	0	1	1	1	Habilitado de cimbra para losa

Avance Programado - Físico - Financiero (%)

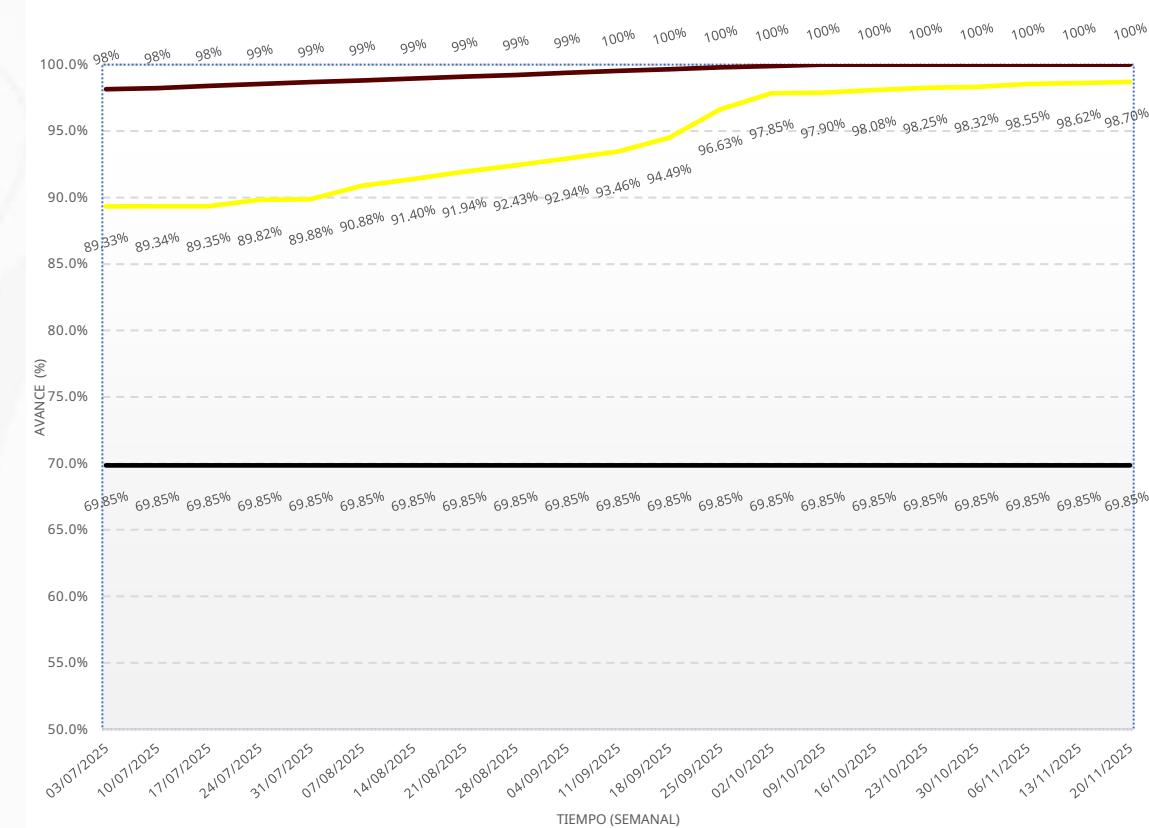

2025  
Año de  
La Mujer  
Indígena

Avance Programado      Avance Físico      Avance Financiero

	06 de noviembre al 13 de noviembre	13 de noviembre al 20 de noviembre
Fuerza de Trabajo (personas)	120	120
Maquinaria	32	32
