

# Oaxaca

## Mitla - Entronque Tehuantepec II



**Inversión:** 29,749.2 mdp



**Meta:** 169 km, 65 puentes, 14 viaductos, 10 túneles, 20 entronques, 2 casetas, 21 pasos de servidumbre



**Avance físico:**

- Programado: 100%
- Real: 98.56%



**Término:** Inaugurada y puesta en operación 24 de enero de 2025 (pendiente obras complementarias)



**12,204 empleos generados**



**+1 millón 400 mil habitantes beneficiados**



**2 hrs** de ahorro en tiempo



**2025**  
Año de  
**La Mujer  
Indígena**



Gobierno de  
**México**

Comunicaciones  
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes



# Programa de continuidad

## Oaxaca Mitla – Entronque Tehuantepec II



Gobierno de  
México

Comunicaciones  
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

	Alcance	Avances	¿Qué falta?
<b>Meta</b>	<b>169 km (carpeta troncal)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 65 puentes,</li> <li>• 14 viaductos,</li> <li>• 10 túneles,</li> <li>• 20 entronques</li> <li>• 21 pasos de servidumbre</li> <li>• 2 casetas.</li> </ul>	<b>169.23 km</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 65 puentes,</li> <li>• 14 viaductos,</li> <li>• 10 túneles,</li> <li>• 14 entronques</li> <li>• 21 pasos de servidumbre</li> <li>• 2 casetas.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 6 entronques</li> <li>• 21 pasos de servidumbre</li> </ul>
<b>Inversión (mdp)</b>	<b>29,749.20</b>	<b>26,346</b>	<b>3,403.20</b>

### Maquinaria: 76

- Excavadoras
- Tractores
- Motoniveladoras
- Plantas concreto
- Plantas asfalto

### Fuerza de Trabajo: 600 personas



**2025**  
Año de  
**La Mujer Indígena**

Problemática que impida concluir la obra	Propuesta solución que requiera apoyo del Secretario o SSI
Demandas de comunidades para apoyo de obra social	No se cuenta con recursos para realizar estas obras.
Desde el día viernes 21 de marzo se quitó el bloqueo en los accesos de la comunidad de Narro, en donde se encuentra el campamento de la empresa CARSO.	Es un problema interno del municipio de Juquila Mixes con la agencia de Narro.
La contratista de la concesionaria CARSO, ha bajado el ritmo de trabajo argumentando la falta de pago de la obra ejecutada.	Se requiere de asignación de recursos para la conclusión de la obra por la cantidad de 2,270.78 mdp c/iva. A la fecha se tiene un adeudo del mes de noviembre al mes de marzo del año en curso de 1,500 mdp c/iva.

# Oaxaca: Mitla - Entronque Tehuantepec II



Gobierno de  
México

Comunicaciones  
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes



PIV km 87+900



PIV km 87+900

## Tramo 1

Elemento	Intervención	Ejecutado acumulado	Faltante	21/03/25 al 27/03/25		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
<b>PIV 87+900</b>						
Pilotes	22	13	9	0	0	
Caballete	2	0	2	0	0	
Fabricación de tráves presforzadas	3	0	3	0	0	
Montaje de tráves presforzadas	3	0	3	0	0	
Colocación de tráves presforzadas	3	0	3	0	0	
Parapeto	2	0	2	0	0	
Guarniciones	2	0	2	0	0	
Defensa metálica	1	0	1	0	0	
Muro de pilas	1	0	1	0	0	

- Piloteadora realizando trabajos
- 2 tráves en proceso de armado
- Se está trabajando en el PIV que es prioritario para evitar un conflicto social con la comunidad.

# Oaxaca: Mitla - Entronque Tehuantepec II



Gobierno de  
México

Comunicaciones  
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes



Tramo 2

Elemento	Intervención	Ejecutado acumulado	Faltante	21/03/25 al 27/03/25		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
<b>PIP km 91+530</b>						
Fabricación de trabes presforzadas	1	0	1	0	0	1 trabe en proceso de construcción
Montaje de trabes presforzadas	1	0	1	0	0	
Colocación de trabes presforzadas	1	0	1	0	0	
Losa	1	0	1	0	0	
Parapeto	2	0	2	0	0	
Guarniciones	2	0	2	0	0	



Elemento	Intervención	Ejecutado acumulado	Faltante	21/03/25 al 27/03/25		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
<b>PIPR km 92+436</b>						
Parapeto	16	0	16	0	0	• En revisión disponibilidad de recursos para conclusión.
Guarniciones	16	0	16	0	0	

# Oaxaca: Mitla - Entronque Tehuantepec II



Gobierno de  
México

Comunicaciones  
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes



PIV km 92+438

## Tramo 2

Elemento	Intervención	Ejecutado acumulado	Faltante	21/03/25 al 27/03/25		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
<b>PIV km 92+438</b>						
Montaje de trabes presforzadas	16	16	0	1	1	• En proceso de cimbrado para colado de losa • En revisión disponibilidad de recursos para conclusión.
Losa	5	3	2	0	0	
Parapeto	10	0	10	0	0	
Guarniciones	10	0	10	0	0	



PIP km 92+680

Elemento	Intervención	Ejecutado acumulado	Faltante	21/03/25 al 27/03/25		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
<b>PIP km 92+680</b>						
Pilotes	8	0	8	0	0	• En revisión disponibilidad de recursos para conclusión.
Cargaderos	2	0	2	0	0	
Cabezales	2	0	2	0	0	
Fabricación de trabes metálicas	6	0	6	0	0	
Montaje de trabes metálicas	6	0	6	0	0	
Losa	3	0	3	0	0	
Parapeto	6	0	6	0	0	
Guarniciones	6	0	6	0	0	

# Oaxaca: Mitla - Entronque Tehuantepec II



Gobierno de  
México

Comunicaciones  
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes




Entronque Llano Crucero km 92+690

## Tramo 2

Elemento	Intervención	Ejecutado acumulado	Faltante	21/03/25 al 27/03/25		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
<b>Entronque Llano Crucero km 92+690</b>						
Cortes	3,593 m <sup>3</sup>	0	3,593	0	0	
Terraplenes	330 m <sup>3</sup>	41	330	0	0	
Concreto O.D.	287 m <sup>3</sup>	0	287	0	0	
Acero de refuerzo	8,135 kg	0	8,135	0	0	
Base hidráulica	616 m <sup>3</sup>	236.33	379.67	0	0	
Base asfáltica	750 m <sup>3</sup>	596.75	153.25	0	0	
Carpeta asfáltica	600.60 m <sup>3</sup>	469.60	131	0	0	
Sello premezclado	66 m <sup>3</sup>	46	20	0	0	
Pintura	7,583 m	6,041	1,542	0	0	
Señales	14 pza	0	14	0	0	
Defensa metálica	186.62 m	86.62	100	0	0	

- En revisión disponibilidad de recursos para conclusión.

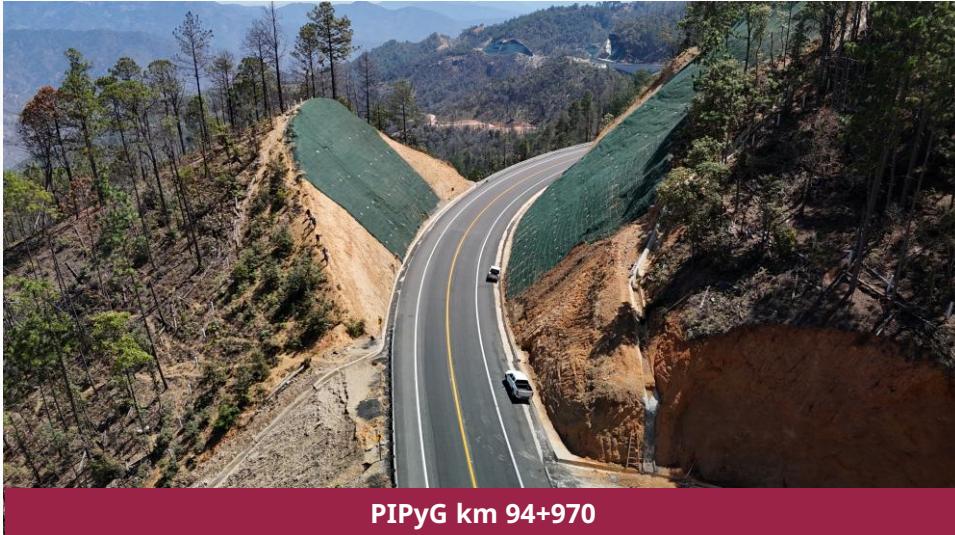

PIPyG km 94+970

Elemento	Intervención	Ejecutado acumulado	Faltante	21/03/25 al 27/03/25		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
<b>PIPyG km 94+970</b>						
Pilotes	4	0	4	0	0	
Cabezales	2	0	2	0	0	
Fabricación de trabes metálicas	2	0	2	0	0	
Montaje de trabes metálicas	2	0	2	0	0	
Losa	1	0	1	0	0	
Parapeto	2	0	2	0	0	
Guarniciones	2	0	2	0	0	

- Se cuenta con proyecto pero es necesario su reubicación por las condiciones topográficas del lugar, o su cancelación.
- En proceso de revisión.

# Oaxaca: Mitla - Entronque Tehuantepec II



Gobierno de  
México


Comunicaciones  
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes



Entronque Liano Laguna km 98+200

## Tramo 2

Elemento	Intervención	Ejecutado acumulado	Faltante	21/03/25 al 27/03/25		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
<b>Entronque Liano Laguna km 98+200</b>						
Concreto O.D.	20.29 m3	0	0	0	0	En revisión disponibilidad de recursos para conclusión.
Acero de refuerzo	335 kg	0	0	0	0	
Base hidráulica	569 m3	569	0	0	0	
Base asfáltica	1,166 m3	1,116	0	112	112	
Carpeta asfáltica	1,051 m3	1,051	0	354	354	
Sello premezclado	106 m3	0	106	0	0	
Pintura	11,070 m	0	11,070	0	0	
Señales	1,228 pza	0	1,228	0	0	
Defensa metálica	1,231 m	0	1,231	0	0	

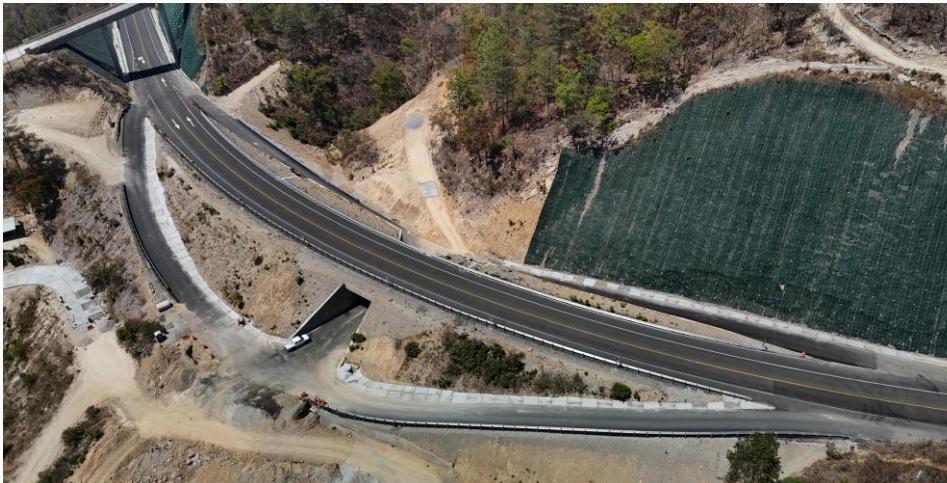

Entronque Cerro Pascole km 100+500


Elemento	Intervención	Ejecutado acumulado	Faltante	21/03/25 al 27/03/25		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
<b>Entronque Cerro Pascole km 100+500</b>						
Concreto O.D.	75.39 m3	0	75.39	0	0	
Acero de refuerzo	550 kg	0	550	0	0	
Sello premezclado	49 m3	46	20	0	0	
Pintura	5,519 m	6,041	1,542	0	0	
Señales	45 pza	0	14	0	0	
Defensa metálica	744 m	86.62	100	0	0	• Sin actividad, se encuentra en proceso de revisión solicitud realizada por la comunidad

# Oaxaca: Mitla - Entronque Tehuantepec II



Gobierno de  
México

Comunicaciones  
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

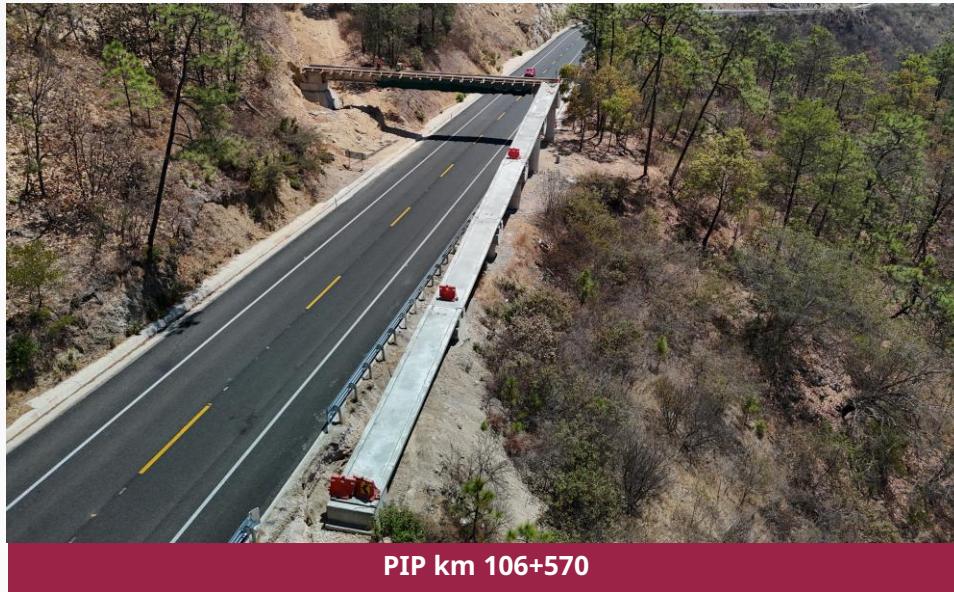

## Tramo 2

Elemento	Intervención	Ejecutado acumulado	Faltante	21/03/25 al 27/03/25		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
<b>PIP km 106+570</b>						
Montaje de trabes presforzadas	6	6	0	1	1	• En proceso de construcción de losa. • En revisión disponibilidad de recursos para conclusión.
Losa	1	0	1	0	0	
Parapeto	12	0	12	0	0	
Guarniciones	12	0	12	0	0	



Elemento	Intervención	Ejecutado acumulado	Faltante	21/03/25 al 27/03/25		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
<b>PIP km 108+570</b>						
Cargadero	2	2	0	1	1	• Se está trabajando en el cargadero lado izquierdo.
Fabricación de trabes presforzadas	1	1	0	1	1	• En revisión disponibilidad de recursos para conclusión.
Montaje de trabes presforzadas	1	0	1	0	0	
Losa	1	0	1	0	0	
Parapeto	2	0	2	0	0	
Guarniciones	2	0	2	0	0	

# Oaxaca: Mitla - Entronque Tehuantepec II




Gobierno de  
México

Comunicaciones  
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes



Tramo 2

Elemento	Intervención	Ejecutado acumulado	Faltante	21/03/25 al 27/03/25		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
<b>PIV km 109+247</b>						
Fabricación de trabe metálicas	5	4	1	0	0	• Se está fabricando una sexta trabe, debido a que una de las trabes tuvo problema de control de calidad. • En revisión disponibilidad de recursos para conclusión.
Montaje de trabes metálicas	5	0	5	0	0	
Losa	1	0	1	0	0	
Parapeto	2	0	2	0	0	
Guarniciones	2	0	2	0	0	

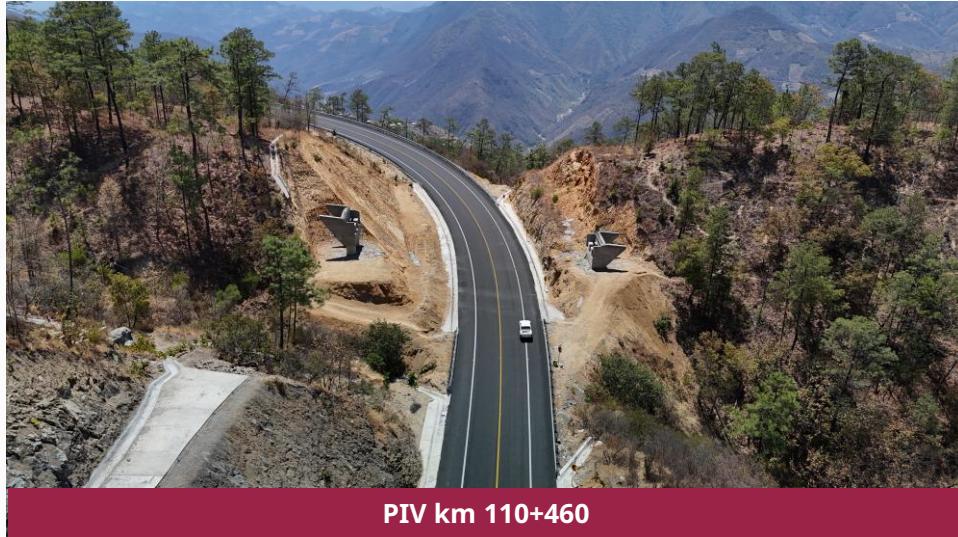

Elemento	Intervención	Ejecutado acumulado	Faltante	21/03/25 al 27/03/25		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
<b>PIV km 110+460</b>						
Fabricación de trabes presforzadas	3	2	1	0	0	• Están en proceso de fabricación 2 trabes. • En revisión disponibilidad de recursos para conclusión.
Montaje de trabes presforzadas	3	0	3	0	0	
Losa	1	0	1	0	0	
Parapeto	2	0	2	0	0	
Guarniciones	2	0	2	0	0	

# Oaxaca: Mitla - Entronque Tehuantepec II



Gobierno de  
México

Comunicaciones  
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

## Tramo 2



Entronque Danigaree km 111+600



PIP km 112+270

Elemento	Intervención	Ejecutado acumulado	Faltante	21/03/25 al 27/03/25		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
<b>Entronque Danigaree km 111+600</b>						
Señales	560 pza	0	560	0	0	• Se está trabajando en obras complementarias.
Defensa metálica	1,015 m	871.37	144	871.37	871.37	• En revisión disponibilidad de recursos para conclusión.

Elemento	Intervención	Ejecutado acumulado	Faltante	21/03/25 al 27/03/25		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
<b>PIP km 112+270</b>						
Losa	1	0	1	0	0	• En proceso de cimbrado para armado de losa.
Parapeto	2	0	2	0	0	• En revisión disponibilidad de recursos para conclusión.
Guarniciones	2	0	2	0	0	

# Oaxaca: Mitla - Entronque Tehuantepec II



Gobierno de  
México

Comunicaciones  
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

## Tramo 2



Elemento	Intervención	Ejecutado acumulado	Faltante	21/03/25 al 27/03/25		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
<b>PIV km 114+766</b>						
Montaje de trabes presforzadas	3	2	1	2	2	• Se realizan trabajos de izaje y montaje de trabes • En revisión disponibilidad de recursos para conclusión.
Losa	1	0	1	0	0	
Parapeto	2	0	2	0	0	
Guarniciones	2	0	2	0	0	
Defensa metálica	2	0	2	0	0	



Elemento	Intervención	Ejecutado acumulado	Faltante	21/03/25 al 27/03/25		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
<b>Entronque Agua Blanca km 122+600</b>						
Excavación en corte	305 m <sup>3</sup>	121.86	183.14	0	0	• Se colocaron 5 trabes del PIV del entronque.
Base hidráulica	1,287 m <sup>3</sup>	1,220.61	66.39	0	0	
Carpeta asfáltica	634 m <sup>3</sup>	587.73	46.27	0	0	
Sello premezclado	79 m <sup>3</sup>	68.49	10.51	0	0	
Pintura	5,179 m	0	5,179	0	0	
Señales	449 pza	0	449	0	0	
Defensa metálica	1,030 m	0	1,030	0	0	

# Oaxaca: Mitla - Entronque Tehuantepec II



Gobierno de  
México

Comunicaciones  
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

## Tramo 2



Entronque Quiavicuzas km 137+900

Elemento	Intervención	Ejecutado acumulado	Faltante	21/03/25 al 27/03/25		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
<b>Entronque Quiavicuzas km 137+900</b>						
Terraplenes	900 m3	900	0	241	241	
Base hidráulica	2,399.8 m3	1,800	599.8	0	0	
Carpeta asfáltica	573.3 m3	366.74	206.56	0	0	
Sello premezclado	75 m3	0	75	0	0	
Pintura	6,040 m	0	6,040	0	0	
Señales	456 pza	0	456	0	0	
efensa metálica	638 m	0	638	0	0	
Concreto O.D.	29.98 m3	4.2	25.78	0	0	
Acero de refuerzo	1,166 kg	583	583	429	429	
Tubería O.D.	40 m	22.5	17.5	16.25	16.25	

- Colocación de malla electrosoldada para colocación y suministro de concreto lanzado en gasa 13

# Oaxaca: Mitla - Entronque Tehuantepec II



Gobierno de  
México

Comunicaciones  
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes



## Tramo 3


Elemento	Intervención	Ejecutado acumulado	Faltante	21/03/25 al 27/03/25		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
<b>PIPG km 146+840</b>						
Parapeto	2	0	2	0	0	• En proceso de construcción parapetos y guarniciones. • PIPG contemplado en obras sociales.
Guarniciones	2	0	2	0	0	
Defensa metálica	4	0	4	0	0	



Elemento	Intervención	Ejecutado acumulado	Faltante	21/03/25 al 27/03/25		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
<b>PIPG km 159+400</b>						
Parapeto	2	0	2	0	0	• En proceso de construcción. • PIPG contemplado en obras sociales.
Guarniciones	2	0	2	0	0	



## Avance Programado - Físico - Financiero (%)

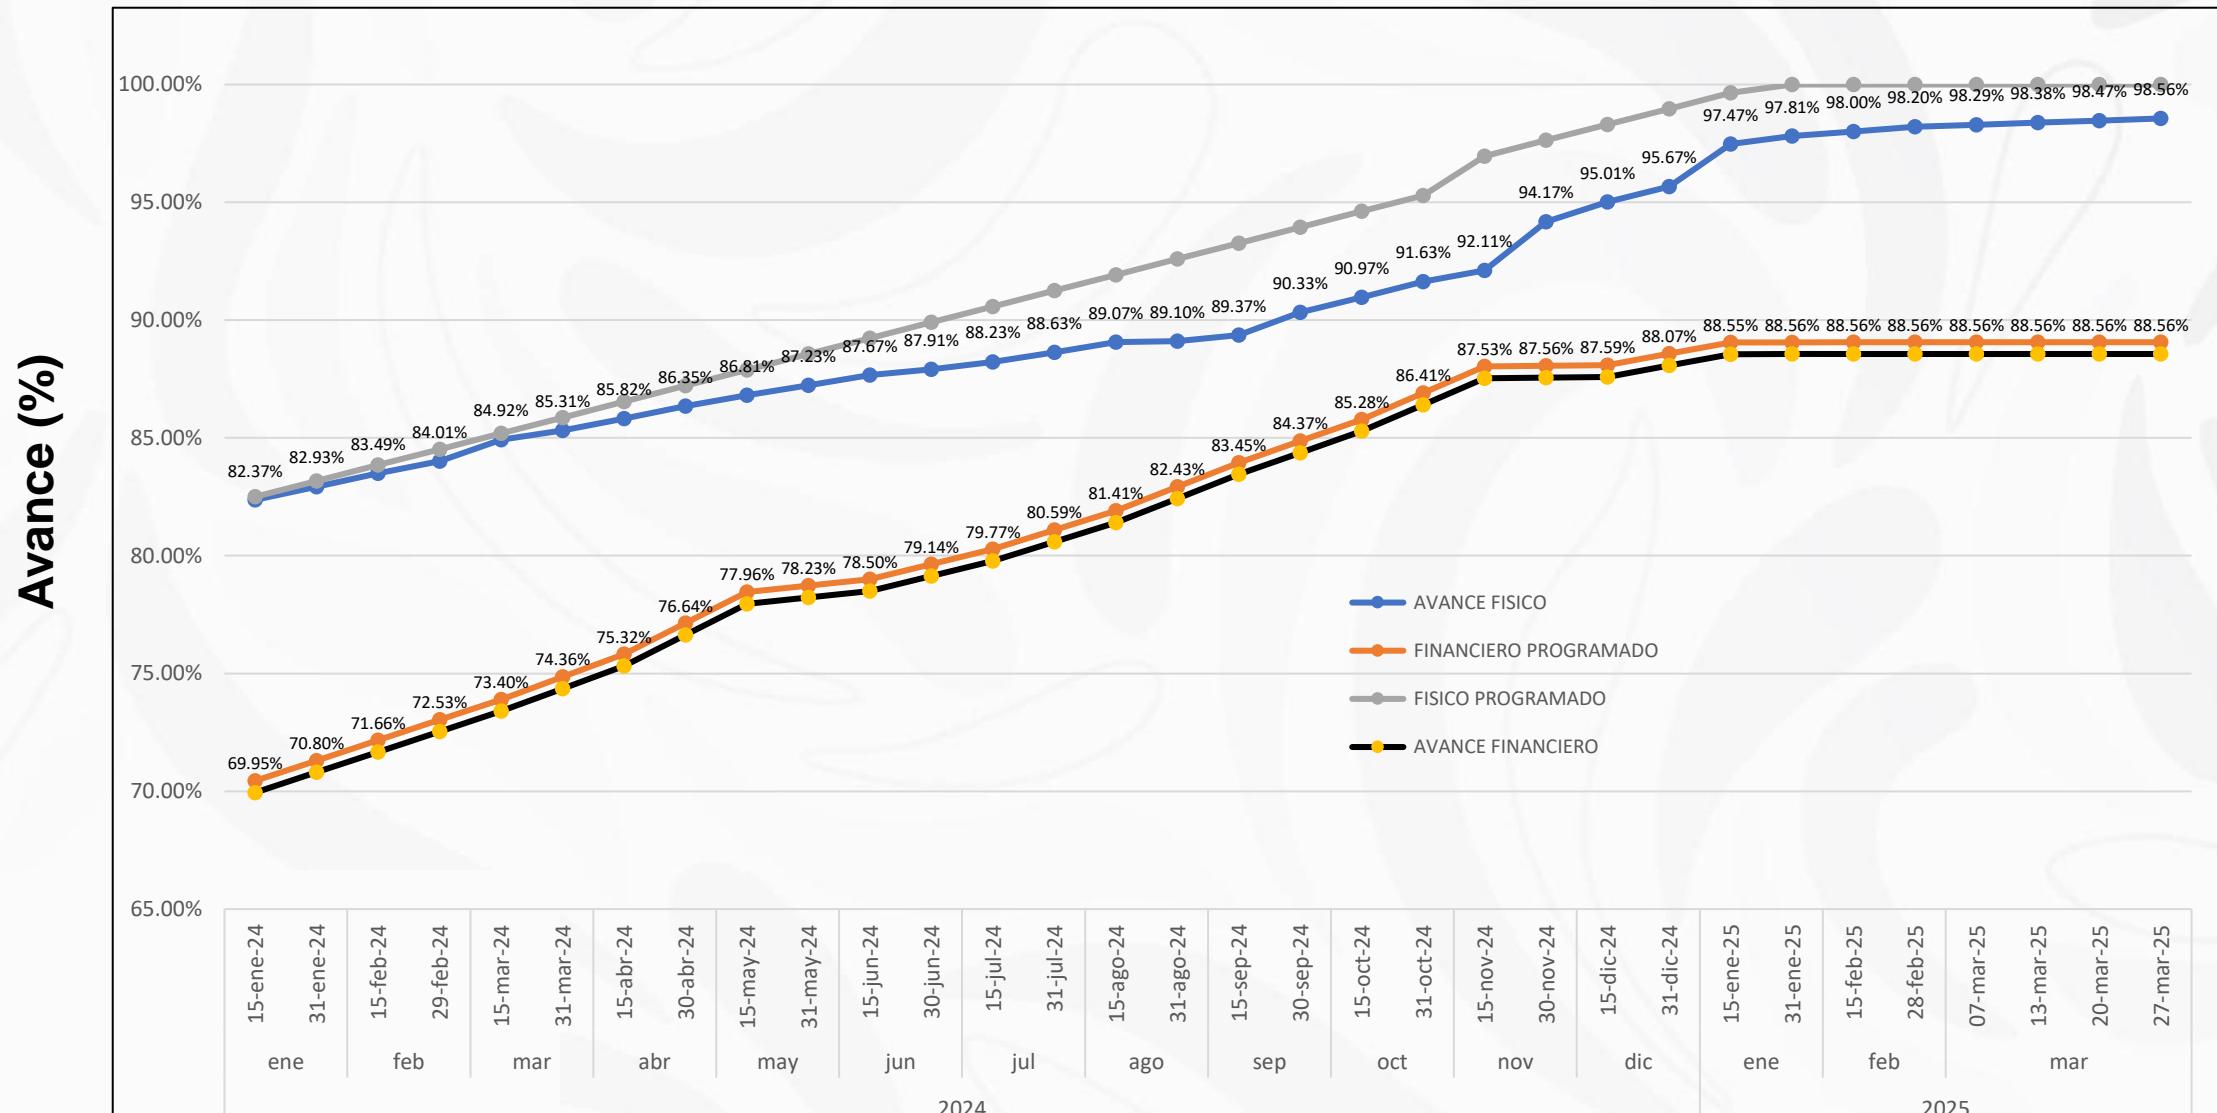

# Oaxaca

## Mitla - Entronque Tehuantepec II



Gobierno de  
México

Comunicaciones  
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

