Jalisco


Ampliación Libramiento Lagos de Moreno





monto Meta de la obra con el tramo

2 a \$2,345 MDP

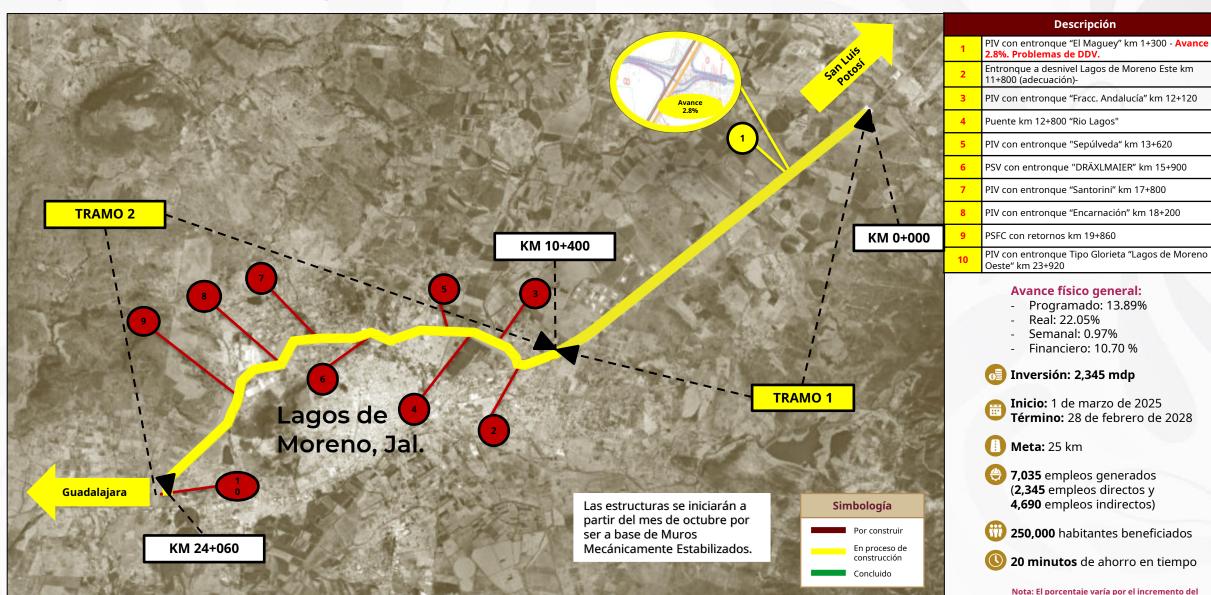

Jalisco

Ampliación Libramiento Lagos de Moreno

TERRACERIAS TRONCAL TRAMO 1						
Concepto	Meta	Ejecutado	Faltante	19/09/25 al 25/09/25		<u>.</u>
				Programado	Ejecutado	Observaciones
Subrasante (m³)	24,644	24,644	0	2,464	1,128.10	Terminado
Base hidráulica (m³)	23,690	23,181.90	508.10	0	734.14	Se inició antes de lo programado (Octubre)


PAVIMENTOS TRONCAL TRAMO 1						
Concepto	Meta	Ejecutado	Faltante	19/09/25 al 25/09/25		Ohaamaa iamaa
				Programado	Ejecutado	Observaciones
Base asfáltica	14,312	13,350	962	0	1,148.52	Se inició antes de lo programado (octubre)

OBRAS DE DRENAJE LONGITUDUNAL TRAMO 1						
Concepto	Meta	Ejecutado	Faltante	19/09/25 al 25/09/25		Ohaamaa ismaa
				Programado	Ejecutado	Observaciones
Cercad D.D.V.	10,440.31	7,154	3,286.31	0	1,250	Se inició antes de lo programado (programado en febrero 2026)





Avance: Programado, Físico y Financiero (%)

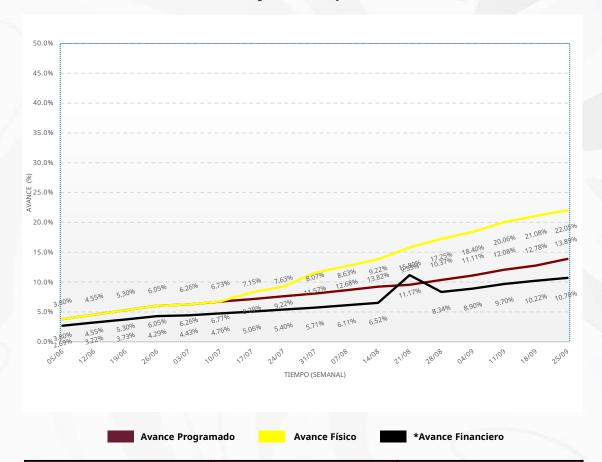

	12 al 18 de septiembre 2025	19 al 25 de septiembre 2025		
Fuerza de Trabajo (personas)	184	178		
Maquinaria	56	51		
