




Avance: Programado, Físico y Financiero (%)

TERRACERIAS Y PAVIMENTOS TRONCAL TRAMO 2							
Concepto	Unidad	Total	Ejecutado	Faltante	21/11/25 al 27/11/25		Observaciones
					Programado	Ejecutado	
Subyacente	m ³	49,010	26,200	22,810	717.50	1,500	En proceso
Subrasante	m ³	46,635	18,819	27,816	682	2,319	En proceso
Pedraplén	m ³	26,600	9,216	17,384	390	1,280	En proceso
Base asfáltica	m ³	35,228	4,932	30,296	644	2,050	En proceso

TRAMO 2 PSV AVANCE DE ESTRUCTURAS Y ENTRONQUES							
Concepto	Unidad	Total	Ejecutado	Faltante	21/11/25 al 27/11/25		Observaciones
					Programado	Ejecutado	
Puente km 12+450	%	100%	29.01%	70.99%	0.00	3.59%	En proceso
PIV KM 13+620	%	100%	4.60%	95.40%	0.00	1.23%	En proceso
PIV km 23+920	%	100%	7.81%	92.19%	0.00	0.01%	En proceso

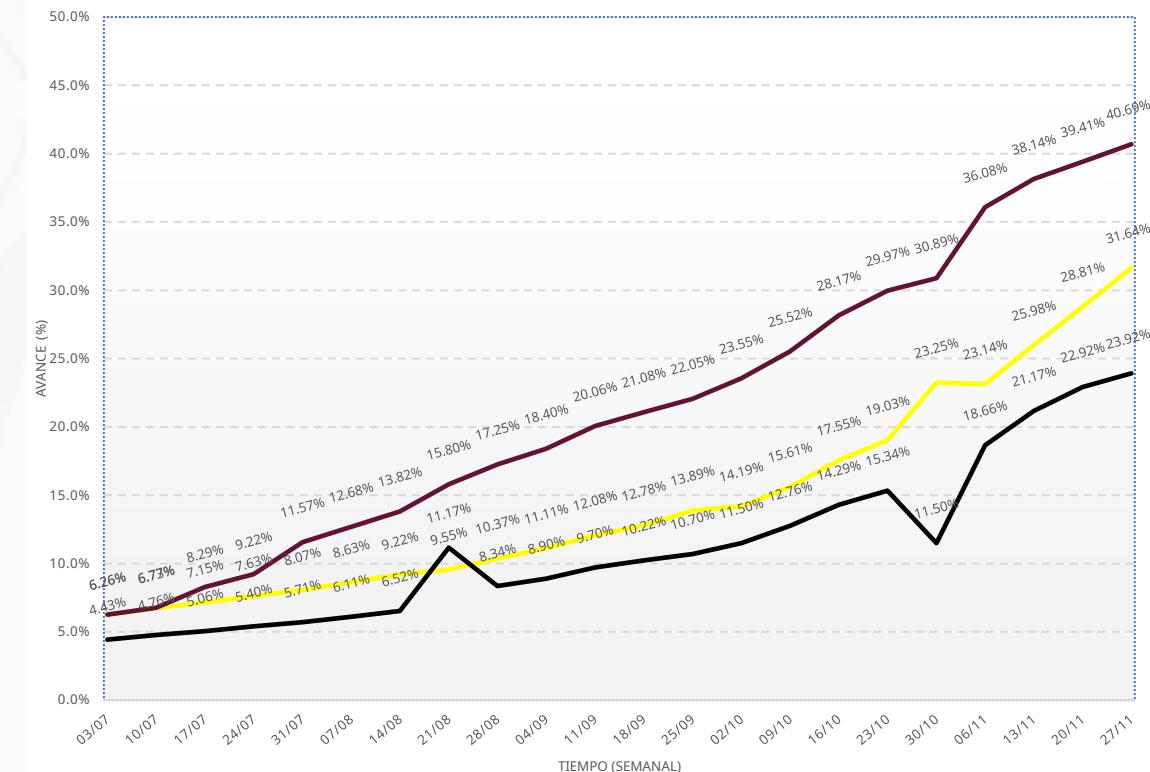

Avance Programado

Avance Físico

*Avance Financiero

	14 al 20 de noviembre 2025	21 al 27 de noviembre 2025
Fuerza de Trabajo (personas)	205	205
Maquinaria	61	61
