
Nayarit

Las Varas-Puerto Vallarta (tramo III). Obras complementarias





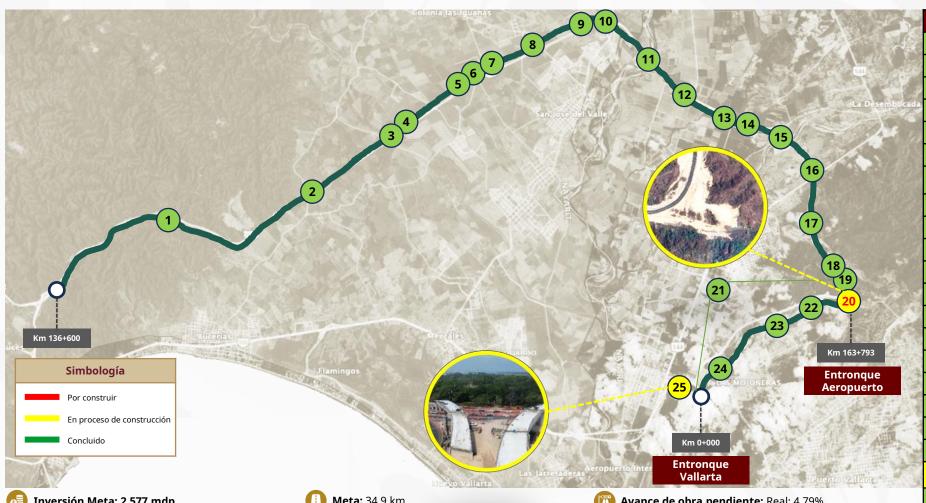

Inversión Meta: 2,577 mdp

Inicio: septiembre de 2022 **Término:** septiembre de 2025, inaugurada y puesta en operación diciembre de 2024 (pendiente complementaria)

Concesionaria: IDEAL

Meta: 34.9 km 8 puentes, 13 estructuras de cruce, 2 entronques, 1plaza de cobro y 1 ramal

Avance físico: Programado: 100% Real: 95.21% Semanal: 0.25% Financiero: 89.72%

Avance de obra pendiente: Real: 4.79%

7,731 empleos generados **2,577** directos y **5,154** indirectos

Más de 50,000 habitantes beneficiados

30 minutos de ahorro en tiempo

		Descripción
90000	1	Puente rio Las Animas km 240+401
	2	PIV 2V a zona agrícola km 144+237
8	З	PSV 1 V Sin Nombre km 146+700
a	4	Puente canal de riego km 146+800
	5	PIV El Naranjo km 148+260
	6	Plaza de cobro La Misión 148+700
	7	Puente canal con camino de servicio km 149+597
	8	PSV a valle de Candras km 151+496.22
	9	PSV km153+225
	10	PSV a San José del Valle km 153+538.25
	11	Puente Rio Ameca km 154+903.25
	12	Puente Canal km 156+754.01
8	13	PIV a San José del Valle km 157+663
	14	Puente canal de riego km 158+876
S	15	Puente Mascota km 159+302
	16	PSV Pto. Vallarta- Las Palmas km 160+427
	17	Puente Santo Domingo km 162+181
N. N.	18	PSV km 163+005
	19	PSV km 163+452
27000	20	Entronque Aeropuerto km 163+793, (15.0%) Sin asignación de recursos por la concesionaria.
	21	Ramal Aeropuerto
	22	PSV km 4+690
	23	PSV km 3+018.9
	24	PSV A.V. México km 1+000.13
	25	Entronque Vallarta – Aeropuerto km 0+000, (91%)
