

# Estado de México

## Atizapán-Atlacomulco



Gobierno de  
México

Comunicaciones  
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes



Descripción	
<b>1</b>	Entronque Chiluca 15.00%, sin actividad, falta de recursos
<b>2</b>	Viaducto Sin Nombre km 20+880.00 53.30%
<b>3</b>	Viaducto La Estadía km 22+332.00 53.42%
<b>4</b>	Viaducto Los Gallos km 27+425.00 41.01%
<b>5</b>	Túnel Los Gallos km 27+770.00 95.00%, solo faltan instalaciones electromecánicas
<b>6</b>	Viaducto Sin Nombre km 31+033.00 48.20%, solo se están colando las prelosas
<b>7</b>	Viaducto Tlazala km 31+359.00 34.77%
<b>8</b>	Túnel Cahuacán I km 36+258.00 95.00%, solo faltan instalaciones electromecánicas
<b>9</b>	Viaducto Cahuacán III km 38+995.00 25.68%.
<b>10</b>	Viaducto Sin Nombre km 42+053.00 0.69%.
<b>11</b>	Viaducto El Llano km 51+016.00 0.90%, sin actividad, problemas sociales
<b>12</b>	Viaducto Sin Nombre km 54+770.00 03.80%, sin actividad, problemas sociales
<b>13</b>	Viaducto Los Chaparrales km 73+387.00 00.00% (no se han iniciado trabajos)
<b>14</b>	Viaducto El Pescado km 75+482.00 00.00% (no se han iniciado trabajos)
<b>15</b>	Viaducto El Salto km 91+874.00 16.80%, sin actividad, problemas sociales
<b>16</b>	Entronque Atlacomulco

Simbología	
<span style="color: red;">■</span>	Por construir
<span style="color: yellow;">■</span>	En proceso de modernización
<span style="color: green;">■</span>	Modernizado



**2025**  
Año de  
La Mujer  
Indígena



**Inversión:** 9,865.8 mdp a precios de 2014 incluye I.V.A., incluye monto de obra (7,662 mdp) y Fondo de Obra Adicional (843 mdp)



**Meta:** 74 km, 2 Plazas de cobro, 12 Viaductos, 2 Túneles, 4 Entronques, 79 PSV y G



**Inicio:** 01 marzo 2016  
**Término:** 30 junio 2027



**Avance físico:**

- Programado: 85.92%
- Real: 45.19%
- Financiero: 24.11%
- Semanal: 0.020%



**29,598 empleos generados**  
(9,866 empleos directos y 19,732 empleos indirectos)



**1 millón 244 mil habitantes beneficiados**



**60 minutos** de ahorro en tiempo

# Estado de México

## Atizapán-Atlacomulco




Gobierno de  
México

Comunicaciones  
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

Elemento	Meta	Ejecutado acumulable	Faltante	07/11/25 al 13/11/2025		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
Pilotes	344	188	156	2	0.75	
Zapatas	86	42	44	1	0.55	
Columnas	96	20	76	1	0.70	
Cabezales	76	9	67	1	0.43	
Caballetes	24	5	19	1	1.00	
Trabes metálicas	29	0	29	1.0	1.00	

- La mano de obra se incrementó para alcanzar las expectativas correspondientes.

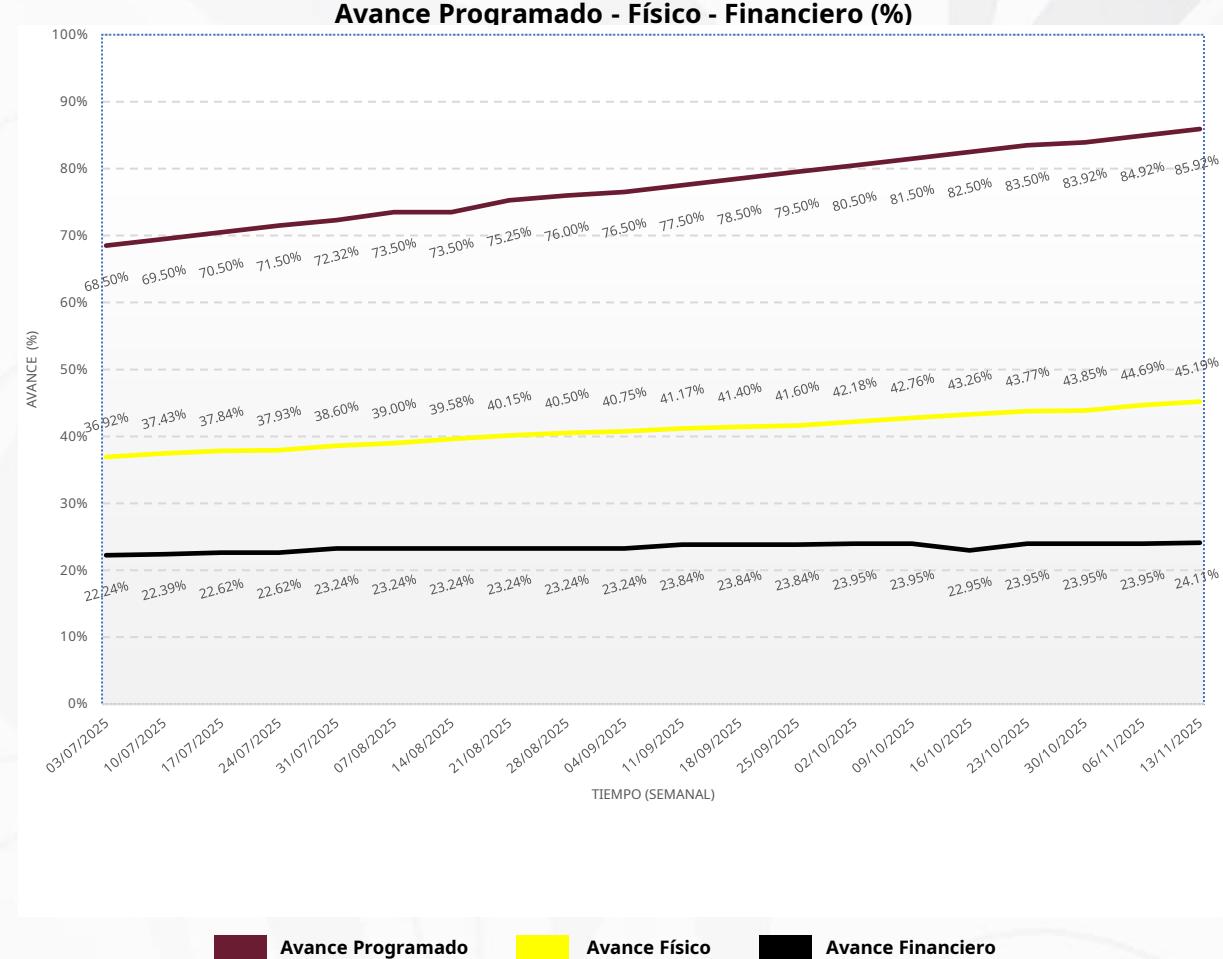

**2025**  
Año de  
**La Mujer Indígena**

	Del 30 de octubre al 06 de noviembre	07 de noviembre al 13 noviembre
Fuerza de Trabajo (personas)	1,875	1,894
Maquinaria	489	493
