


# Michoacán

## Modernización Carretera Zitácuaro-Maravatío

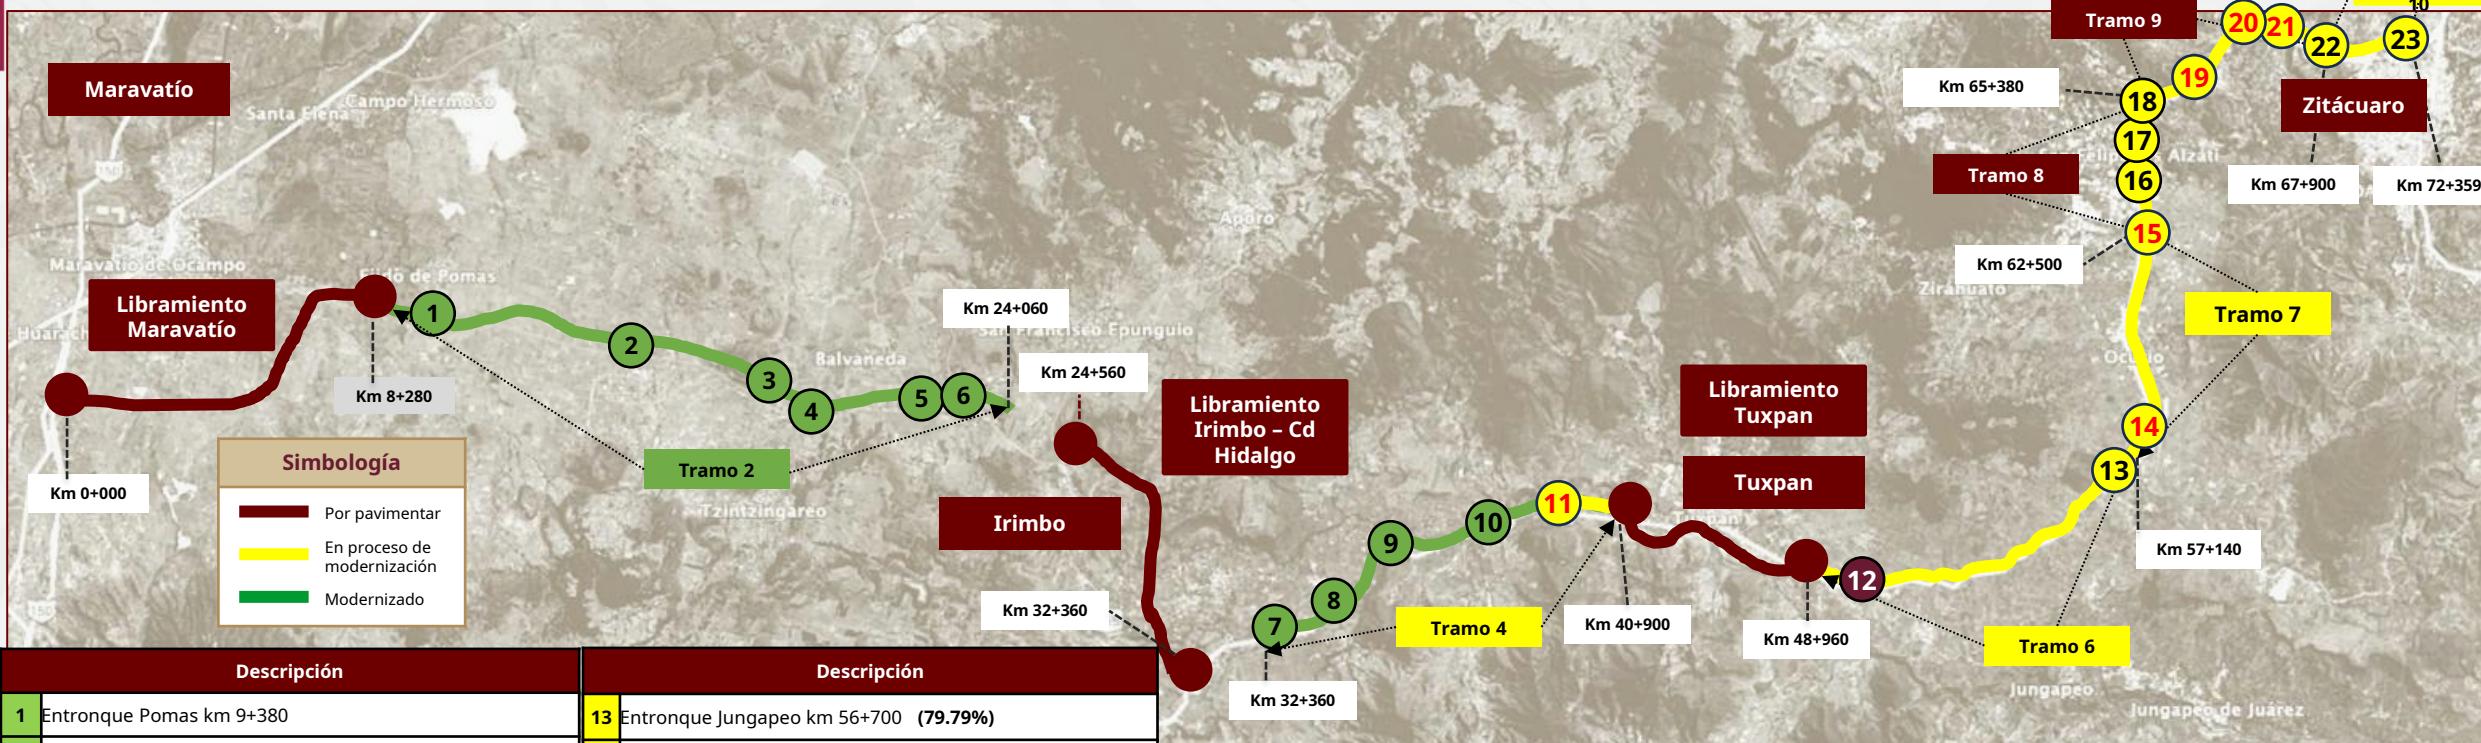

### Avance físico

- Programado: 55.66% (Reprogramación T8)
- Real: 59.48%
- Semanal: 0.54%
- Financiero: 8.11%

**Nota:**  
Las Estructuras en proceso remarcadas en color rojo, no presentan avance en el periodo semanal, o no han iniciado.

**Inversión:** 4,575.3 mdp

**Meta:** 71.3 Km

**Inicio:** septiembre 2020

**Reinicio:** 27 de enero de 2024

**Término:** 31 de diciembre de 2026

**Empleos generados:** 4,800 empleos generados

**Habitantes beneficiados:** 126,000 habitantes beneficiados

**Ahorro en tiempo:** 25 min

**Concesionaria:** Red de carreteras de occidente

# Michoacán

## Modernización Carretera Zitácuaro-Maravatío




Concepto	Total	Ejecutado	Faltante	TERRACERIAS		Observaciones
				Del 16 ene al 22 ene 26 Programado	Del 16 ene al 22 ene 26 Ejecutado	
Cortes (m3)	705,558.00	738,958.08	-33,400.08	2,847.33	2,996.04	CONTINÚAN TRABAJOS DE CONFORMACIÓN DE TERRACERÍAS EN MODIFICACIÓN DE TRAZO T9
Terraplén (m3)	445,687.00	382,943.70	62,743.30	698.67	9,180.32	
Subyacente (m3)	256,097.00	252,761.89	3,335.11	1,909.00	1,862.90	CONTINÚAN TRABAJOS DE CONFORMACIÓN DE TERRACERÍAS EN MODIFICACIÓN DE TRAZO T9
Subrasante (m3)	170,688.00	164,766.60	5,921.40	1,505.33	887.82	CONTINÚAN TRABAJOS DE CONFORMACIÓN DE TERRACERÍAS EN MODIFICACIÓN DE TRAZO T9

Concepto	Total	Ejecutado	Faltante	PAVIMENTOS		Observaciones
				Del 16 ene al 22 ene 26 Programado	Del 16 ene al 22 ene 26 Ejecutado	
Base Hidráulica (m3)	125,659.04	115,259.13	10,399.91	1,640.62	542.35	SE ESTÁN TRABAJANDO TRAMOS AISLADOS EN TRAMOS 4, 6 Y 7.
Bacheo (m3)	1,800.00	1,674.25	125.75	22.22	16.50	SE ESTÁN TRABAJANDO TRAMOS AISLADOS EN TRAMOS 4, 6 Y 7.
Fresado (m3)	10,676.00	10,638.71	37.29	4.00	17.68	
Rayado Carpeta (Ha)	30.24	28.40	1.84	1.59	0.11	SE ESTÁN TRABAJANDO TRAMOS AISLADOS EN TRAMOS 4, 6 Y 7.
Geomalla (m2)	84,520.00	79,086.20	5,433.80	311.11	417.60	
Base Asfáltica (m3)	120,414.05	116,246.28	4,167.77	656.89	813.85	
Carpeta Asfáltica (m3)	45,247.80	27,280.94	17,966.86	394.40	907.20	

Concepto	Total	Ejecutado	Faltante	ESTRUCTURAS		Observaciones
				Del 16 ene al 22 ene 26 Programado	Del 16 ene al 22 ene 26 Ejecutado	
PIV JUNGAPEO	1.00	1.0061	0.0000	0.0000	0.0007	CONTINÚA EL CORTE DE TN EN GASAS Y CONFORMACIÓN DE SUBRASANTE
PSV SAN FELIPE	1.00	0.3671	0.6329	0.0006	0.0181	TENDIDO DE BASE ASFÁLTICA
PSV SAN JUAN VIEJO	1.00	0.8975	0.1025	0.0212	0.0096	COLOCACIÓN DE PARAPETO
PSV ZITÁCUARO	1.00	0.9049	0.0951	0.0104	0.0143	CONFORMACIÓN DE TERRAPLÉN DE SALIDA.
DEFENSA METÁLICA	35,327.00 ml	26,727.15 ml	8,599.85 ml	0.00 ml	210.25 ml	CONTINÚA LA COLOCACION EN TRAMO 4.
BALIZAMIENTO	157,137.60 ml	69,824.43 ml	87,313.17 ml	0.00 ml	3,584.62 ml	CONTINÚA LA COLOCACION EN TRAMO 4 y 6
CUNETA	12,028.95 ml	10,516.54 ml	1,512.41 ml	0.00 ml	34.40 ml	CONTINÚA LA CONSTRUCCIÓN EN TRAMO 4
BOTONES	12,041.00 pza	8,429.00 pza	3,612.00 pza	0.00 pza	473.00 pza	CONTINÚA LA COLOCACION EN TRAMO 4.

### Avance Programado - Físico - Financiero (%)

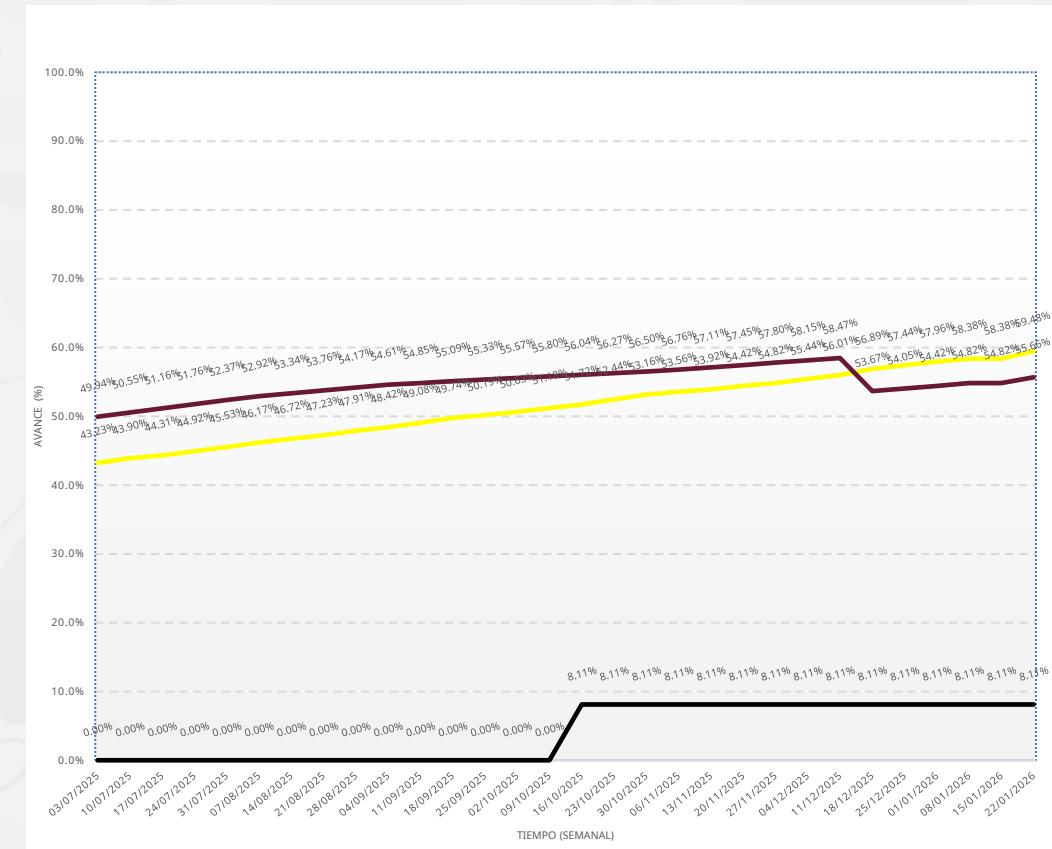

■ Avance Programado ■ Avance Físico ■ \*Avance Financiero

	Del 09 al 15 ene 26	Del 16 al 22 ene 26
Fuerza de Trabajo (personas)	289	290
tramos activos	IV, VI, VII, VIII, IX, X	IV, VI, VII, VIII, IX, X
Frentes de trabajo (totales)	31	33
