


Nayarit

Tramo Tepic-Compostela



Gobierno de
México

Comunicaciones
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

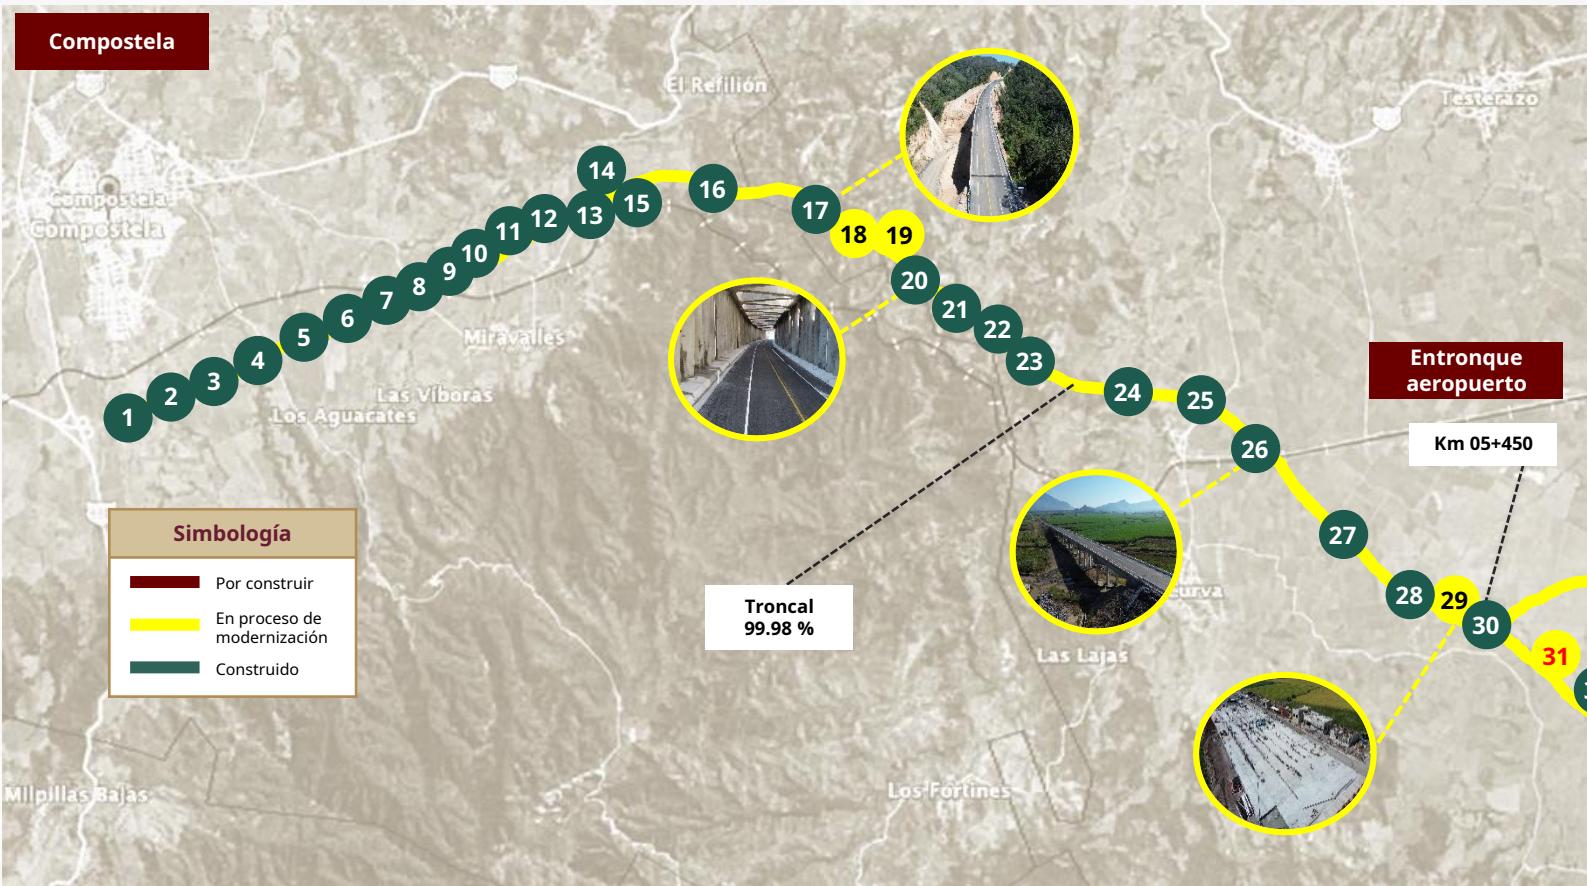

Descripción		Descripción	
1	Puente 26.01 km 26+140 100%	13	PIV 20.01 20+130 (OA 100%)
2	PSV 25.01 km 25+965.5 100%	14	Puente 19.01 km 19+874.8 100%
3	PSMA 25.01 km 25+060 100%	15	PSV 19.01 km 19+395.3 100%
4	PSMA 24.01 km 24+604 100%	16	Puente 17.01 km 17+410.1 (100 %)
5	PIV 23.01 km 23+949 100%	17	Puente km 16+393.5 L= 290 m (100 %)
6	PSMA 23.01 km 23+255.6 100%	18	PIV 15.01 15+370 (OA 86.42 %)
7	PSMA 22.01 km 22+426 100%	19	PIV 14.01 14+580 (OA 99.10 %)
8	PSV 21.01 km 21+906 100%	20	Túnel Falso 14.01 km 14+450 (100 %)
9	PSFC 21.01 km 21+601.5 100%	21	Puente km 13+975.3(100 %)
10	PSMA 21.01 km 21+142 100%	22	PIV 13.01 km 13+045.09 100%
11	Puente 21.01 km 21+061 100%	23	Puente km 12+691.3 (100 %)
12	Puente 20.01 km 20+409.2 100%	24	PIV 11.01 km 11+137.3 100%
		25	PIV 10.01 km 10+257.7 100%
		26	PSFC 9.01 km 09+158.6 100%
		27	PIV km 07+635 (100%)
		28	PIV 6.01 km 06+312 100%
		29	Plaza de Cobro km 05+900 (59.63%)
		30	Entronque Aeropuerto km 05+450 (100 %)
		31	PIV km 04+499.3 (94.02%) Se trabaja en Ramal Aeropuerto
		32	Puente km 03+771.6 100%
		33	Puente km 03+335 100%
		34	PIV 1.01 km 01+947 100%
		35	PSMA 0.01km 00+450 100%



2025
Año de
La Mujer
Indígena

Avance físico

- Programado: 100 %
- Real: 99.79%
- Financiero: 96.70 %
- Semanal: 0.42 %

Concesionaria: FONADIN



Inversión: 2,473.43 mdp



Meta: 28 km. 1 Túnel Falso, 1 Plaza de cobro, 10 Puentes, 2 PSFC, 1 Entronque (solo gazas) y 1 Entronque completo (Aeropuerto), 21 Cruces y Ramal Aeropuerto



Inicio: Marzo 2023
Término: 31-Oct-2025



2,473 empleos directos generados P/MDI
4,946 empleos indirectos generados P/MDI



490 mil habitantes beneficiados



35 minutos de ahorro en tiempo

Nayarit


Tramo Tepic-Compostela



Gobierno de
México

Comunicaciones
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

Elemento	Meta	Ejecutado acumulable	Faltante	31/10/25 al 06/11/2025		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
Terraplén (m ³)	2,095,966.26	2,063,499.62	32,466.64			
Subyacente (m ³)	290,689.00	273,686.49	17,002.51			
Puente 16.01 km 16+393.50						
Columnas	8	8	0			Trabajos concluidos.
Cortes (m ³) Estabilización de taludes	2,443,497.56	2,423,372.63	20,124.93			
Obras de drenaje	77	77	0			Trabajos concluidos.
P.S.F.C. 9.01 km 09+158.50						
Losa (claro)	7	7	0			Trabajos concluidos.
P.S.F.C. 21.01 km 21+601.50						
Junta de dilatación (pza)	2	2	0			

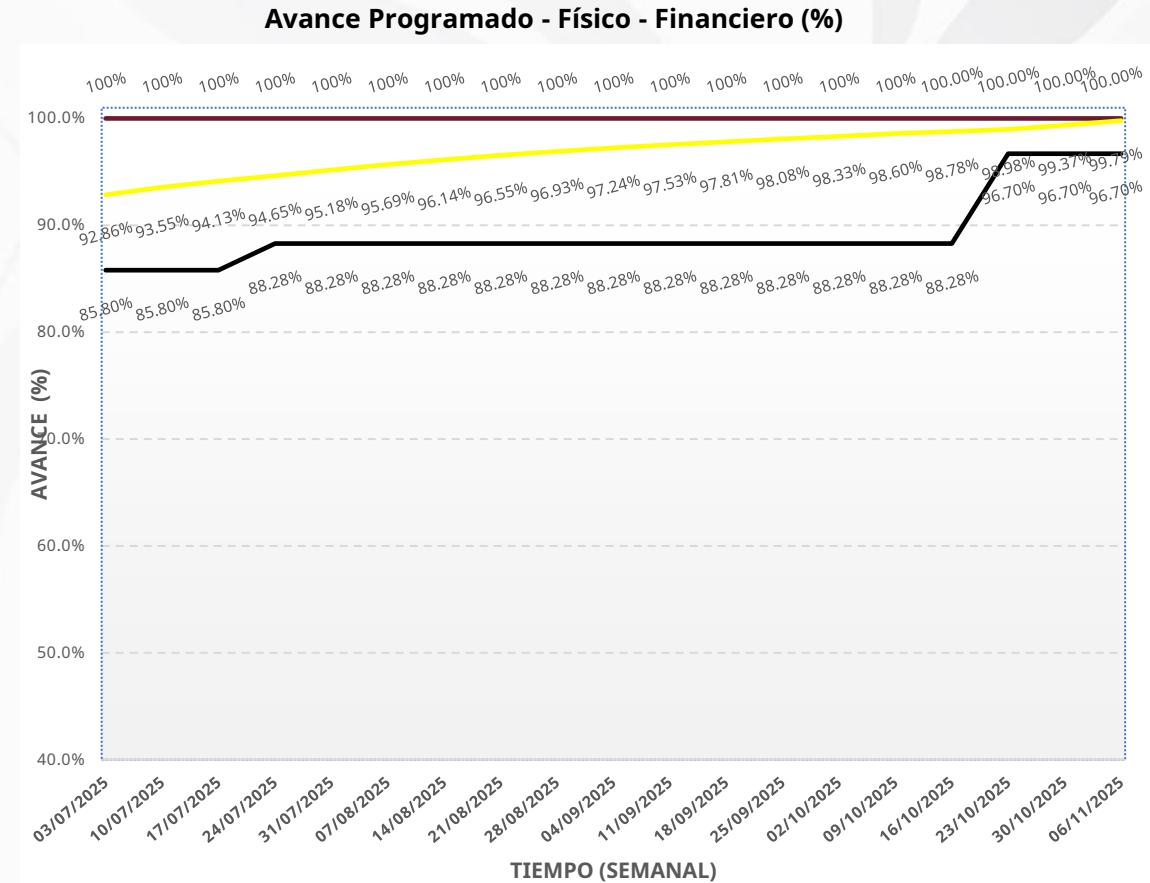

■ Avance Programado ■ Avance Físico ■ Avance Financiero

	24 de octubre al 30 de octubre	31 de octubre al 06 de noviembre
Fuerza de Trabajo (personas)	450	450
Maquinaria	71	71
