Colima

Tramo Armería-Manzanillo

Avance físico

• Programado: 90.43% • Semanal: 0.11 %

• Real: 32.12%


• Financiero: 20.79%

Concesionaria: PINFRA





Descripción

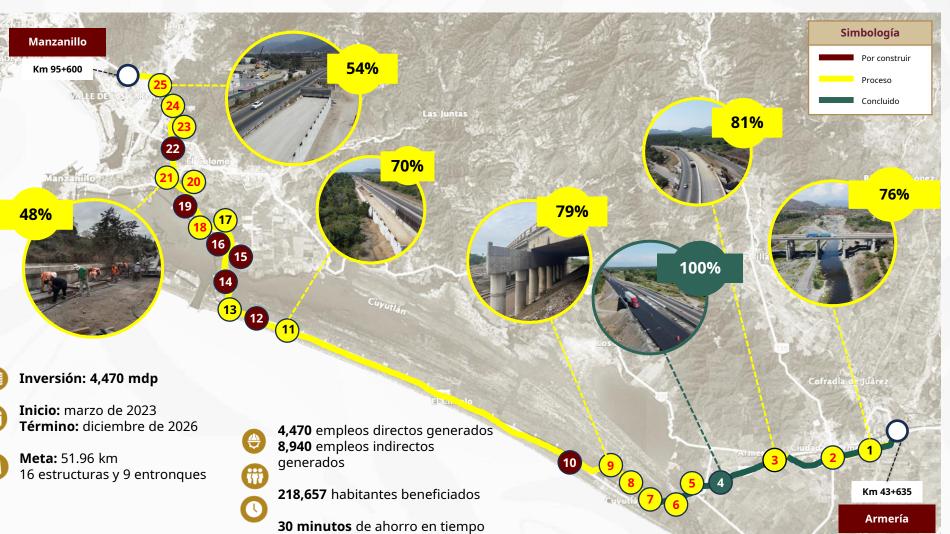

1	Puente Armería I km 45+500 (76%)				
2	Entronque Paraíso km 47+741 (78%) No esta programado avance.				
3	PSFFCC Armería II km 50+100 (81.10%) Sin trabajos programados para esta semana				
4	PSV Tilapia km 54+350 (100%)				
5	Puente Palo Verde I km 55+950 (41.03%) Condiciones de perforación adversas.				
6	Puente Palo Verde II km 56+650 (17%) Retraso en logística de perforación				
7	PIV Ent. Salinero II km 59+500 (9%) Retraso por logística en demolición de PIV existente.				
8	Entronque Salineros km 59+551 (5%) Falta regularizar programa				
9	PSFFCC Salinero I km 60+500 (79.45%) Sin trabajos programados para esta semana				
10	Entronque Cuyutlán km 60+880				
11	PIV Retorno en U km 77+600 (70%)				
12	Entronque Retorno en U km 77+600				
13	PSFFCC Tepalcates I km 79+900 (13.25%)				
14	Entronque Tepalcates I km 80+100				
15	Puente Nuevo Tepalcates II km 81+323				
16	Entronque Tepalcates II km 83+500				
17	Puente Adjuntas km 85+950 (38%)				
18	PSV Panteones km 87+300 (21%) Falta de Fuerza de Trabajo				
19	Entronque Panteones km 87+630				
20	PIV Minatitlán Lib km 92+000 (4%) Se detuvieron trabajos por interferencia con instalaciones de CFE.				
21	PIV Minatitlán Lib II km 92+000 (48%) Sin trabajos programados para esta semana				
22	Entronque Minatitlán km 92+731				
23	PIV Minatitlán Lib I km 93+000 (15.75%) Se fabricaron trabes de otras prioridades				
24	Entronque Jalipa km 94+100 (9%) Hay que cambiar el transito al cuerpo izquierdo del paso del puente				
25	Puente Jalipa km 94+158 (54%) Se debe cambiar el transito al CD, no se ha cambiado ya que no se encuentra terminado el MME.				

Colima

Tramo Armería-Manzanillo


Florente	Intervención	Ejecutado acumulado	Faltante	26/09/25 al 02/10/25		01	
Elemento				Programado	Ejecutado	Observaciones	
		Volúmenes d	e Obra en Tro	ncal			
						/ /	
Cortes (m³)	210,113	264,884	0	0	320		
						El programa origen para lo	
Terraplenes (m³)	813,909	500,825	313,085	0	2,452	trabajos que se ejecutan en la troncal llegó a su fin. Se está solicitando a la concesionaria entregue la reprogramación de los trabajos para concluir dentro	
Base y sub base (m³)	260,119	144,062	116,057	0	2,109	del plazo establecido	

NOTA: Los precios y avances mostrados en este reporte son con respecto a los catálogos y contrato vigente. El volumen programado proviene de un programa provisional. Se está trabajando en un nuevo programa.





Avance Programado - Físico - Financiero (%)

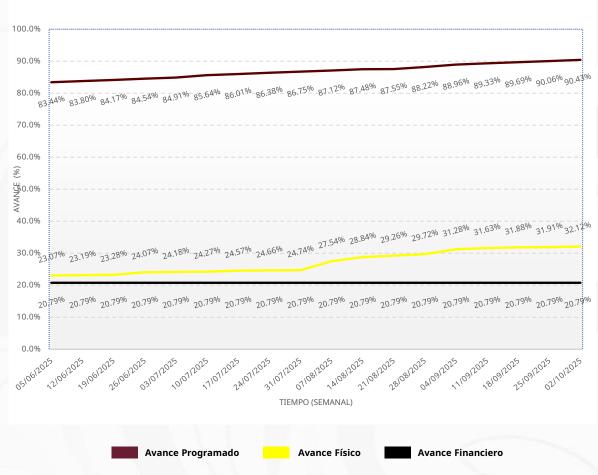

	19 de septiembre al 25 de septiembre	26 de septiembre al 02 de octubre
Fuerza de Trabajo (personas)	152	131
Maquinaria	70	54
