

Estado de México

Atizapán-Atlacomulco



Descripción	
1	Entronque Chiluca 15.00% , (sin actividad, falta de recursos)
2	Viaducto Sin Nombre km 20+880.00 60.50% (bancos de apoyo)
3	Viaducto La Estadía km 22+332.00 71.83%
4	Viaducto Los Gallos km 27+425.00 56.89%
5	Túnel Los Gallos km 27+770.00 95.00% , (sin actividad, faltan todos los elementos electromecánicos y pavimento)
6	Viaducto Sin Nombre km 31+033.00 61.89%
7	Viaducto Tlazala km 31+359.00 55.00%
8	Túnel Cahuacán I km 36+258.00 95.00% , (sin actividad, faltan todos los elementos electromecánicos y pavimento)
9	Viaducto Cahuacán III km 38+995.00 27.63% (se reanudan actividades: tratamiento de acero de refuerzo intemperizado)
10	Viaducto Sin Nombre km 42+053.00 10.94%
11	Entronque Villa del Carbón km 47+974.00 00.00% (no se han iniciado trabajos)
12	Viaducto El Llano km 51+016. 00.90% (sin actividad, problemas sociales)
13	Viaducto Sin Nombre km 54+770.00 03.80% , sin actividad, problemas sociales
14	Viaducto Los Chaparrales km 73+387.00 00.00% (no se han iniciado trabajos)
15	Viaducto El Pescado km 75+482.00 3.00% (no se han iniciado trabajos)
16	Entronque Ixtlahuaca km 76+188.00 35.00% , (sin actividades, problemas sociales)
17	Entronque La Luna km 83+960.00 00.00% (no se han iniciado trabajos)
18	Viaducto El Salto km 91+874.00 16.80% , (sin actividad, problemas sociales)
19	Entronque Atlacomulco



Inversión: 9,865.8 mdp a precios de 2014 incluye I.V.A., incluye monto de obra (7,662mdp) y Fondo de Obra Adicional (843 mdp)



Meta: 74 km, 2 Plazas de cobro,
12 Viaductos, 2 Túneles, 4 Entronques,
80 PSVyG



Inicio: 01 marzo 2016
Término: 30 junio 2027



Avance físico:

- Programado: % 100.00
- Real: % 42.19
- Financiero: % 17.45
- Semanal: % 00.17
- Real respecto al ejecutable por DDV: % 100.00
- Financiero respecto al ejecutable por DDV: % 79.14



132,909 empleos generados
(**44,303** directos y **88,606** indirectos)



1 millón 244 mil habitantes beneficiados



60 minutos de ahorro en tiempo


Nota 1 : Se tiene una actualización de proyecto, presupuesto y reprogramación con nueva fecha de término. Sin embargo, la reprogramación no se encuentra regularizada con la SICT.

Nota 2: Por problemáticas sociales y climatológicas, solo se cuenta con 16.32 Km disponibles para trabajar

Estado de México

Atizapán-Atlacomulco

Elemento	Meta	Ejecutado acumulable	Faltante	12/06/2026 al 18/06/2026		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
Pilotes	344	210	134	0	1.0	La segunda dovela del Viaducto Tlazala se empujó con éxito entre el 11 y 12 de junio. Las condiciones climatológicas retrasaron trabajos en Viaducto km 42+053.
Zapatas	86	53	33	0	0.50	
Columnas	96	30	66	0	0.00	
Cabezales	76	16	60	0	0.50	
Caballetes	24	10	14	0	0	
Trabes de concreto	395	13	382	0	0.00	
Trabes metálicas	29	3.20	25.8	0	0.10	

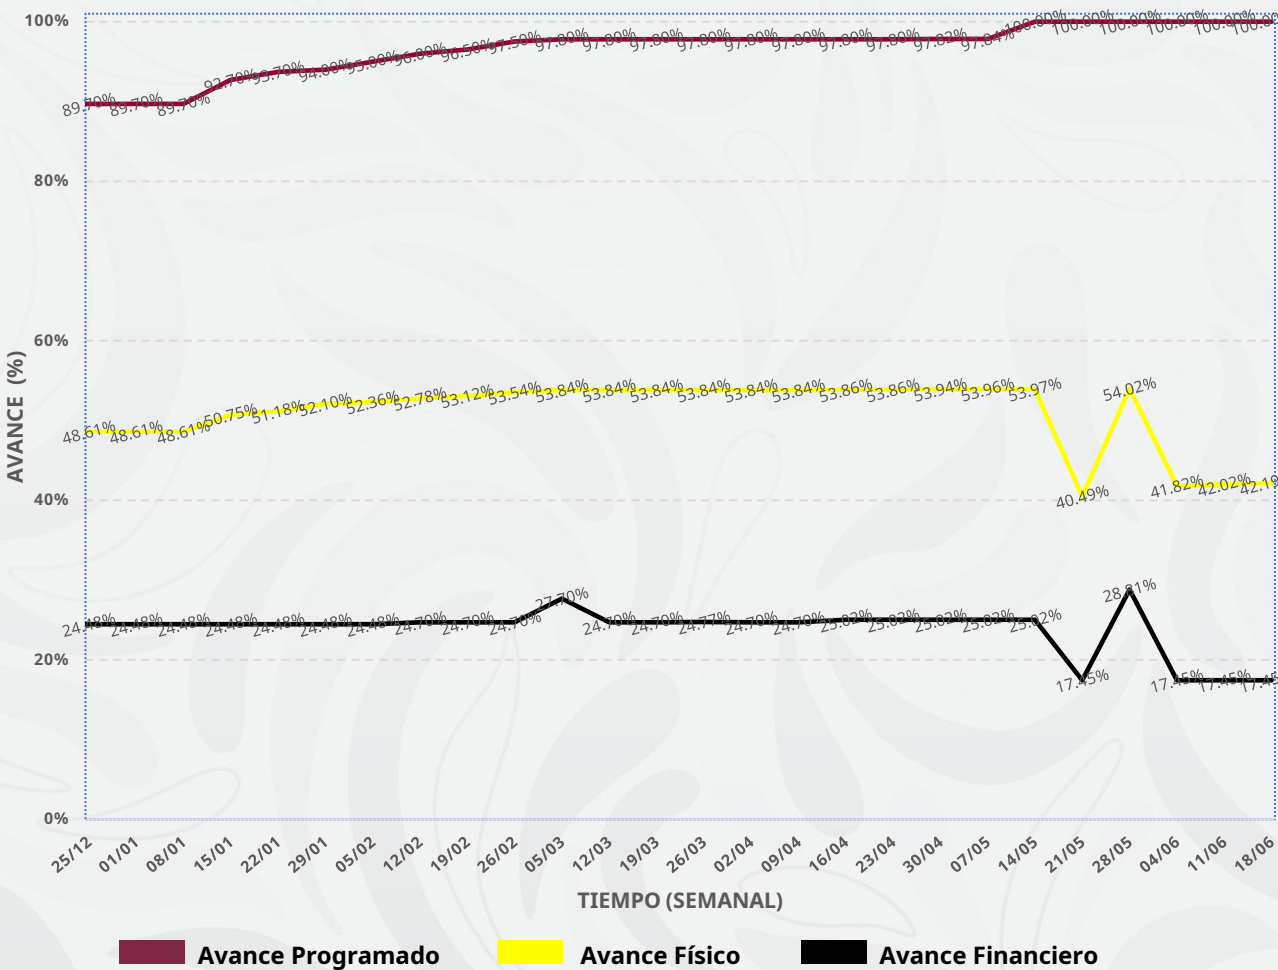

	Del 06 de junio al 11 de junio de 2026	Del 12 de junio al 18 de junio de 2026
Fuerza de Trabajo (personas)	2,726	2,754
Maquinari	676	380
Frentes de trabajo	Tramos 01, 2A y 2B	Tramos 01, 2A y 2B

	Descripción	Longitud de estructuras (m)	Longitud de accesos (m)
1	Entronque Chiluca 15% (sin actividad, falta de recursos)	459	
2	Viaducto Sin Nombre 61% (bancos de apoyo)	216.5	10
3	Viaducto La Estadía 72% (trabajos preliminares para colado de losa de claro 3)	136.5	12
4	Viaducto Los Gallos 57% (Colado de cabezal de Apoyo 8)	458.5	12
5	Túnel Los Gallos 95% (sin actividad, faltan todos los elementos electromecánicos y pavimento)	208	
6	Viaducto Sin Nombre 62%	262.5	11
7	Viaducto Tlazala 55% (se ejecutó el empuje de la dovela 2 de 70 m)	385	12
8	Túnel Cahuacán I 95% (sin actividad, faltan todos los elementos electromecánicos y pavimento)	225	
9	Viaducto Cahuacán III 28% (se reanudan actividades: tratamiento de acero de refuerzo intemperizado)	460	12
10	Viaducto Sin Nombre 11%	464	10
11	Entronque Villa del Carbón 0% (no se han iniciado trabajos)	1020	
12	Viaducto El Llano 1% (sin actividad, problemas sociales)	380	12
13	Viaducto Sin Nombre 0% sin actividad, problemas sociales	464	10
14	Viaducto Los Chaparrales 0% (no se han iniciado trabajos)	492.85	12
15	Viaducto El Pescado 3% (no se han iniciado trabajos)	282.628	10
16	Entronque Ixtlahuaca 35% (sin actividades, problemas sociales)	1100	
17	Entronque La Luna 0% (no se han iniciado trabajos)	1600	
18	Viaducto El Salto 17% (sin actividad, problemas sociales)	302.95	10
19	Entronque Atlacomulco 100% Terminado		
