


Veracruz Autopista Cardel - Poza Rica

Laguna Verde-La Mancha

Concesionaria: IDEAL
Constructora: MOTA-ENGIL, S.A. de C.V.

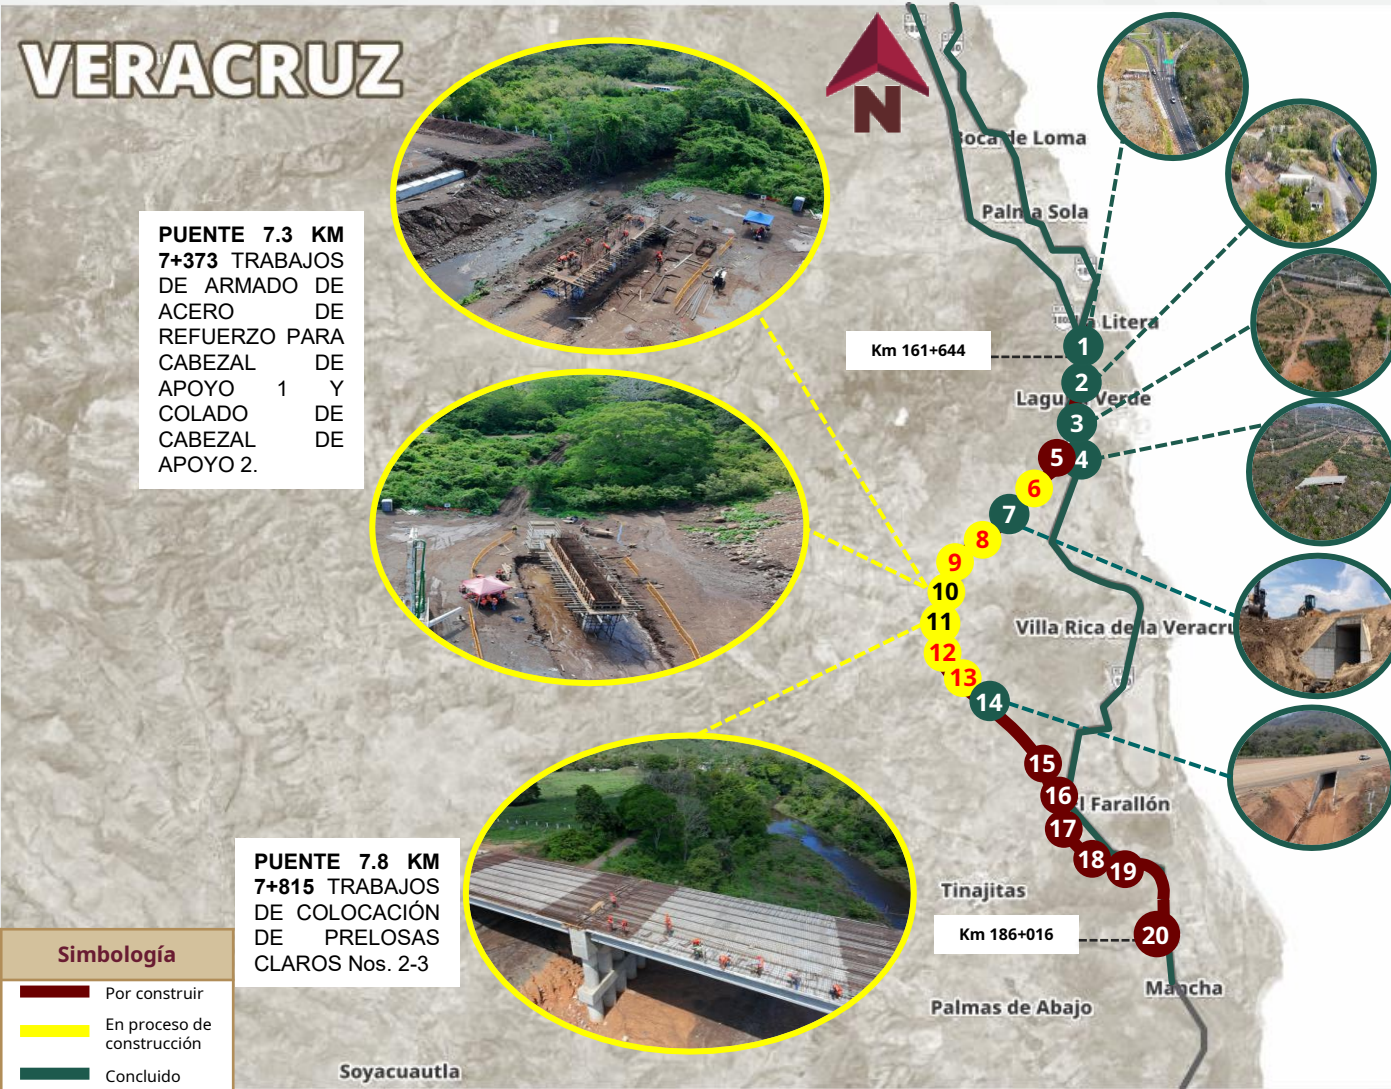

**Gobierno de
México**

ACTUALIZADA 22/06/2026

Comunicaciones

Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

Avance físico

- Programado: 90.91%
- Real: 35.94% Incluye Ent. Chapachapa
- Financiero: 17.06%
- Semanal: 0.23%

 **Inversión: 2,252.78 mdp**

 **Inicio:** Marzo de 2025
Término: Diciembre de 2026

Meta: 19.84 km, 5 Puentes, 1 Plaza de Cobro, 3 Entronques, 2 PSVs, 3 PIVs, 6 PSMAs, 59 ODTs y el Entronque Chapachapa

 **2,252.78 (1)=2,253** empleos directos generados/millón de inversión
2,252.78 (2)= 4,506 empleos indirectos generados/millón de inversión

 **128,000** habitantes beneficiados


 **45 minutos** de ahorro en tiempo,
Tramo 4

Descripción	
1	Entronque Laguna Verde II Km 0+000
2	PSMA 1.5 Km 1+555.5
3	PSMA 2.7 Km 2+703.91
4	PIV 3.05 Km 3+041
5	Entronque Laguna Verde I Km 3+041
6	PSMA 3.9 Km 3+900 (8.00%)
7	PSMA 6.0 Km 6+080
8	PIV 6.8 Km 6+806 (96.00%) (se movió la fuerza de trabajo)
9	PIV 7.04 Km 7+040 (5.00%) (se continuó con la evaluación de la reubicación de la estructura).
10	PUENTE 7.3 Km 7+330 (34.00%) (Trabajos de colado de cabezal en apoyo 2 y armado de acero de refuerzo para cabezal en apoyo 1).
11	PUENTE 7.8 Km 7+815, (70.50%) (Trabajos de colocación de prelosas claros nos. 3-4)
12	PLAZA DE COBRO Km 8+300, (16.00%) (El proyecto ejecutivo está en revisión en la DGDC).
13	PUENTE 8.7 Km 8+665, (96.00%) a nivel de losa colada
14	PSMA 8.9 Km 8+960,
15	PUENTE 14 Km 14+000
16	PUENTE 14.7 Km 14+700
17	PSV Km 14+900
18	PSMA 15.3 Km 15+370
19	PSV 16.8 Km 16+800
20	ENTRONQUE LA MANCHA Km 19+841

Veracruz Autopista Cardel - Poza Rica

Laguna Verde-La Mancha

Elemento	Intervención	Ejecutado acumulado	Faltante	04/06/26 al 11/06/26		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
Tramo 4 Laguna Verde - La Mancha						
Volúmenes de obra						
Terraplén	1,155,915.50	225,460.11	930,455.39	20,641.00	0.00	Afectación del avance por lluvias.
Pedraplén	97,038.03	54,490.54	42,547.49	4,043.25	0.00	Afectación del avance por lluvias
Subyacente	162,462.20	71,463.85	90,998.35	27,077.03	0.00	Afectación del avance por lluvias
Subrasante	124,961.00	23,681.94	101,279.06	17,851.57	0.00	Afectación del avance por lluvias
Base Hidráulica	54,900.80	18,970.15	35,930.65	9,150.13	0.00	Afectación del avance por lluvias
Riego de impregnación	274,504.00	49,325.09	225,178.91	45,750.67	0.00	Afectación del avance por lluvias
Estructuras Tramo 4 Laguna Verde - La Mancha						
Cargaderos	2	2	0	0	0	Puente 7.3 Km 7+373
Apoyos	2	2	0	0	0	Puente 7.3 Km 7+373
Cabezales	4	3	1	1	1	Puente 7.3 Km 7+373 Trabajos de colado de cabezal en apoyo 2 y trabajos de armado de acero de refuerzo para cabezal del apoyo 1.

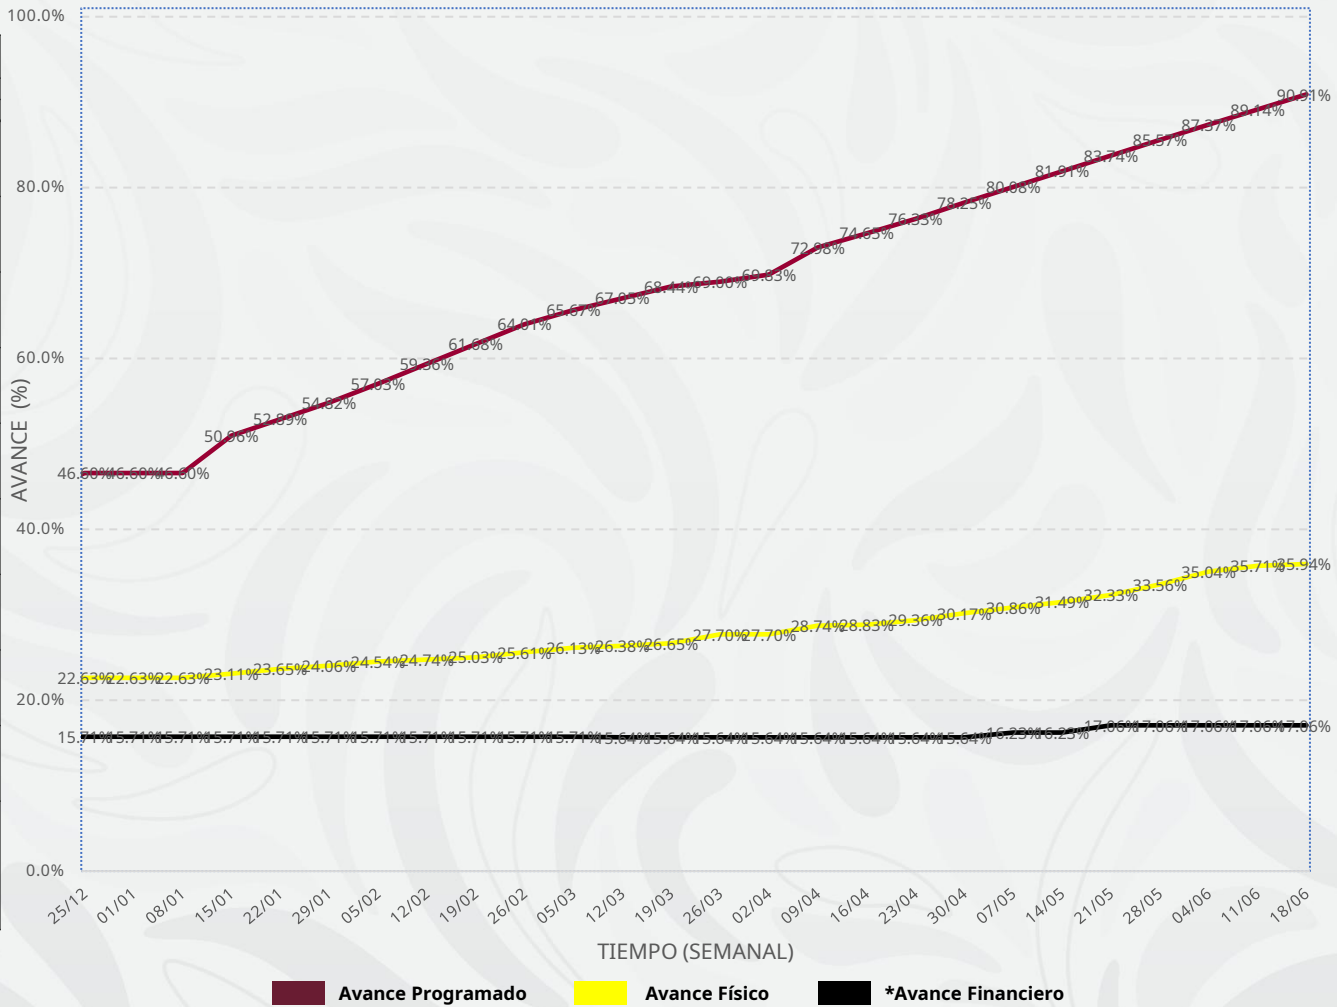

	Del 05 de junio al 11 de junio de 2026	Del 12 de junio al 18 de junio de 2026
Fuerza de Trabajo (personas)	270	270
Maquinaria	47	49

Veracruz Autopista Cardel - Poza Rica

Laguna Verde-La Mancha

Descripción		Longitud de estructuras (m)	Longitud de accesos (m)
1	Entronque Laguna Verde II Km 0+000	50.30	80
2	PSMA 1.5 Km 1+555.5	23.50	80
3	PSMA 2.7 Km 2+703.91	40	80
4	PIV 3.05 Km 3+041	50.40	80
5	Entronque Laguna Verde I Km 3+041	1500	
6	PSMA 3.9 Km 3+900 (8.00%)	19.46	20
7	PSMA 6.0 Km 6+080	21.98	20
8	PIV 6.8 Km 6+806 (96.00%) (se movió la fuerza de trabajo)	33	80
9	PIV 7.04 Km 7+040 (5.00%) (se continua con la evaluación de la reubicación de la estructura).	29.16	80
10	PUENTE 7.3 Km 7+330 (34.00%) (Trabajos de colado de cabezal en apoyo 2 y armado de acero de refuerzo para cabezal en apoyo 1).	90	80
11	PUENTE 7.8 Km 7+815, (70.50%) (Trabajos de colocación de prelosas claros nos. 3-4)	150	80
12	PLAZA DE COBRO Km 8+300, (16.00%) (El proyecto ejecutivo está en revisión en la DGDC).	460	
13	PUENTE 8.7 Km 8+665, (96.00%) a nivel de losa colada	46	40
14	PSMA 8.9 Km 8+960,	30.73	40
15	PUENTE 14 Km 14+000	150	80
16	PUENTE 14.7 Km 14+700	90	80
17	PSV Km 14+900	50	80
18	PSMA 15.3 Km 15+370	24.73	40
19	PSV 16.8 Km 16+800	56	80
20	ENTRONQUE LA MANCHA Km 19+841	1700	-

Veracruz Autopista Cardel - Poza Rica

Laguna Verde-La Mancha

Concesionaria: IDEAL
Constructora: MOTA-ENGIL, S.A. de C.V.



Avance físico

- Real: 100.00%
- Programado: 100.00%
- Financiero: 75.01%
- Semanal: 0.00%

Descripción	
1	Entronque Chapachapa Km 739+733 (Km op. 92+512)
2	ODT 92+827.25
3	PSPyG 92+832.22
4	Ampliación de ODT 100+102,

Veracruz Autopista Cardel - Poza Rica

Laguna Verde-La Mancha

	Descripción	Longitud de estructuras (m)	Longitud de accesos (m)
1	Entronque Chapachapa Km 739+733 (Km op. 92+512)	28	80
2	ODT 92+827.25	29.60	N/A
3	PSPyG 92+832.22	36.75	40
4	Ampliación de ODT 100+102,	24.80	N/A
