

San Luis Potosí

La Pitahaya-Libramiento Oriente de S.L.P. y El Ramal Villa de Reyes



Gobierno de
México

Comunicaciones

Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

Avance físico • Programado: **12.24%**
• Real: **7.79%**

Avance financiero: 8.82%

Inversión: 8,331.12 mdp. Incluye I.V.A.

Inicio: 14 de agosto 2025
Término: 14 de febrero 2028


Meta: 68.5 km. + 2.4 Km del Ramal
79 Estructuras; Puentes, PSV'S, PSFCC, PIV'S.
1 Plaza de Cobro, 5 Entronques,
165 ODT'S.

Concesionaria: META

2000 Empleos directos generados
600 Empleos indirectos generados

128 000 habitantes beneficiados


20 minutos de ahorro en tiempo

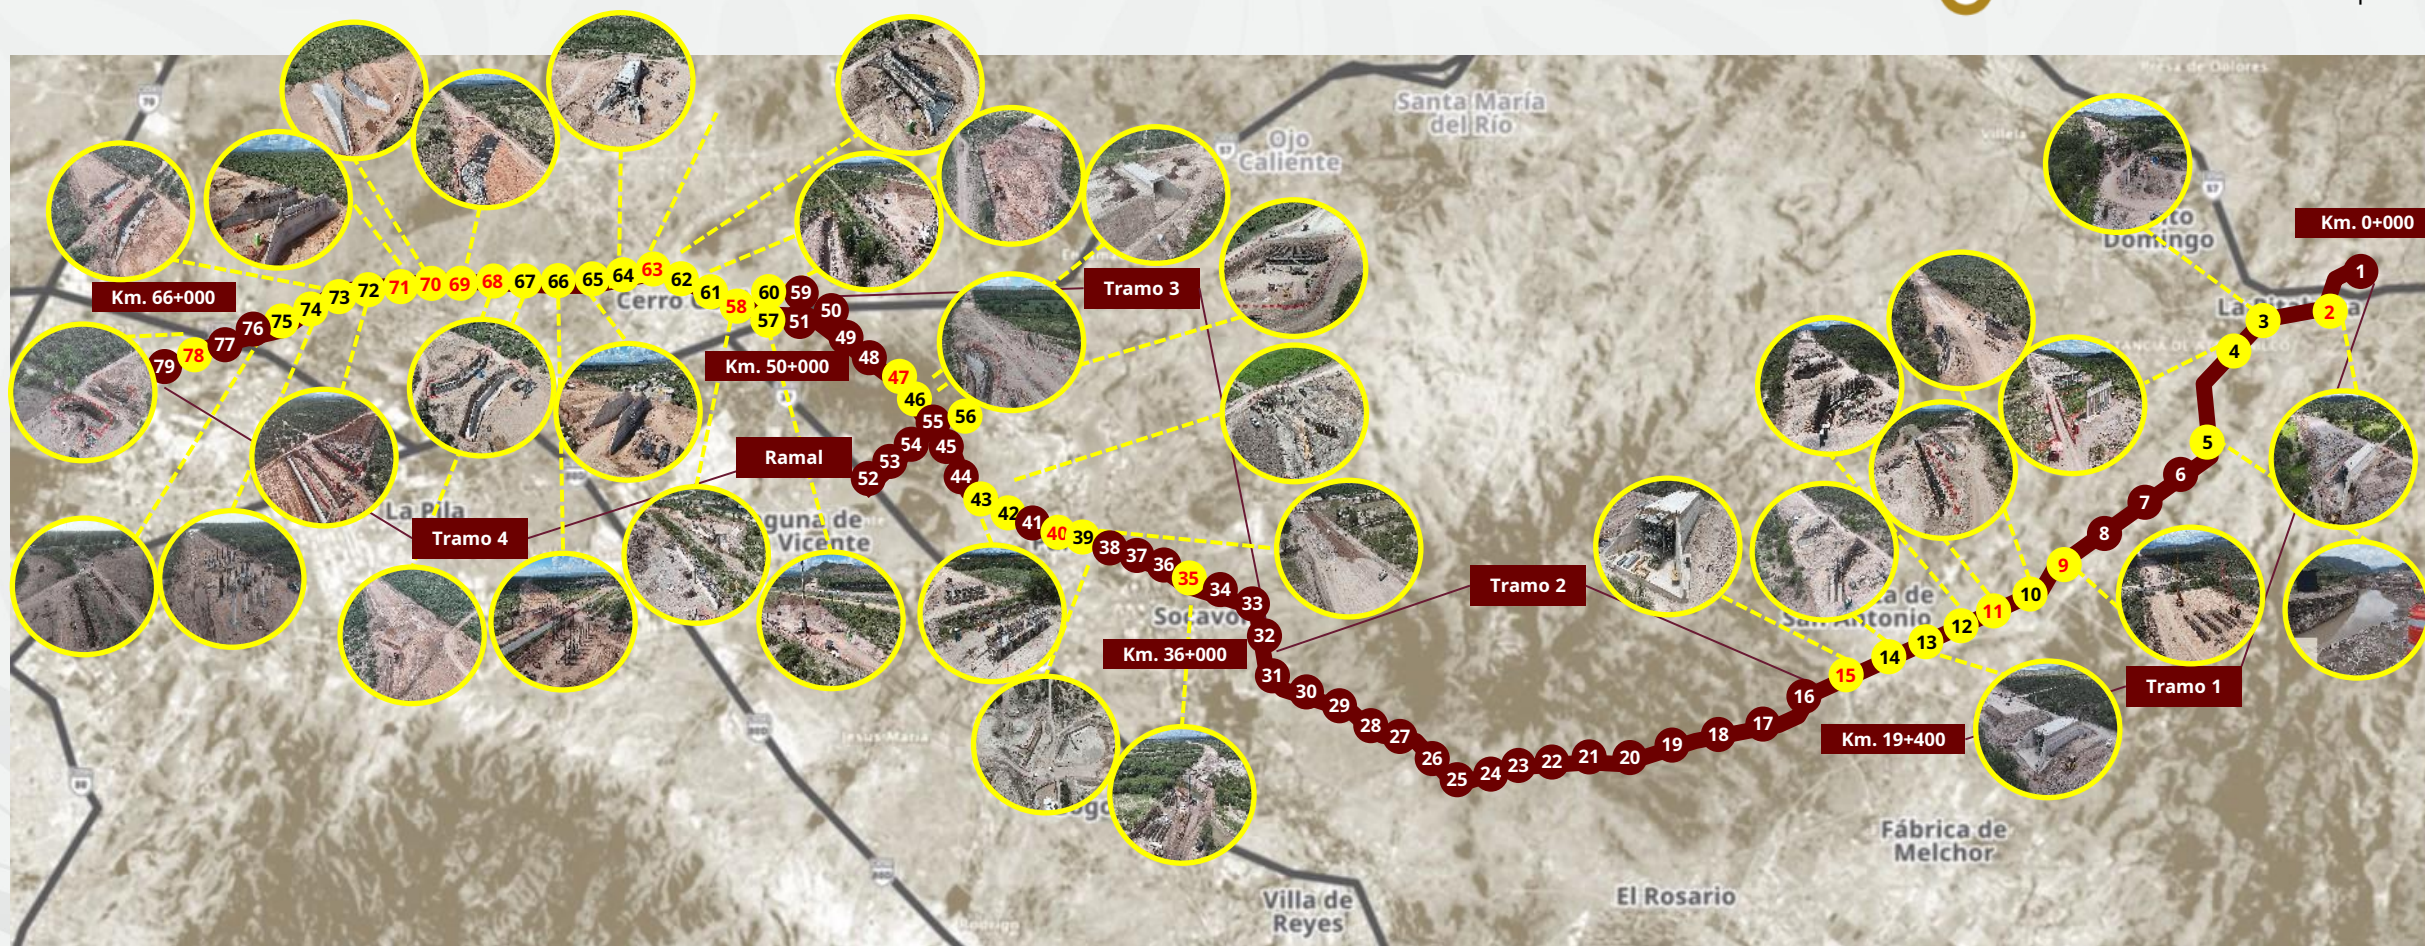

San Luis Potosí

La Pitahaya-Libramiento Oriente de S.L.P. y El Ramal Villa de Reyes

Volúmenes de obra				
Tramo I km. 0+000 al Km. 19+400 Tramo III Km. 36+000 al Km. 50+000 Tramo IV km. 50+000 al Km. 66+000				
Elemento	Intervención	Ejecutado acumulado	Faltante	Ejecutado
Terracerías				
Desmonte, cualquiera que sea su tipo y	388.22	276.95	111.27	1.19
Despalme de espesor variable en corte y	733,873.06	386,171.55	347,701.51	43,181.31
Excavaciones en cortes y adicionales debajo	2,860,090.52	316,030.97	2,544,059.55	1,756.00
Construcción de terraplenes utilizando	3,858,592.51	396,125.02	3,462,467.48	7,824.55
Construcción de terraplenes utilizando	3,710,618.07	661,132.96	3,049,485.11	45,326.24
Formación y compactación de terraplenes	330,950.70	55,488.86	275,461.84	1,060.52
Formación y compactación de terraplenes	1,570,694.98	13,980.86	1,556,714.12	418.80
Obras de Drenaje				
Excavación para estructuras u obras de	53,714.94	5,464.33	48,250.61	-
Plantilla de material Granular, P.U.O.T	5,780.69	437.66	5,343.03	23.15
Arroje y Relleno con material de calidad de	74,713.07	8,459.22	66,253.85	639.50
Alcantarilla de concreto reforzado de f'c =	7,394.04	681.55	6,712.49	-
Concreto hidráulico de f'c= 100 kg/cm2 en	1,399.10	421.22	977.88	7.45
Concreto hidráulico de f'c=150 kg/cm2, por	3,314.74	3,267.47	47.27	107.19
Concreto hidráulico de f'c=200 kg/cm2 en	13,274.04	580.90	12,693.14	47.42
Acero para concreto hidráulico con límite	356,544.18	142,965.47	213,578.71	7,128.46
Malla electrosoldada 6x6 10-10, P.U.O.T	2,330.47	947.01	1,383.46	-
Entronques				
Terracerías				
Despalme de espesor variable en corte y	61,394.70	47,454.81	13,939.89	542.24
Excavaciones en cortes y adicionales debajo	848,439.10	181,750.31	666,688.79	3,002.31
Construcción de terraplenes utilizando	325,337.10	63,037.06	262,300.04	420.89
Formación y compactación de terraplenes	68,896.40	1,645.02	67,251.39	85.85
Formación y compactación de terraplenes utilizando materiales	321,746.40	1,421.76	320,324.64	939.65

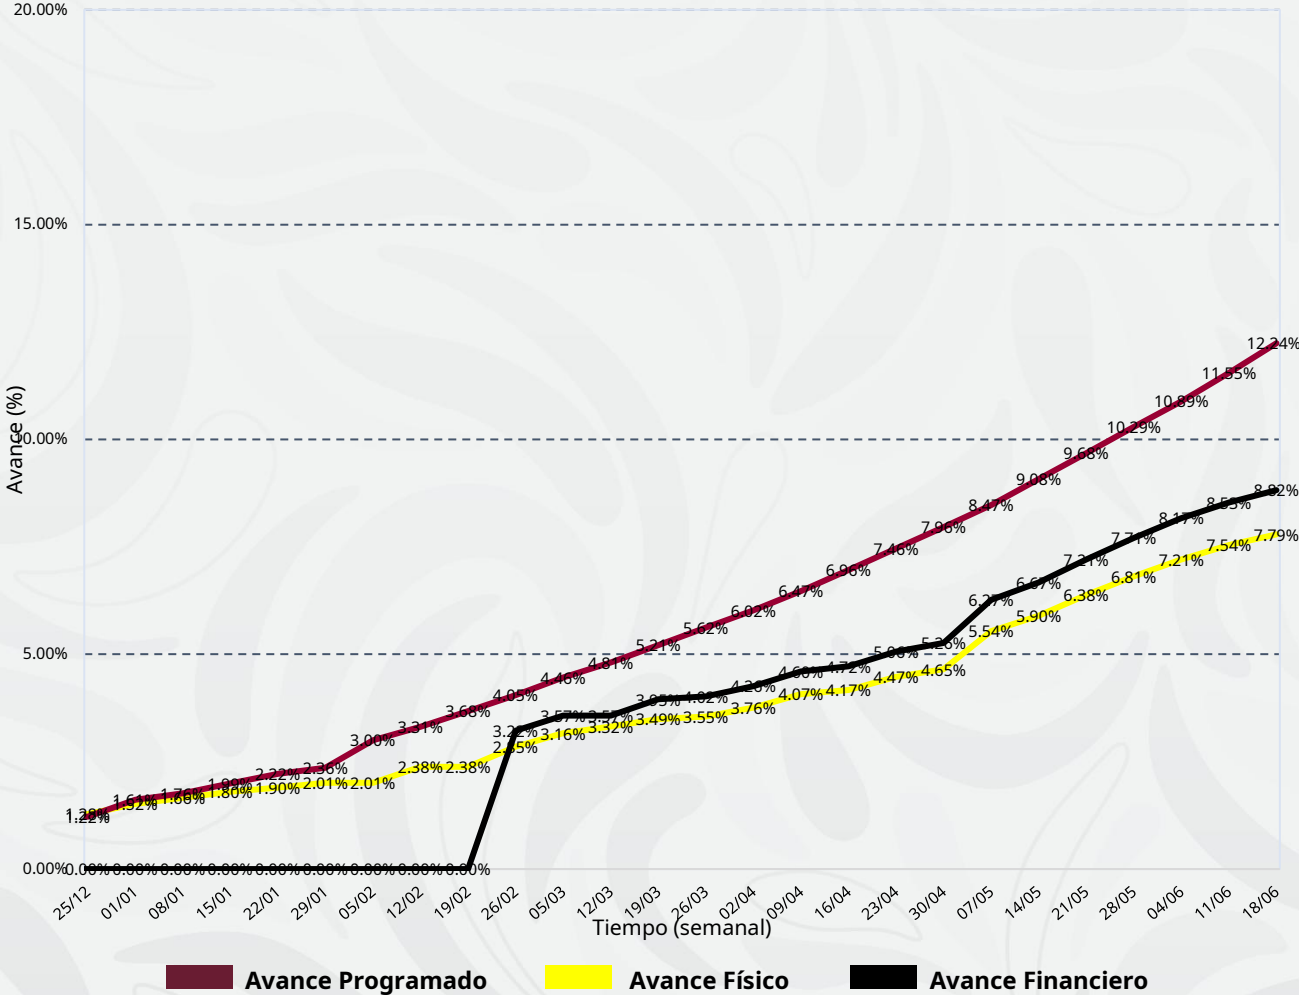

	Del 05 de mayo al 11 junio 2026	Del 12 de junio al 18 junio 2026
Fuerza de Trabajo (personas)	901	918
Maquinaria	169	180
Frente de Trabajo	Tramo 1/Tramo 3/Tramo 4	Tramo 1/Tramo 3/Tramo 4

San Luis Potosí

La Pitahaya-Libramiento Oriente de S.L.P. y
El Ramal Villa de Reyes



Gobierno de
México

Comunicaciones
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

Estructuras Proyectadas por Tramo

Tramo 1

Descripción		Longitud de estructuras (m)	Longitud de accesos (m)
1	Ent. La Pitahaya Km. 0+500	85.65	5.086
2	PSV Km. 2+096.73 94.50%	54.80	80
3	Puente Km. 2+481 15.50%	119.40	80
4	Ducto Km. 2+680 53.50%	44.50	80
5	PIV Km. 9+289.75 1.40%	35.88	400
6	Ducto Km. 10+853	-	-

Descripción		Longitud de estructuras (m)	Longitud de accesos (m)
7	PSFFCC Km. 12+780	-	-
8	PIV Km. 12+930	-	-
9	PSV Km. 14+043 0.50%	26.50	80
10	PIV Km. 14+810 0.22%	39.60	400
11	PSFFCC Km. 16+250 6.80%	93.64	80
12	PIV Km. 17+530 48.00%	39.60	400

Descripción		Longitud de estructuras (m)	Longitud de accesos (m)
13	Ducto Km. 18+426 45.00%	30.80	80
14	Puente Km.18+610 48.50%	43.21	80
15	Dob Ca Km. 18+820 94.00%	27.44	80

Tramo 2

Descripción		Longitud de estructuras (m)	Longitud de accesos (m)
16	PSG Km.121+870	-	-
17	PSV Km. 123+453	-	-
18	Puente Km. 123+608	-	-
19	PSV Km. 126+360	-	-
20	PSV Km. 128+210	-	-
21	Puente Km. 128+420	-	-

Descripción		Longitud de estructuras (m)	Longitud de accesos (m)
22	Ducto Km. 129+005	-	-
23	PSV Km. 130+725	-	-
24	PSG Km. 131+530	-	-
25	PSV Km. 132+820	-	-
26	Ducto Km. 134+020	-	-
27	PSV Km. 134+604	-	-

Descripción		Longitud de estructuras (m)	Longitud de accesos (m)
28	Puente Km. 134+662	-	-
29	PSG Km. 135+950	-	-
30	PIV Km. 137+310	-	-
31	Puente Carranco Km. 137+820	-	-

San Luis Potosí

La Pitahaya-Libramiento Oriente de S.L.P. y
El Ramal Villa de Reyes

Estructuras Proyectadas por Tramo

Tramo 3

	Descripción	Longitud de estructuras (m)	Longitud de accesos (m)
32	PIV Km. 36+719.53	-	-
33	PIV Km. 37+739.99	-	-
34	PSV Km. 38+242.30	-	-
35	P. Altamira 39+520 13.91%	121.46	80
36	PSG Km. 39+750	-	-
37	PIV Km. 40+349.53	-	-
38	PIV Km. 41+119.44	-	-
39	Ducto 41+532 16.90%	43.00	80
40	PSG Km. 41+981.48 3.0%	26.67	80
41	PSV Km. 42+386	-	-
42	PSG Km. 42+650 7.20%	24.55	80
43	Puente Km. 42+990 50.40%	41.88	80
44	PSV Km. 43+456.78	-	-
45	PSV Km. 43+577.34	-	-
46	PIV Km. 44+243.13 28.20%	36.60	400
47	PSG Km. 45+380 91.50%	28.42	80
48	Ducto Km. 45+517	-	-
49	PSG Km. 46+930	-	-
50	PIV Km. 49+120	-	-
51	PIV Km. 49+900	-	-
52	E.c. Car 37 PSV Km. 16+540	-	-
53	PSV Km. 17+040	-	-
54	PSV Km. 17+610	-	-
55	PIV Km. 18+365	-	-
56	Ec.IndPSVKm18+700 19.30%	30.73	1.370

Tramo 4

	Descripción	Longitud de estructuras (m)	Longitud de accesos (m)
57	Ducto Km. 51+500 24.50%	35.40	80
58	Ducto Km. 10+333 68.10%	23.00	80
59	PSV Km. 10+500		
60	Ducto 20+580 23.90%	37.77	80
61	Ec Carr. 57 Km.51+800 0.08%	92.10	2.890
62	PSG Km. 52+190 40.60%	29.37	80
63	PIV Km. 53+150.26 46.60%	36.6	400
64	PSV Km. 54+424.37 86.20%	26.26	80
65	PSV Km. 54+952.42 79.43%	16.56	80
66	PSV Km. 55+407 20.20%	83.01	80
67	PIV Km. 56+354.38 2.00%		
68	PSV Km. 58+505 39.40%	19.00	80
69	PSV Km. 59+030 2.01%		
70	PSV Km. 60+579.85 39.00%	17.40	80
71	PSV Km. 61+561.78 76.80%	17.40	80
72	PSV Km. 62+398.36 29.40%	21.47	80
73	PSV Km. 63+517.92 53.20%	27.21	80
74	PSV Km. 64+800 40.60%	53.19	80
75	Ducto Km. 65+791.31 53.20%	22.90	80
76	Ec Lib Ote Km. 66+000		
77	PSV Km. 66+441.21		
78	PSV Km. 66+449.24 15.10%	23.00	80
79	PSV Km. 1+412		
