


Jalisco

Ampliación Libramiento Lagos de Moreno

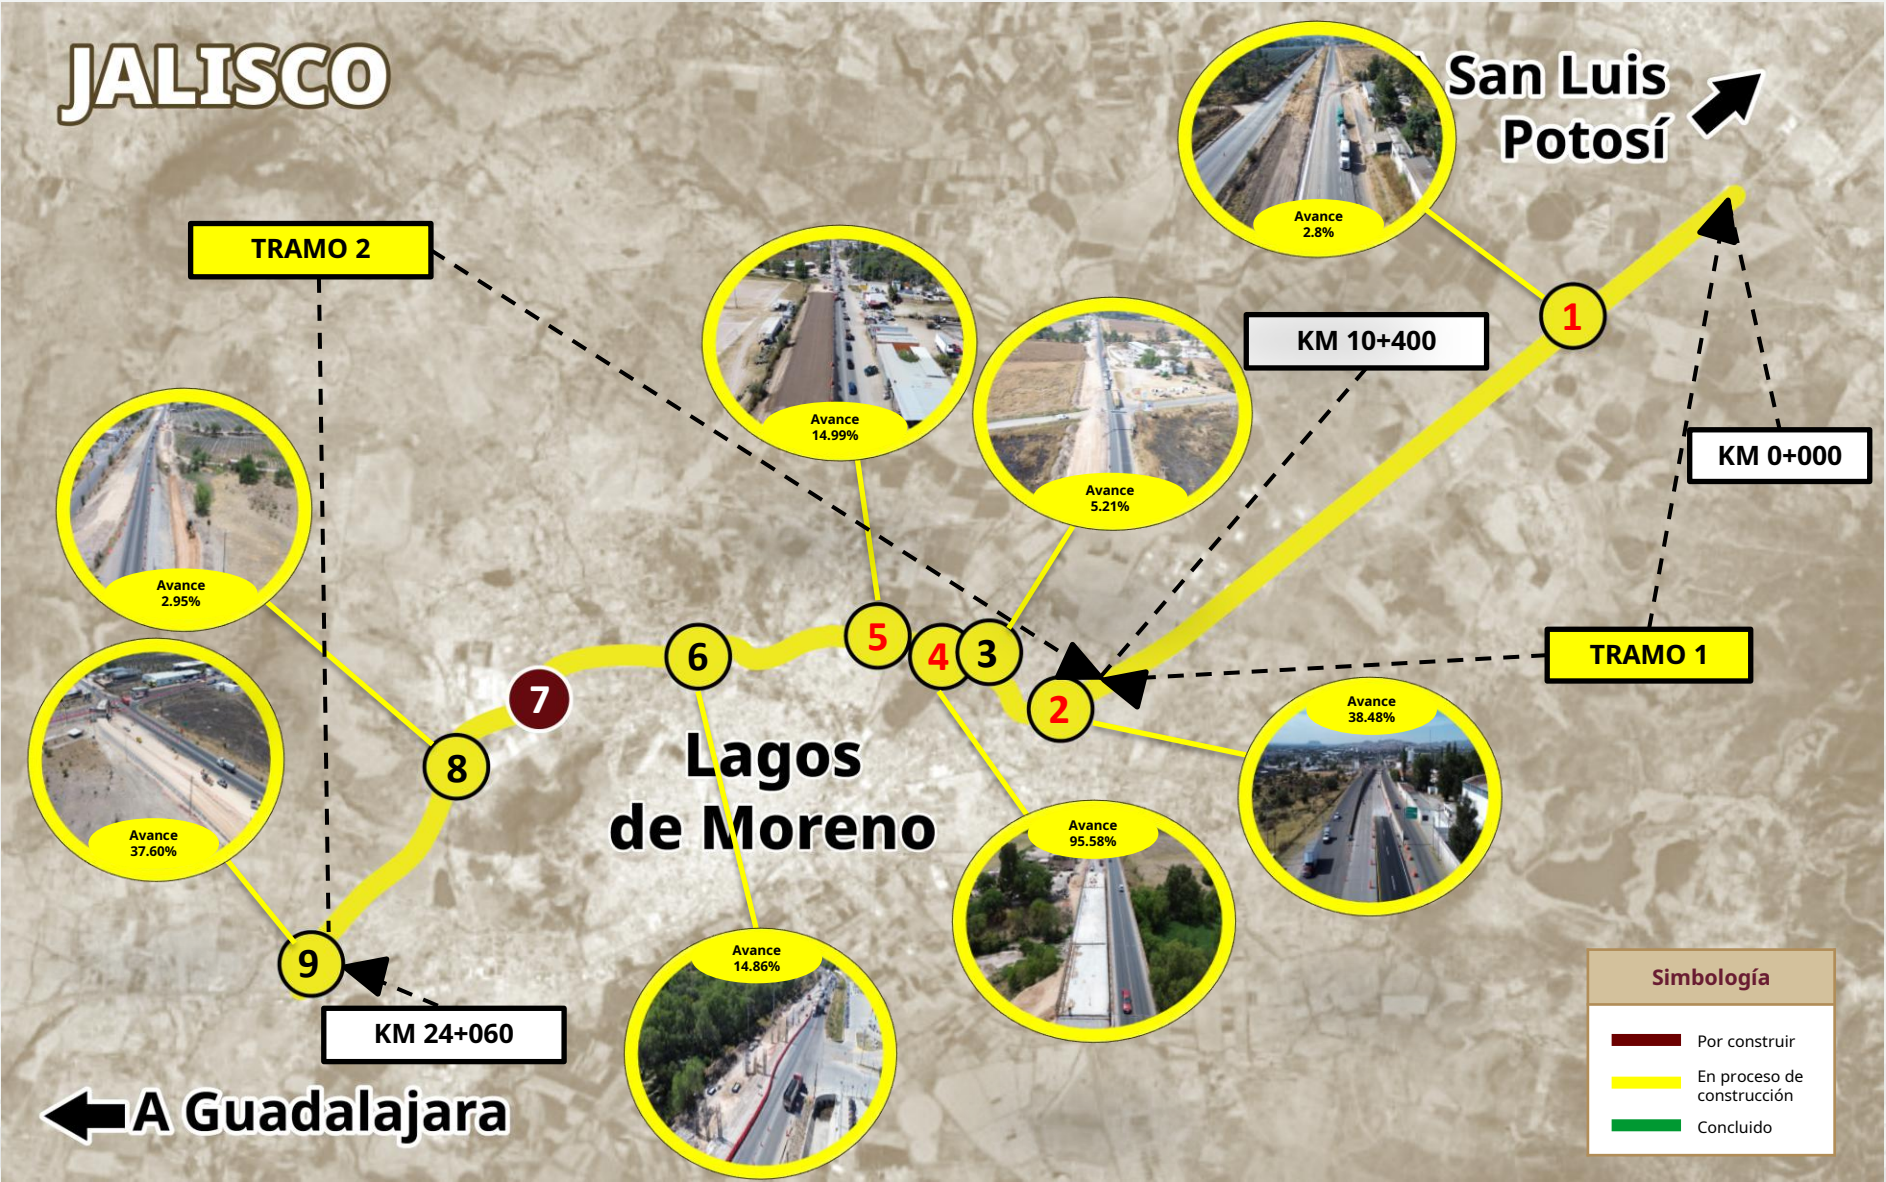


Descripción	
1	PIV con entronque "El Maguey" km 1+300 - Avance 2.8% . Problemas de DDV. (Modificación de proyecto).
2	Entronque a desnivel Lagos de Moreno Este km 11+800 (adecuación)- Avance 38.48% (sin fuerza de trabajo)
3	PIV con entronque "Fracc. Andalucía" km 12+120 Avance 5.21% .
4	Puente km 12+450 "Río Lagos"- Avance 95.58% . (sin fuerza de trabajo)
5	PIV con entronque "Sepúlveda" km 13+620 Avance 14.99% . (sin fuerza de trabajo)
6	PSV con entronque "DRÄXLMAIER" km 15+900 Avance 16.98%
7	PIV con entronque "Encarnación" km 18+200
8	PSFC con retornos km 19+860 Avance 2.95%
9	PIV con entronque Tipo Glorieta "Lagos de Moreno Oeste" km 23+920 Avance 37.60% .

Jalisco

Ampliación Libramiento Lagos de Moreno

TRAMO 2 - AVANCE TRONCAL Y ENTRONQUES							
Concepto	Unidad	Total	Ejecutado	Faltante	12/06/26 al 18/06/26		Observaciones
					Programado	Ejecutado	
Terracerías Troncal	%	100%	61.09%	38.91%	0.021%	0.36%	En proceso
Pavimentos Troncal	%	100%	31.95%	68.05%	0.040%	0.35%	En proceso
Drenaje Troncal	%	100%	31.66%	68.34%	0.00%	0.00%	En proceso
Obras Inducidas	%	100%	42.10%	57.90%	0.00%	0.00%	En proceso
Entronque km 12+120	%	100%	5.21%	94.80%	0.00%	0.01%	En proceso
Entronque km 12+450	%	100%	95.58%	4.42%	0.00%	0.00%	En proceso
Entronque km 13+620	%	100%	14.99%	85.01%	0.00%	0.00%	En proceso
Entronque km 15+900	%	100%	16.98%	83.02%	0.00%	2.12%	En proceso
PSFC 19+860	%	100%	2.95%	97.05%	0.00%	0.10%	En proceso
Entronque 23+920	%	100%	37.60%	62.40%	0.13%	1.75%	En proceso

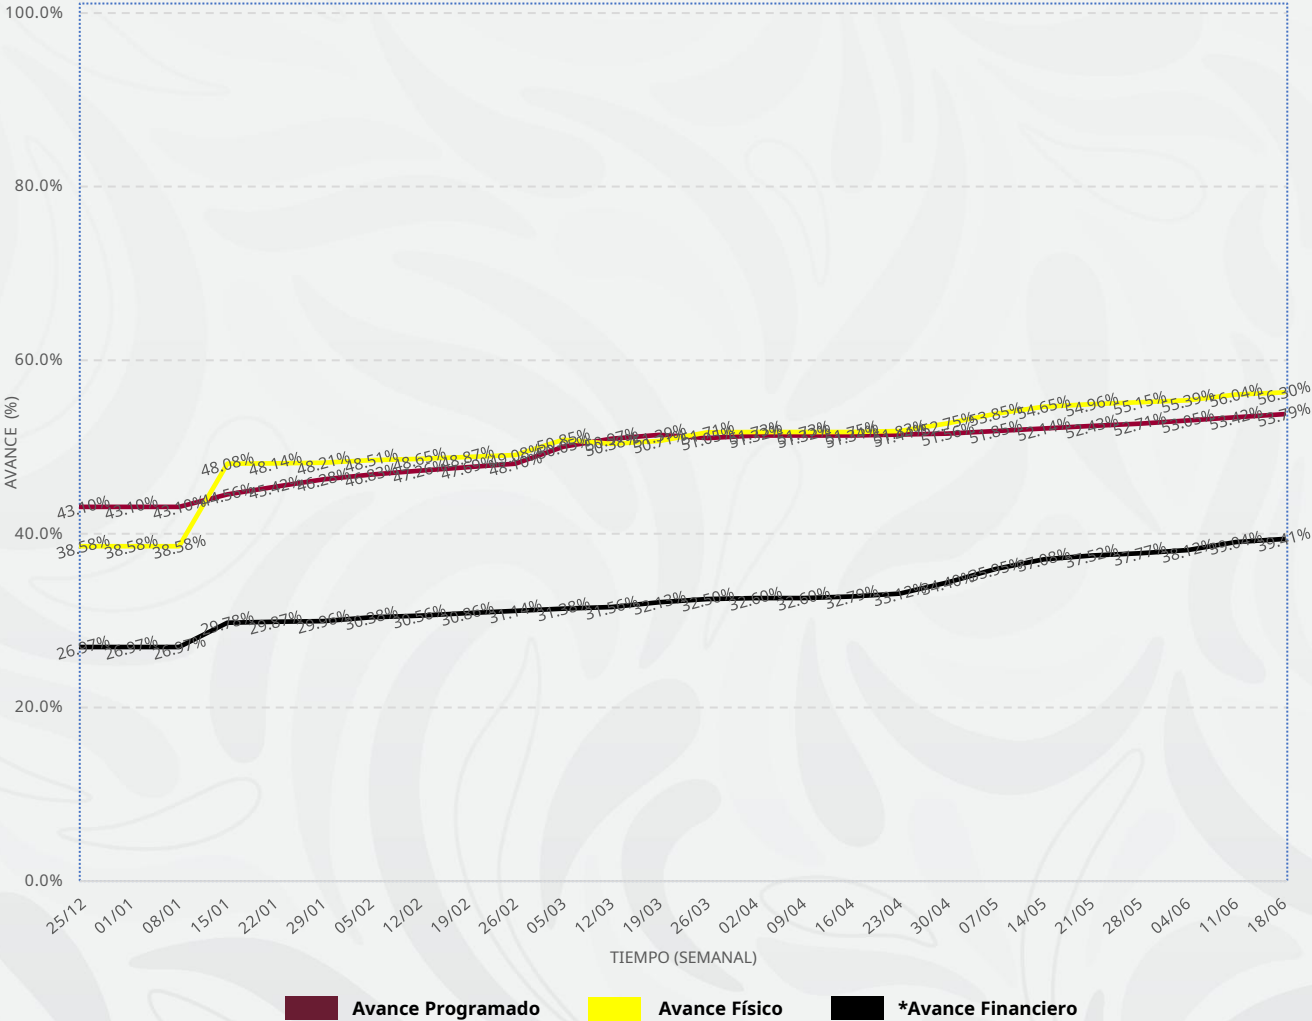

	Del 05 de junio al 11 de junio 2026	Del 12 de junio al 18 de junio 2026
Fuerza de Trabajo (personas)	246	246
Maquinaria	69	69

Jalisco

Ampliación Libramiento Lagos de Moreno

Descripción		Longitud de estructuras (m)	Longitud de accesos (m)
1	PIV con entronque "El Maguey" km 1+300 - Avance 2.8% . Problemas de DDV. (Modificación de proyecto).	0	300.00
2	Entronque a desnivel Lagos de Moreno Este km 11+800 (adecuación)- Avance 38.48%	0	0
3	PIV con entronque "Fracc. Andalucía" km 12+120 Avance 5.21% .	25.63	334.37
4	Puente km 12+450 "Rio Lagos"- Avance 95.58% .	83.66	0
5	PIV con entronque "Sepúlveda" km 13+620 Avance 14.99	25.66	303.29
6	PSV con entronque "DRÄXLMAIER" km 15+900 Avance 16.98%	88.16	601.75
7	PIV con entronque "Encarnación" km 18+200	37.94	367.06
8	PSFC con retornos km 19+860 Avance 2.95%	77.92	832.08
9	2 PIV's con entronque Tipo Glorieta "Lagos de Moreno Oeste" km 23+920 Avance 37.60% .	22.41 y 28.57	256.36
