

Oaxaca

Mitla-Entronque Tehuantepec II

Avance físico Global:

- Programado: 100%
- Real: 99.15%
- Semanal: 0.00%

Avance físico Tramo 2: • Real: 97.44%

Avance financiero

- Real pagado: 88.56%
- Con deuda: 97.44%
- Nota: De este porcentaje se tiene una deuda de 2,642.29 mdp incluye IVA, por trabajos ejecutados.



Descripción	
1	PIV km 87+900. 40% *
2	PIV km 91+530.
3	PIPR km 92+436.
4	PIV km 92+438.
5	PIV km 92+680. 0% *
6	Entronque Llano Crucero km 92+690. 82% *
7	Muro de pilas km 92+700. 32% *

* No hay avances debido a la falta de asignación de recursos

Descripción	
8	Entronque Llano Laguna km 98+200.
9	Entronque Cerro Pascale km 100+500.
10	PIV km 106+570.
11	PIV km 108+570.
12	PIV km 109+247.
13	PIV km 110+460.
14	Entronque Daniare km 111+600.

Descripción	
15	PIV km 112+270.
16	PIV km 114+766.
17	Entronque Agua Blanca Km 122+600.
18	Entronque Quiavicuzas Km 137+900.
19	Túnel El Tornillo km 139+400 (Colapsado). En elaboración proyecto del puente.
20	PIPG Km 146+840. 95% *
21	PIPG km159+400. 95% *

- Inversión:** 29,749.2 mdp incluye I.V.A sin incluir reclamos
- Término:** Inaugurada y puesta en operación 24 de enero de 2025 (pendiente obras complementarias)
- ❖ **Nota:** De los pasos de servidumbre 9 están terminados, 2 con un 95%, 1 al 40% y 5 sin iniciar
- ❖ El Túnel Tornillo se encuentra colapsado, actualmente se esta realizando trabajos de liberación de derecho de vía adquirido en la troncal y trabajos ambientales, para la construcción del puente.
- ❖ Se presento la constructora: Mota-Engil México, para la construcción del puente

Meta: 169.23 km; el cual son 159.29 km de Troncal, 6.54 km de puentes, 1.78 km de viaductos y 1.62 km de túneles.

65 puentes, 14 viaductos, 10 túneles, 20 entronques, 2 casetas y 17 pasos de servidumbre.

En proceso: Trabajos en la troncal, 1 entronque y 8 pasos de servidumbre

- 50 Empleos directos generados**
- 500 Empleos indirectos generados**
- +1 millón 400 mil habitantes beneficiados**
- 2 hrs. de ahorro en tiempo**
- Concesionaria:** Autovía Mitla Tehuantepec, S.A. de C.V. (IDEAL)


Oaxaca

Mitla-Entronque Tehuantepec II

Elemento	Intervención	Ejecutado acumulado	Faltante	12/06/26 al 18/06/26		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
Muro de pilas km 92+700						
Perforación de pilastrones	38	17	21	0	0	• Trabajos suspendidos por falta de asignación de recursos.
Armado y colado de pilastrones	38	17	21	0	0	

❖ Nota: A partir de esta fecha, ya no existirán avances debido a la considerable deuda que se tiene con las empresas contratadas por la concesionaria a la fecha y la falta de recursos presupuestales.

- Maquinaria:
- Excavadora (2) inactivo
 - Tractor (1) inactivo

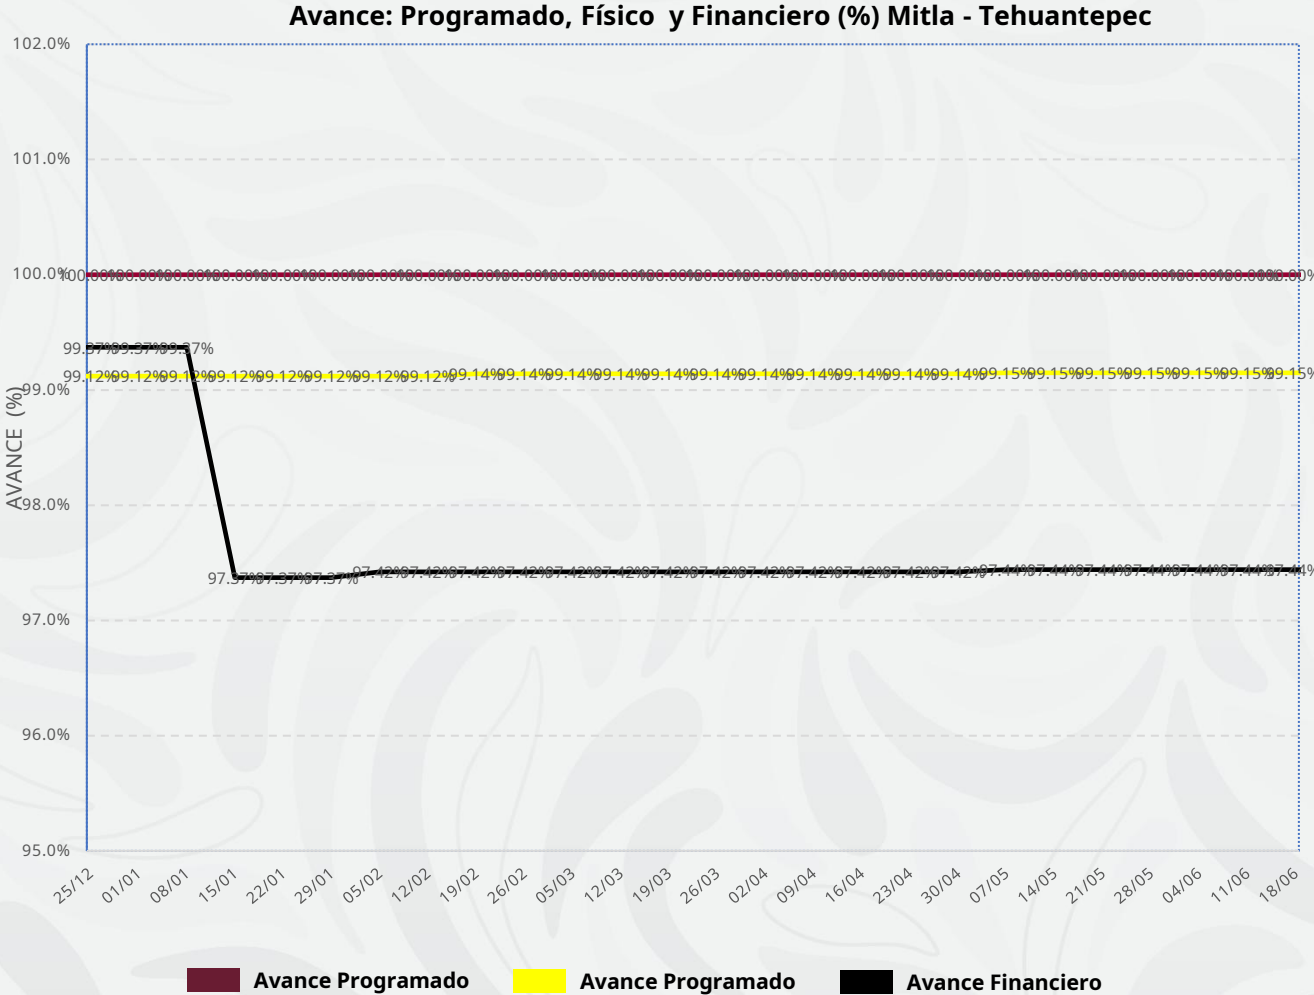

	Del 05 de junio al 11 de junio de 2026	Del 12 de junio al 18 de junio de 2026
Fuerza de Trabajo (personas)	50	50
Maquinaria	0	0
Frente de Trabajo	No Aplica	No Aplica

Oaxaca

Mitla-Entronque Tehuantepec II

Descripción		Longitud de estructuras (m)	Longitud de accesos (m)
1	PIV km 87+900. 40% *	30.00	80.00
2	PIP km 91+530.	33.80	80.00
3	PIPR km 92+436.	93.00	104.00
4	PIV km 92+438.	93.00	80.00
5	PIP km 92+680. 0%*	116.00	PENDIENTE CONSTRUCCIÓN
6	Entronque Llano Crucero km 92+690. 82% *	31.00.	800.00
7	Muro de pilas km 92+700. 32% *	60.40	0.00

Descripción		Longitud de estructuras (m)	Longitud de accesos (m)
8	Entronque Llano Laguna km 98+200.	66.00	2,475.00
9	Entronque Cerro Pascle km 100+500.	37.00	626.00
10	PIP km 106+570.	31.60	53.00
11	PIP km 108+570.	32.60	80.00
12	PIV km 109+247.	30.80	80.00
13	PIV km 110+460.	40.80	80.00
14	Entronque Danigare km 111+600.	149.00	1,277.00

Descripción		Longitud de estructuras (m)	Longitud de accesos (m)
15	PIP km 112+270.	32.60	80.00
16	PIV km 114+766.	32.00	80.00
17	Entronque Agua Blanca Km 122+600.	32.00	1,193.00
18	Entronque Quiavicuzas Km 137+900.	157.00	944.00
19	Túnel El Tornillo km 139+400 (Colapsado). En inicio de construcción de un puente.	670.10	589.90
20	PIPG Km 146+840. 95% *	30.60	49.40
21	PIPG km159+400. 95% *	30.00	80.00
