


Michoacán

Uruapan-Nueva Italia

Avance físico

- Programado: 28.41 %
- Real: 25.69 %
- Semanal: 0.65 %
- Financiero: 19.10%

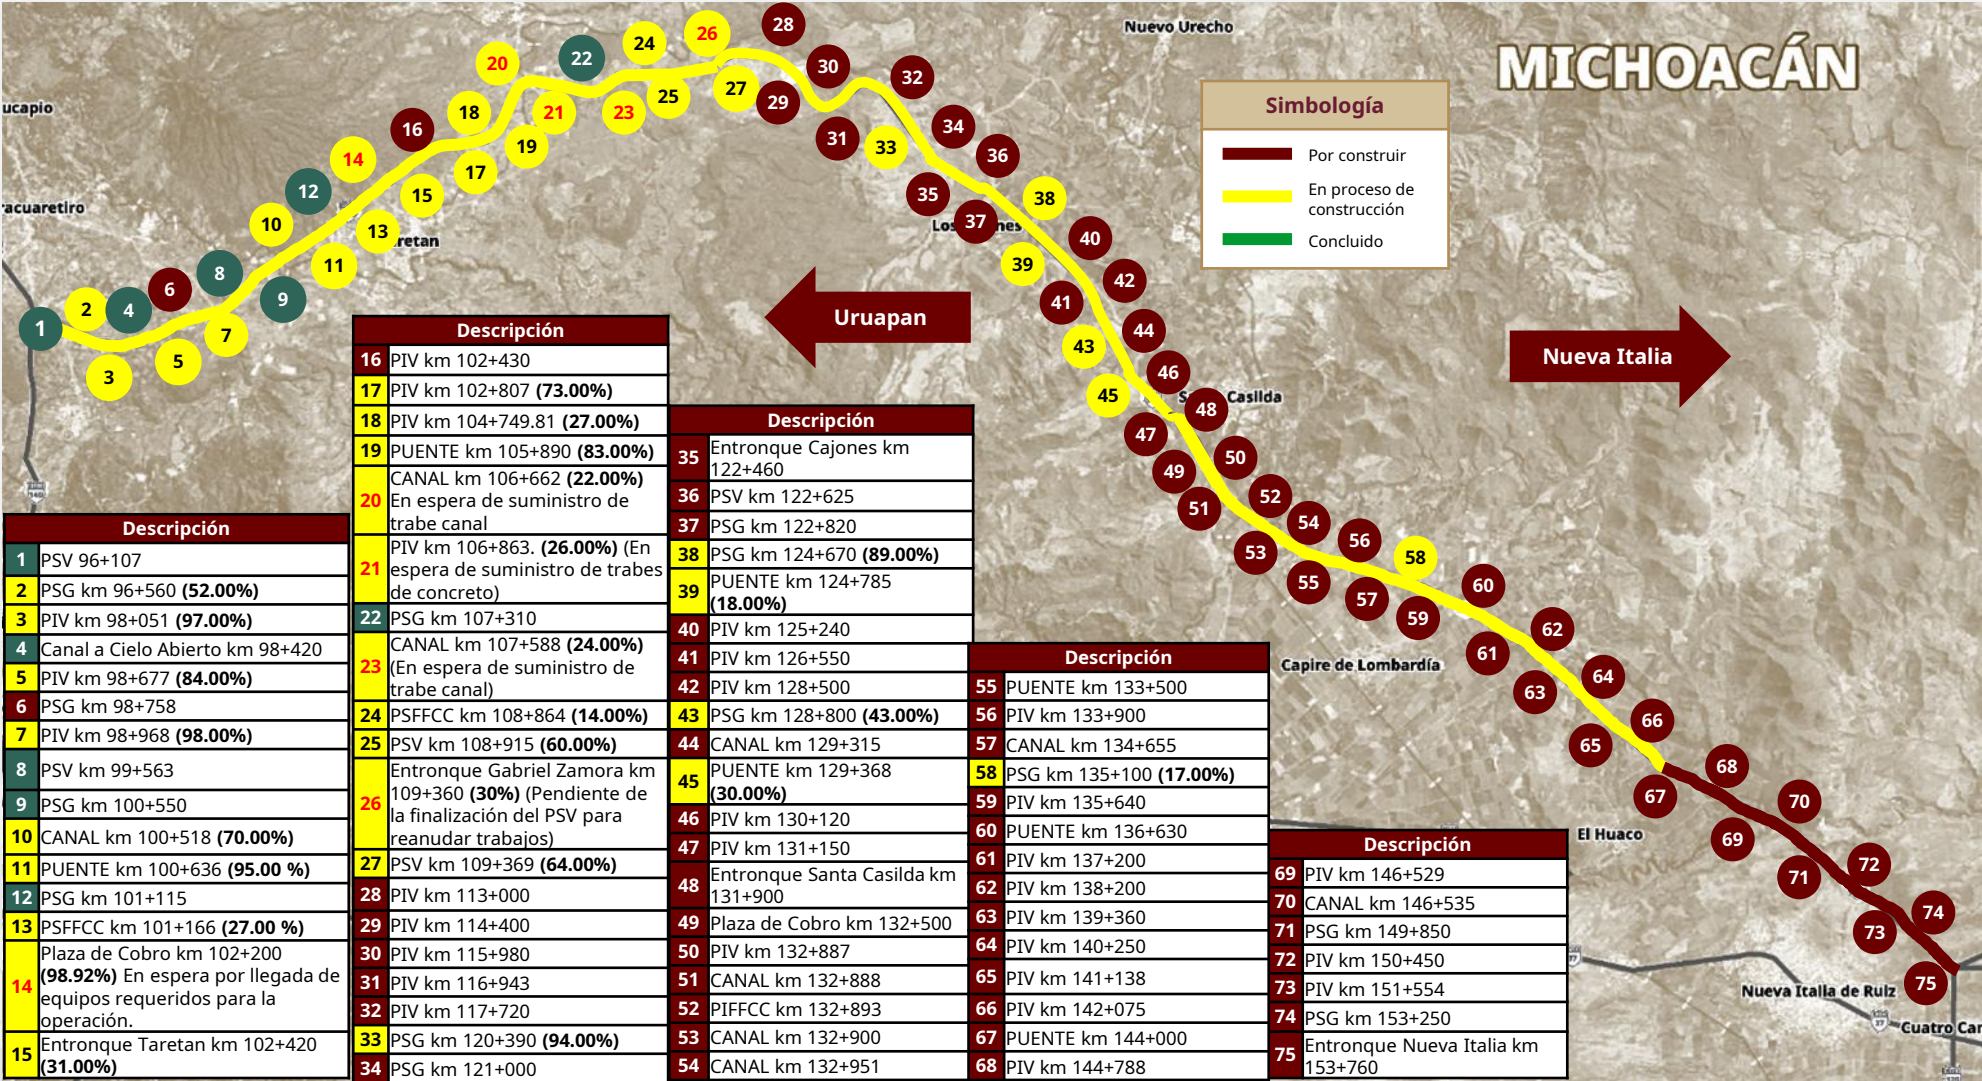


- Inversión: 7,049.9 mdp**
- Inicio:** noviembre de 2023
Término: agosto de 2027
- Meta: 67.09 km**
 - 65.00 km (troncal)
 - 2.09 km (estructuras)
- 2 Plazas de Cobro, 7 puentes, 5 Entronques, 60 cruces (5 PSV's, 30 PIV's, 13 PSG's, 1 PIFFCC, 2 PSFFCC, 9 trabes canales), 1 canal a cielo abierto (cien fuegos) y múltiples obras de drenaje.
- 21,147** empleos generados
- 7,049** empleos directos
- 14,098** empleos indirectos
- 1,800,000** habitantes beneficiados
- 25 minutos** de ahorro en tiempo
- Concesionaria :** PINFRA.

Michoacán

Uruapan-Nueva Italia

Avance: Programado, Físico y Financiero (%)

Elemento	Meta	Ejecutado acumulable	Faltante	11/06/2026 al 18/06/2026		Observaciones
				Programa do	Ejecutado	
Carpeta Asfáltica	65 km	11.60 km	53.40 km	.200 km	.200 km	
Base Asfáltica	65 km	13.80 km	51.20 km	.200 km	.200 km	
Base Hidráulica	65 km	16.60 km	48.40 km	.300 km	.300 km	
Subbase	65 km	18.40 km	46.60 km	.300 km	.300 km	
Subyacente	65 km	24.30 km	40.70 km	.400 km	.400 km	
PIV Km 98+051 Juntas de dilatación	1	0	1	1	1	Suministro y colocación de junta de dilatación en eje #3
PIV Km 98+968 Accesos	2	0	2	2	2	Suministro y colocación de defensa metálica de tres cretas
PSF Km 101+166 Subestructura	1	0	1	1	1	Habilitado de cimbra de madera previo a colado de cabezal #2.
Puente Km 105+890 Parapetos metálicos	2	0	2	1	1	Suministro y colocación de parapetos metálicos
PSF Km 108+864 Subestructura	4	0	4	4	4	Habilitado y colocación de acero de refuerzo en dados de cimentación cabezal #2.
PSV Km 109+369 Superestructura	7	0	7	7	7	Colado de diafragmas interiores

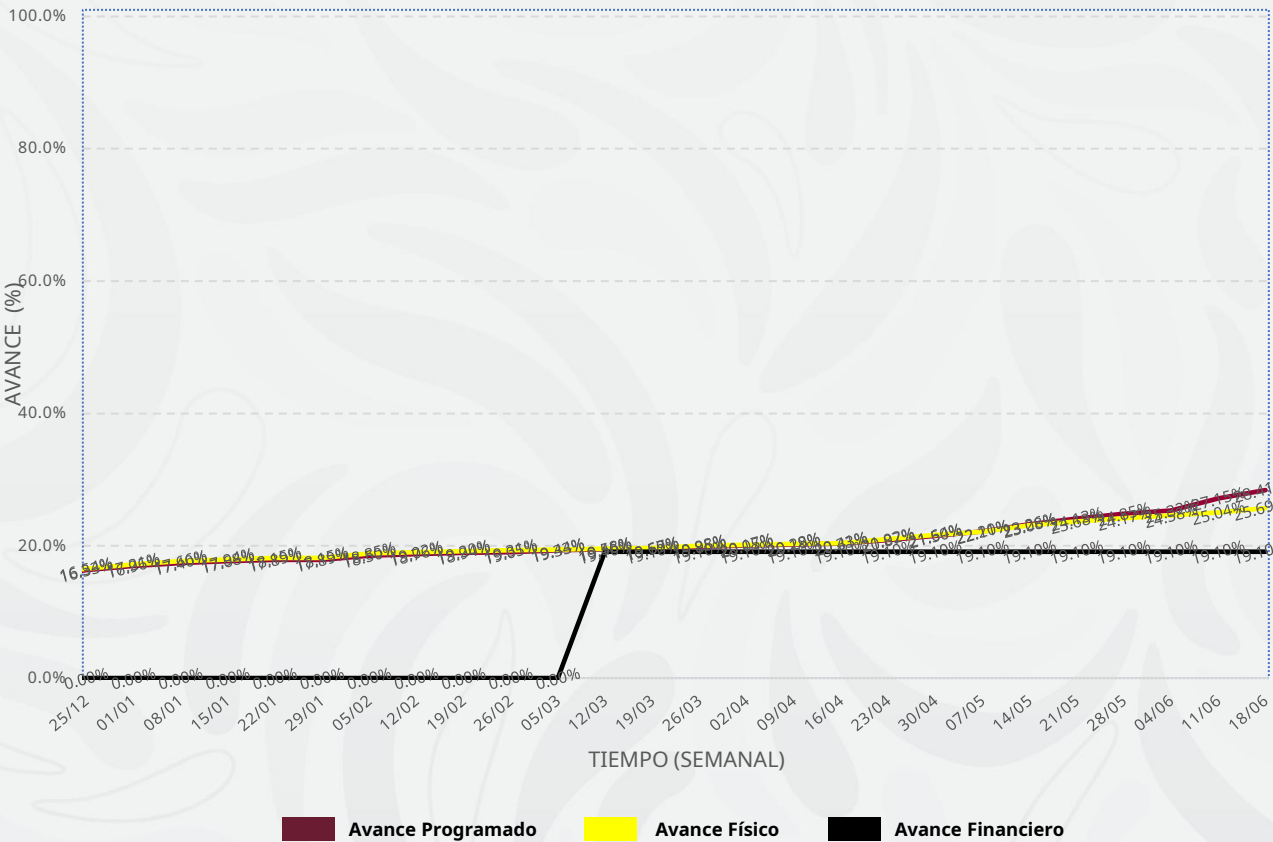

	Del 04 de junio al 11 de junio de 2026.	Del 11 de junio al 18 de junio de 2026.
Fuerza de Trabajo (personas)	805	805
Maquinaria	255	255
Frente de Trabajo	Troncal del km 95+000 al km 140+000, PIV km 98+051, PIV km 98+968, PSG km 100+550, PSG km 101+115, Entronque Taretan km 102+140, Puente km 105+890, PSG km 107+310, Entronque Gabriel Zamora km 109+360, PSV km 109+369, PSG km 120+390	Troncal del km 95+000 al km 140+000, PIV km 98+051, PIV km 98+968, PSG km 100+550, PSG km 101+115, Entronque Taretan km 102+140, Puente km 105+890, PSG km 107+310, Entronque Gabriel Zamora km 109+360, PSV km 109+369, PSG km 120+390, PSG km 124+670

Michoacán

Uruapan-Nueva Italia

Descripción		Longitud de estructuras (m)	Longitud de accesos (m)
1	PSV 96+107	32	142
2	PSG km 96+560 (52.00%)	6.75	60.3
3	PIV km 98+051 (97.00%)	30	120
4	Canal a Cielo Abierto km 98+420	N/A	N/A
5	PIV km 98+677 (84.00%)	29.60	123
6	PSG km 98+758	6.70	65
7	PIV km 98+968 (98.00%)	31.10	118
8	PSV km 99+563	31.90	136
9	PSG km 100+550	6.85	70
10	CANAL km 100+518 (70.00%)	31	22
11	PUENTE km 100+636 (95.00 %)	27.20	121
12	PSG km 101+115	6.65	68
13	PSFFCC km 101+166 (27.00 %)	31.40	124
14	Plaza de Cobro km 102+200 (98.92%) En espera por llegada de equipos requeridos para la operación.	N/A	N/A
15	Entronque Taretan km 102+420 (31.00%)	N/A	N/A

Descripción		Longitud de estructuras (m)	Longitud de accesos (m)
16	PIV km 102+430	31	132
17	PIV km 102+807 (73.00%)	28.60	139
18	PIV km 104+749.81 (27.00%)	30.20	145
19	PUENTE km 105+890 (83.00%)	72.40	124
20	CANAL km 106+662 (22.00%) En espera de suministro de trabe canal	30.70	28
21	PIV km 106+863. (26.00%) (En espera de suministro de trabes de concreto)	24.80	138
22	PSG km 107+310	6.70	70
23	CANAL km 107+588 (24.00%) (En espera de suministro de trabe canal)	34.70	18
24	PSFFCC km 108+864 (14.00%)	31.50	122
25	PSV km 108+915 (60.00%)	16.70	140
26	Entronque Gabriel Zamora km 109+360 (30%) (Pendiente de la finalización del PSV para reanudar trabajos)	N/A	N/A
27	PSV km 109+369 (64.00%)	16.70	148
28	PIV km 113+000	31	140
29	PIV km 114+400	28.90	137
30	PIV km 115+980	22.70	140
31	PIV km 116+943	28.50	132
32	PIV km 117+720	26.90	132
33	PSG km 120+390 (94.00%)	6.80	54
34	PSG km 121+000	6.70	56

Michoacán

Uruapan-Nueva Italia

Descripción		Longitud de estructuras (m)	Longitud de accesos (m)
35	Entronque Cajones km 122+460	N/A	N/A
36	PSV km 122+625	23.70	132
37	PSG km 122+820	6.80	58
38	PSG km 124+670 (89.00%)	6.75	52
39	PUENTE km 124+785 (18.00%)	75.50	128
40	PIV km 125+240	41	141
41	PIV km 126+550	22.90	138
42	PIV km 128+500	42.40	143
43	PSG km 128+800 (43.00%)	6.70	50
44	CANAL km 129+315	27.90	18
45	PUENTE km 129+368 (30.00%)	18.90	136
46	PIV km 130+120	22.90	130
47	PIV km 131+150	25.80	130
48	Entronque Santa Casilda km 131+900	N/A	N/A
49	Plaza de Cobro km 132+500	N/A	N/A
50	PIV km 132+887	28.80	132
51	CANAL km 132+888	28.90	20
52	PIFFCC km 132+893	31.10	125
53	CANAL km 132+900	28.77	17
54	CANAL km 132+951	28.85	22

Descripción		Longitud de estructuras (m)	Longitud de accesos (m)
55	PUENTE km 133+500	232.60	146
56	PIV km 133+900	31	140
57	CANAL km 134+655	33.10	22
58	PSG km 135+100 (17.00%)	6.82	60
59	PIV km 135+640	31	138
60	PUENTE km 136+630	10	142
61	PIV km 137+200	31.50	136
62	PIV km 138+200	31	140
63	PIV km 139+360	24.70	137
64	PIV km 140+250	22.70	142
65	PIV km 141+138	22.70	135
66	PIV km 142+075	31.20	130
67	PUENTE km 144+000	212.80	145
68	PIV km 144+788	24.80	138

Descripción		Longitud de estructuras (m)	Longitud de accesos (m)
69	PIV km 146+529	25.30	140
70	CANAL km 146+535	26.20	16
71	PSG km 149+850	6.75	62
72	PIV km 150+450	31	137
73	PIV km 151+554	31	141
74	PSG km 153+250	6.80	55
75	Entronque Nueva Italia km 153+760	N/A	N/A
