

Tramo Armería-Manzanillo



Avance físico • Programado: 100.00% • Semanal: 0.41%
• Real: 41.59% • Financiero: 35.25%




	Descripción
1	Puente Armería I km 45+500 (87%) No se ejecutan trabajos por falta de personal y maquinaria.
2	Entronque Paraíso km 47+741 (100%)
3	PSFFCC Armería II km 50+100 (100%)
4	PSV Tilapia km 54+350 (100%)
5	Puente Palo Verde I km 55+950 (86%)
6	Puente Palo Verde II km 56+650 (75%)
7	PIV Ent. Salinero II km 59+500 (88%)
8	Entronque Salineros km 59+551 (27%) Sin trabajos programados
9	PSFFCC Salinero I km 60+500 (93%) Sin trabajos programados
10	Entronque Cuyutlán km 60+800 (A la espera de regularización de catálogo)
11	PIV Retorno en U km 77+600 (71%) Sin trabajos programados
12	Entronque Retorno en U km 77+600 (A la espera de regularización de catálogo)
13	PSFFCC Tepalcates I km 80+240 (52.5%)
14	Entronque Tepalcates I km 79+660 (A la espera de regularización de catálogo)
15	Puente Nuevo Tepalcates II km 81+581
16	Entronque Tepalcates II km 80+500
17	Entronque 83+500 km (42%) No se tiene Fuerza de Trabajo Suficiente
18	Puente Adjuntas km 86+420 (86%) Se tiene armado parcial de guarnición y parapetos, se trabajó en otras prioridades.
19	PSV Panteones km 87+760 (14%) Conciliación y ajuste de volúmenes.
20	Entronque Panteones km 87+760
21	PIV Minatitlán Lib. km 92+000 (4%) Se detuvieron trabajos por interferencia con instalaciones de CFE.
22	PIV Minatitlán Lib. II km 92+000 (63%) Se movió la fuerza de trabajo
23	Entronque Minatitlán km 92+731
24	PIV Minatitlán Lib I km 93+000 (16%) No hay trabajos por logística de perforación.
25	Puente Canal km 93+220 (54%) Se realizó cambio de tránsito a Cuerpo Derecho
26	Entronque Jalipa km 94+400 (24%) Se movió la fuerza de trabajo
27	Puente Jalipa km 94+158 (63%)
OS	PSV Obra social retorno en U 49+900 (96%)

Colima

Tramo Armería-Manzanillo

Elemento	Intervención	Ejecutado acumulado	Faltante	06/03/26 al 12/03/26		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
Volúmenes de Obra en Troncal						
Cortes (m³)	210,113	286,107	0	0	3,125	El programa origen para los trabajos que se ejecutan en la troncal llegó a su fin. Se está solicitando a la concesionaria entregue la reprogramación de los trabajos para concluir dentro del plazo establecido
Terraplenes (m³)	813,909	563,469	250,440	0	1,200	
Base y sub base (m³)	260,119	184,848	75,271	0	1,510	

NOTA: Los precios y avances mostrados en este reporte son con respecto a los catálogos y contrato vigente. El volumen programado proviene de un programa provisional. Se está trabajando en un nuevo programa.

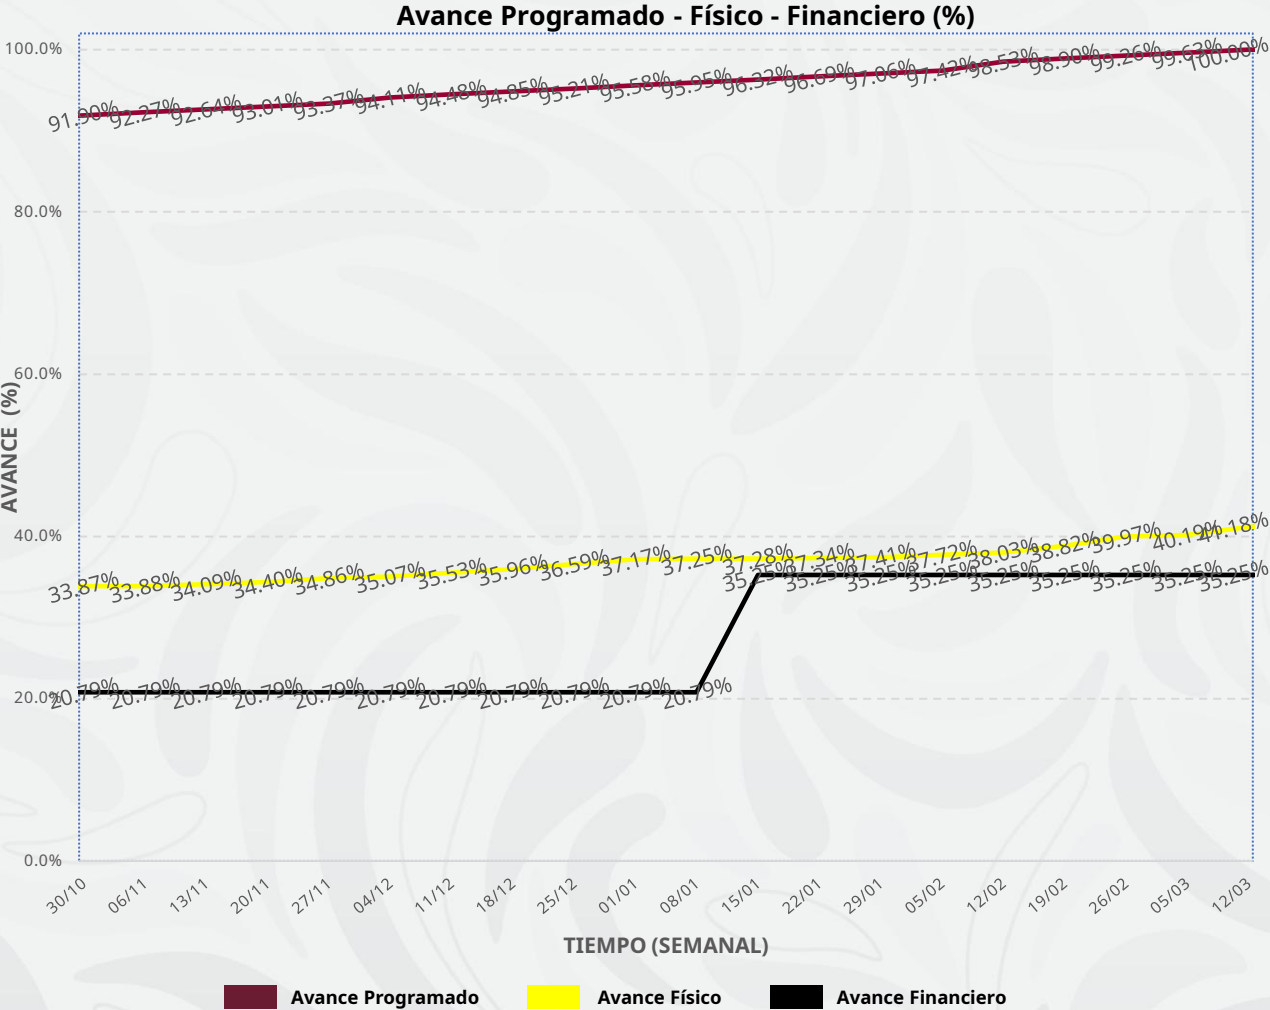

	27 de febrero al 05 de marzo	06 de marzo al 12 de marzo
Fuerza de Trabajo (personas)	83	80
Maquinaria	43	49
Frente de trabajo	Del Km 49+680 al Km 49+850 Del Km 56+140 al Km 58+765 Del Km 77+000 al Km 76+050 Del Km 92+440 al Km 92+620	Del Km 55+960 al Km 57+880 Del km 72+060 al Km 73+750 Del Km 94+000 al Km 94+220
