

Veracruz Autopista Cardel - Poza Rica

Laguna Verde-La Mancha



Descripción	
1	Entronque Laguna Verde II Km 0+000
2	PSMA 1.5 Km 1+555.5
3	PSMA 2.7 Km 2+703.91
4	PIV 3.05 Km 3+041
5	Entronque Laguna Verde I Km 3+041
6	PSMA 3.9 Km 3+900
7	PSMA 6.0 Km 6+080 (95.00%)
8	PIV 6.8 Km 6+806 (57.00%)
9	PIV 7.04 Km 7+040 (5.00%) Se continua con la evaluación de la reubicación de la estructura.
10	PUENTE 7.3 Km 7+330
11	PUENTE 7.8 Km 7+815, (54.00%) Pendiente montaje de traves en claro 1.
12	PLAZA DE COBRO Km 8+300, (16.00%) El proyecto ejecutivo está en revisión en la DGDC.
13	PUENTE 8.7 Km 8+665, (65.00%)
14	PSMA 8.9 Km 8+960, (100.00%)
15	PUENTE 14 Km 14+000
16	PUENTE 14.7 Km 14+700
17	PSV Km 14+900
18	PSMA 15.3 Km 15+370
19	PSV 16.8 Km 16+800
20	ENTRONQUE LA MANCHA Km 19+841

Simbología	
	Por construir
	En proceso de construcción
	Concluido

Avance físico

Programado: 67.05%

Real: 26.38% Incluye Ent. Chapachapa

Financiero: 15.64%

Semanal: 0.26%

Inversión: 2,252.78 mdp

Inicio: Marzo de 2025

Término: Agosto de 2026

Meta: 19.84 km, 5 Puentes, 1 Plaza de Cobro, 3 Entronques, 2 PSVs, 3 PIVs, 6 PSMAs, 59 ODTs y el Entronque Chapachapa

2,252.78 (1)=2,253 empleos directos generados/millón de inversión

2,252.78 (2)= 4,506 empleos indirectos generados/millón de inversión

128,000 habitantes beneficiados

45 minutos de ahorro en tiempo, Tramo 4

Veracruz Autopista Cardel - Poza Rica

Laguna Verde-La Mancha

Concesionaria: IDEAL
Constructora: MOTA-ENGIL, S.A. de C.V.



Simbología	
	Por construir
	En proceso de construcción
	Concluido

Descripción	
1	Entronque Chapachapa Km 739+733 (Km op. 92+512) (100.00%)
2	ODT 92+827.25 (100.00%)
3	PSPyG 92+832.22 (100.00%)
4	Ampliación de ODT 100+102, (100.00%)


Avance físico

- Real: 100.00%
- Programado: 100.00%
- Financiero: 75.01%
- Semanal: 0.00%

Veracruz Autopista Cardel - Poza Rica

Laguna Verde-La Mancha

Elemento	Intervención	Ejecutado acumulado	Faltante	05/03/26 al 12/03/26		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
Tramo 4 Laguna Verde - La Mancha						
Volumenes de obra						
Corte	1,414,039.20	164,461.08	1,249,578.12	27,193.00	3,958.82	El volumen programado corresponde a los 19.8 km y solo se trabaja en 7.4 km.
Terraplén	1,155,915.50	178,908.15	977,007.35	20,641.00	4,240.57	El volumen programado corresponde a los 19.8 km y solo se trabaja en 6.5 km.
Subyacente	162,462.20	54,723.70	107,738.50	27,077.03	2,687.33	El volumen programado corresponde a los 19.8 km y solo se trabaja en 6.7 km.
Geotextil	265,880.00	126,918.48	138,961.52	26,588.00	6,425.35	El volumen programado corresponde a los 19.8 km y solo se trabaja en 6.7 km.
Estructuras Laguna Verde - La Mancha						
Zapata	4	2	2	0	0	PIV 6.8 Km 6+806 Estribo 01 en espera de reajuste de zapata.
Muros	2	2	0	0	0	Se realizó el montaje de 4 trabes AASHTO tipo IV PIV 6.8 Km 6+806
Aleros	4	4	0	0	2	Se realizó el colado de aleros 1 y 2 tercer trepado estribo 02 PIV 6.8 Km 6+806
Losa superior	1	1	0	0	1	PSMA 6.0 KM 6+082. Pendiente ultimo trepado de aleros
Muros	2	2	0	2	2	PSMA 6.0 KM 6+082. se realizaron los trabajos de colado de muros segundo trepado.
Aleros	4	0	4	2	0	PSMA 6.0 KM 6+082 se realizan trabajos de armado de acero de refuerzo.

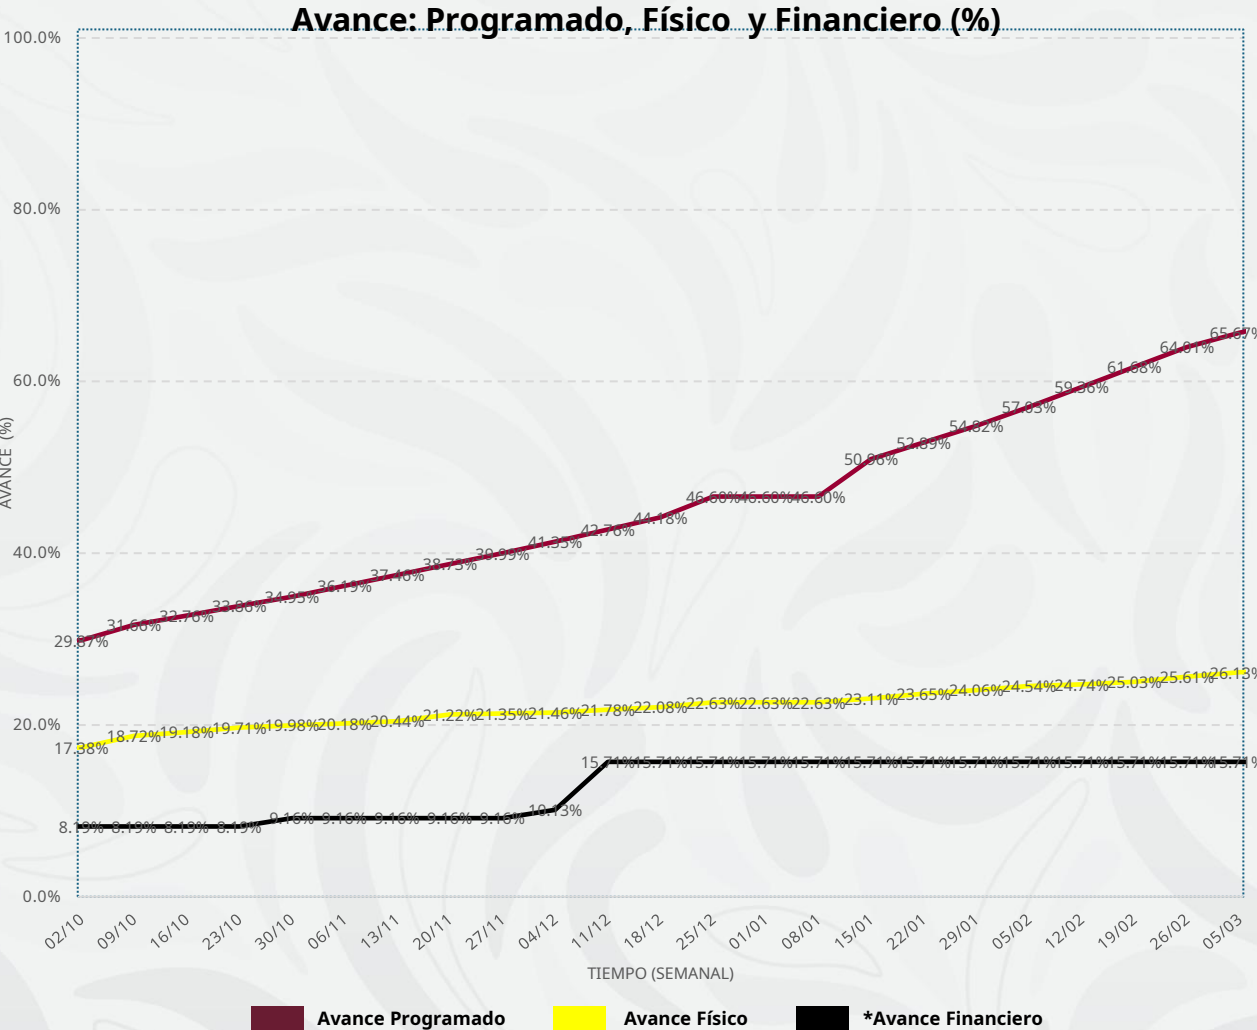

	20 de febrero al 26 de febrero	27 de febrero al 05 de marzo	06 de marzo al 12 de marzo
Fuerza de Trabajo (personas)	154	142	146
Maquinaria	21	17	17
