

Oaxaca

Mitla-Entronque Tehuantepec II

Avance físico Global:

• Programado: 100%

• Semanal: 0.00%

• Real: 99.14%

Avance físico Tramo 2:

• Real: 97.42%

Avance financiero

• Real pagado: 88.56%

• Con deuda: 97.42%

• Nota: De este porcentaje se tiene una deuda de 2,635.1 mdp incluye IVA, por trabajos ejecutados.



Descripción		Descripción		Descripción	
1	PIV km 87+900. 40% *	8	Entronque Llano Laguna km 98+200. 100%	15	PIV km 112+270. 100%
2	PIV km 91+530. 100%	9	Entronque Cerro Pascale km 100+500. 100%	16	PIV km 114+766. 100%
3	PIPR km 92+436. 100%	10	PIV km 106+570. 100%	17	Entronque Agua Blanca Km 122+600. 100%
4	PIV km 92+438. 100%	11	PIV km 108+570. 100%	18	Entronque Quiavicuzas Km 137+900. 100%
5	PIV km 92+680. 0% *	12	PIV km 109+247. 100%	19	Túnel El Tornillo km 139+400 (Colapsado). En elaboración proyecto del puente.
6	Entronque Llano Crucero km 92+690. 82% *	13	PIV km 110+460. 100%	20	PIPG Km 146+840. 95% *
7	Muro de pilas km 92+700. 32% *	14	Entronque Danigare km 111+600. 100%	21	PIPG km159+400. 95% *

* No hay avances debido a la falta de asignación de recursos



Inversión: 29,749.2 mdp incluye I.V.A sin incluir reclamos



Término: Inaugurada y puesta en operación 24 de enero de 2025 (pendiente obras complementarias)



Meta:169.23 km; el cual son 159.29 km de Troncal, 6.54 km de puentes, 1.78 km de viaductos y 1.62 km de túneles.



65 puentes, 14 viaductos, 10 túneles, 20 entronques, 2 casetas y 17 pasos de servidumbre.



En proceso: Trabajos en la troncal, 1 entronque y 8 pasos de servidumbre



Nota: De los pasos de servidumbre 9 están terminados, 2 con un 95%, 1 al 40% y 5 sin iniciar



El Túnel Tornillo se encuentra colapsado y en proceso proyecto del puente



10 Empleos directos generados



30 Empleos indirectos generados



+1 millón 400 mil habitantes beneficiados



2 hrs. de ahorro en tiempo



Concesionaria: Autovía Mitla Tehuantepec, S.A. de C.V. (IDEAL)

Oaxaca

Mitla-Entronque Tehuantepec II


Elemento	Intervención	Ejecutado o acumulado	Faltante	06/03/26 al 12/03/26		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
Muro de pilas km 92+700						
Perforación de pilastrones	38	17	21	0	0	• Trabajos suspendidos por falta de asignación de recursos.
Armado y colado de pilastrones	38	17	21	0	0	

❖ Nota: A partir de esta fecha, ya no existirán avances debido a la considerable deuda que se tiene con las empresas contratadas por la concesionaria a la fecha y la falta de recursos presupuestales.

Maquinaria:

- Excavadora (1) inactivo

Avance: Programado, Físico y Financiero (%) Mitla - Tehuantepec

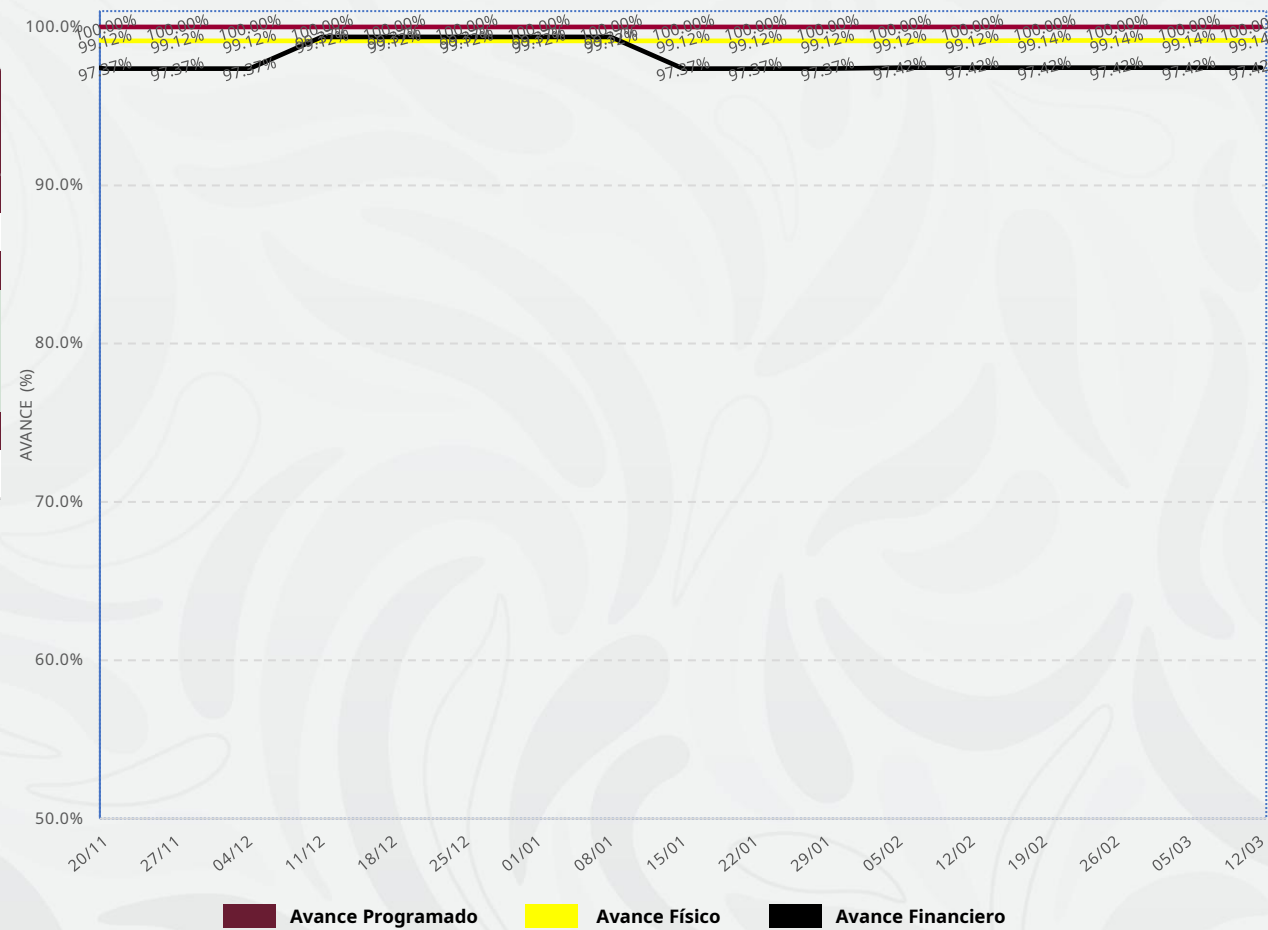

	27 de febrero al 05 de marzo de 2026	06 de marzo al 12 de marzo de 2026
Fuerza de Trabajo (personas)	10	10
Maquinaria	0	0
Frente de Trabajo	No Aplica	No Aplica
