

Michoacán

Tramo Pátzcuaro-Uruapan

Avance físico

• Programado: 100.00%

• Real: 99.93%

• Semanal: 0.02 %

• Financiero: 88.46%



Descripción	
1	Entronque Zirimicuaro km 93+500
2	Trabe Canal km 92+210
3	Entronque Caracha km 92+100,
4	PIFFCC Caracha km 91+754, (99.65%).
5	Puente Canintzio km 88+283
6	PIV km 88+054,

Descripción	
7	Entronque San Ángel km 87+400
8	Rampa de emergencia II km 86+500
9	Rampa de emergencia I km 84+100
10	Entronque Jucato km 79+489
11	PIFFCC Zirahuén km 73+584, (99.60%)
12	Viaducto Zirahuén km 70+278
13	Entronque Zirahuén km 68+600

Descripción	
14	Caseta de cobro remota Zirahuén 68+600
15	Plaza de cobro Zirahuén km 60+500
16	Entronque Pátzcuaro II km 53+600
17	Entronque Pátzcuaro I km 47+500
18	Entronque las trojas km 47+000

 **Inversión:** 1,792 mdp

 **Inicio:** Julio 2017
 **Término:** Febrero 21, 2026

 **Meta: 48.47 km**
46.79.00 km (tronal)
1.68 km (estructuras)
58 Totales (1 plaza de cobro, 1 puente, 1 viaducto, 8 entronques, 45 cruces, 2 rampas de frenado).

 **5,376 Empleos generados**
1,792 empleos directos
3,584 empleos indirectos

 **200 mil habitantes beneficiados**


 **25 minutos de ahorro en tiempo.**

Concesionaria : PINFRA.

Michoacán

Tramo Pátzcuaro-Uruapan

Avance Programado - Físico - Financiero (%)

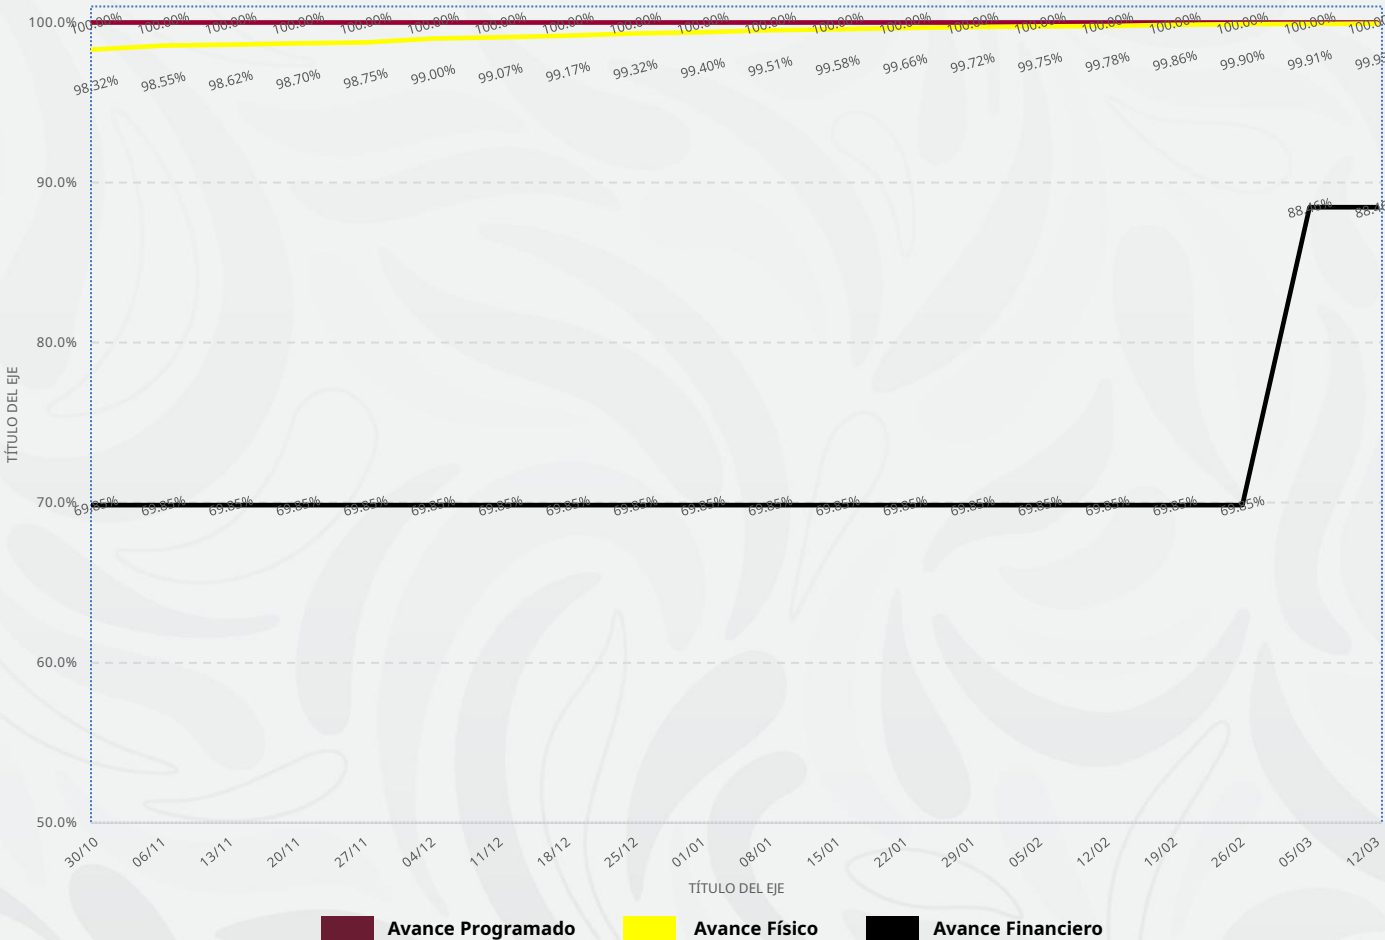

Elemento	Meta	Ejecutado acumulado	Faltante	05/03/2026 al 12/03/2026		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
Troncal						
PIFCC km 73+584. Obra complementario	1	0	1	1	1	Suministro y colocación de parapeto metálico sobre superestructura cuerpo A
PIFCC km 91+754 Obra complementario	1	0	1	1	1	Trabajos para el retiro de calzas temporales de madera y posterior recargue de balasto en vías férreas.

	Del 26 de febrero al 05 de marzo de 2026	Del 05 de marzo al 12 de marzo de 2026
Fuerza de Trabajo (personas)	80	80
Maquinaria	9	9
Frente de Trabajo	PIFFCC km 91+754 y PIFFCC km 73+584	PIFFCC km 91+754 y PIFFCC km 73+584
