


Nayarit

Tramo Tepic-Compostela

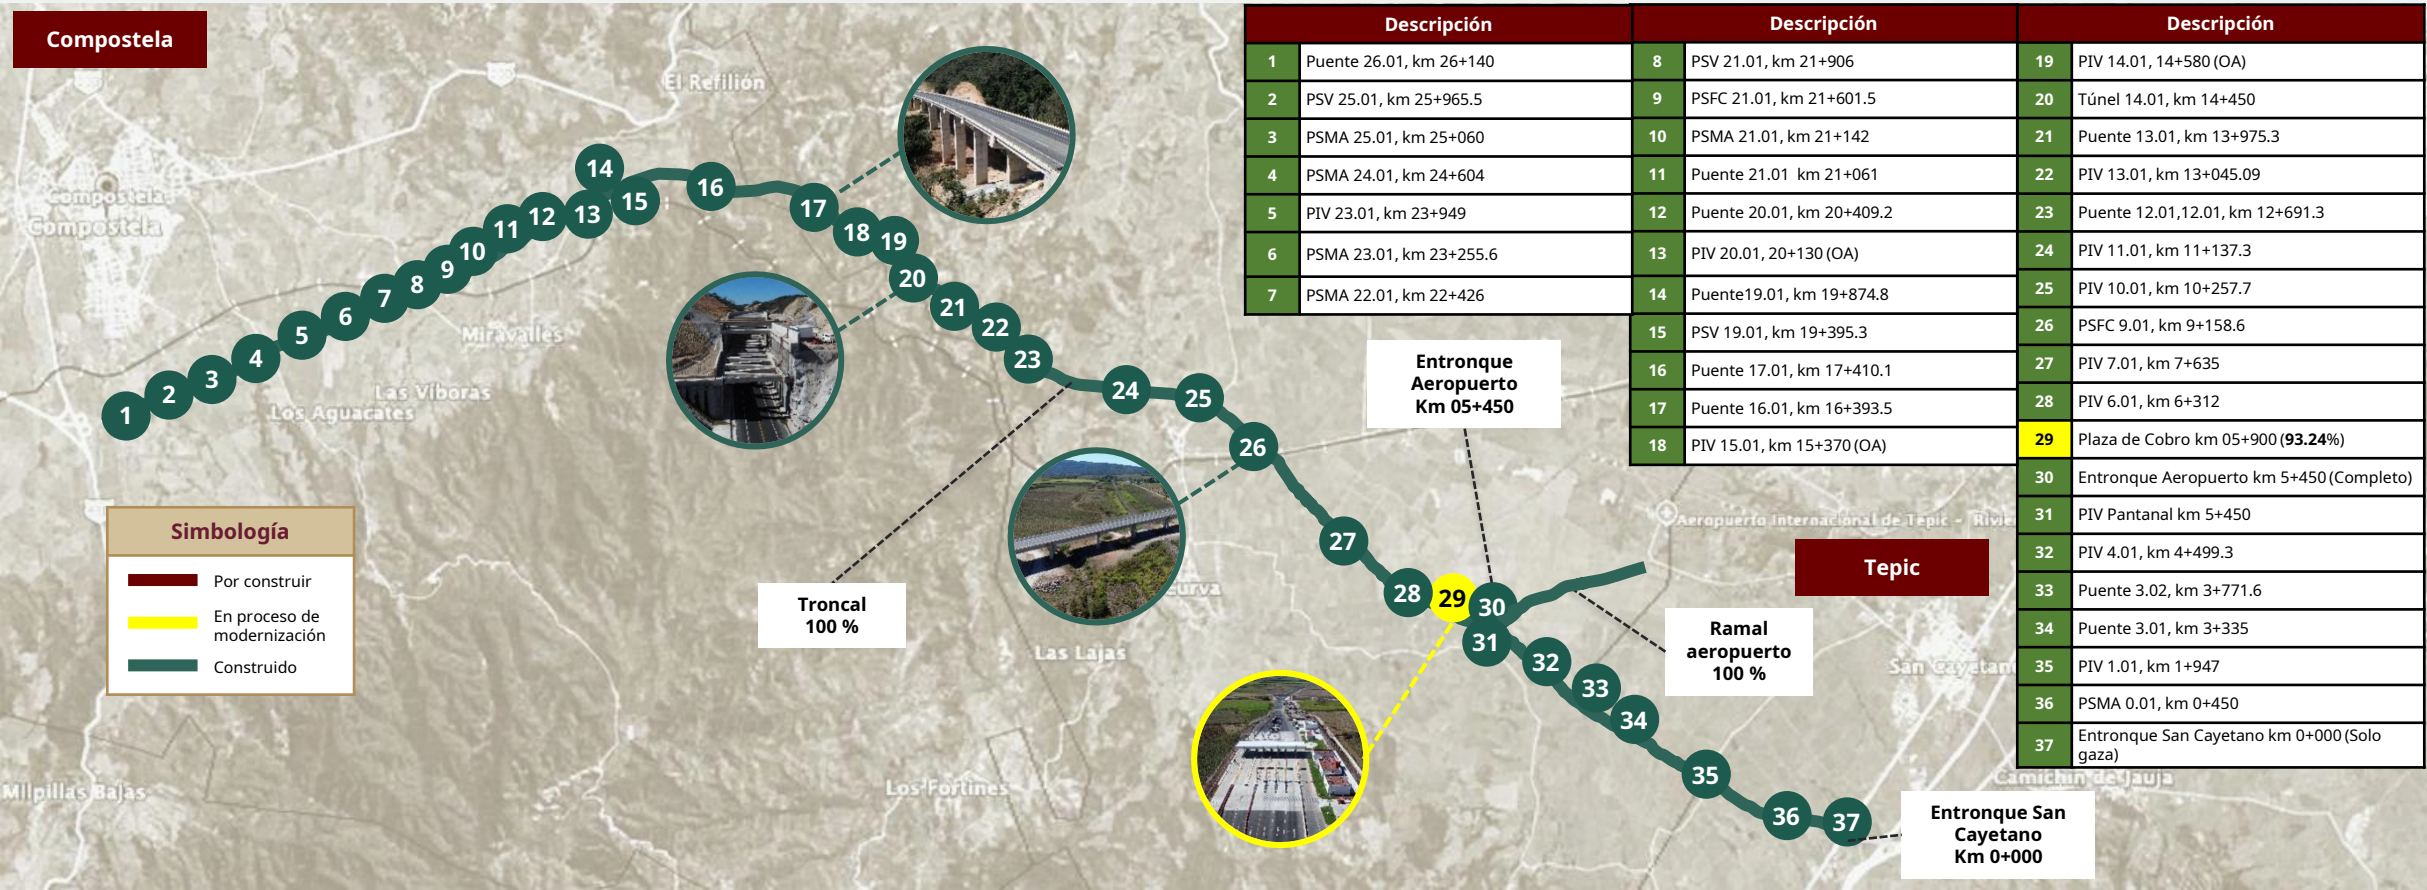

Concesionaria: FONADIN

Avance físico

- Programado: 100 %
- Real: 99.9977 %
- Financiero: 96.70 %
- Semanal: 0.0004 %



Inversión: 2,473.43 mdp (solo troncal y estructuras, no considera Ramal Aeropuerto*)



Meta: 30.17 km. (26 km en troncal y 4.17 en estructuras)
1 Túnel Falso, 1 Plaza de cobro, 10 Puentes, 2 PSFC, 1 Entronque (solo gaza) y 1 Entronque completo (Aeropuerto) y 21 Cruces (no considera Ramal Aeropuerto*) y múltiples obras de drenaje.

* Una vez que se cuente con el monto del Ramal Aeropuerto se actualizará la Inversión y Meta.



Inicio: Marzo 2023
Término: Septiembre 2025



2,473 empleos directos generados P/MDI
4,946 empleos indirectos generados P/MDI



490 mil habitantes beneficiados




35 minutos de ahorro en tiempo

Nayarit

Tramo Tepic-Compostela

Avance: Programado, Físico y Financiero (%) Tepic- Compostela

Elemento	Meta	Ejecutado acumulable	Faltante	06/03/26 al 12/03/2026		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
Terraplén (m3)	2,095,966.26	2,095,954.62	11.64			
Subyacente (m³)	290,689.00	281,764.49	8,924.51			
Puente 16.01 km 16+393.50						
Columnas	8	8	0			Trabajos concluidos.
Cortes (m³) Estabilización de taludes	2,443,497.56	2,423,372.63	20,124.93			
Obras de drenaje	77	77	0			Trabajos concluidos.
P.S.F.C. 9.01 km 09+158.50						
Losa (claro)	7	7	0			Trabajos concluidos.
P.S.F.C. 21.01 km 21+601.50						
Junta de dilatación (pza)	2	2	0			

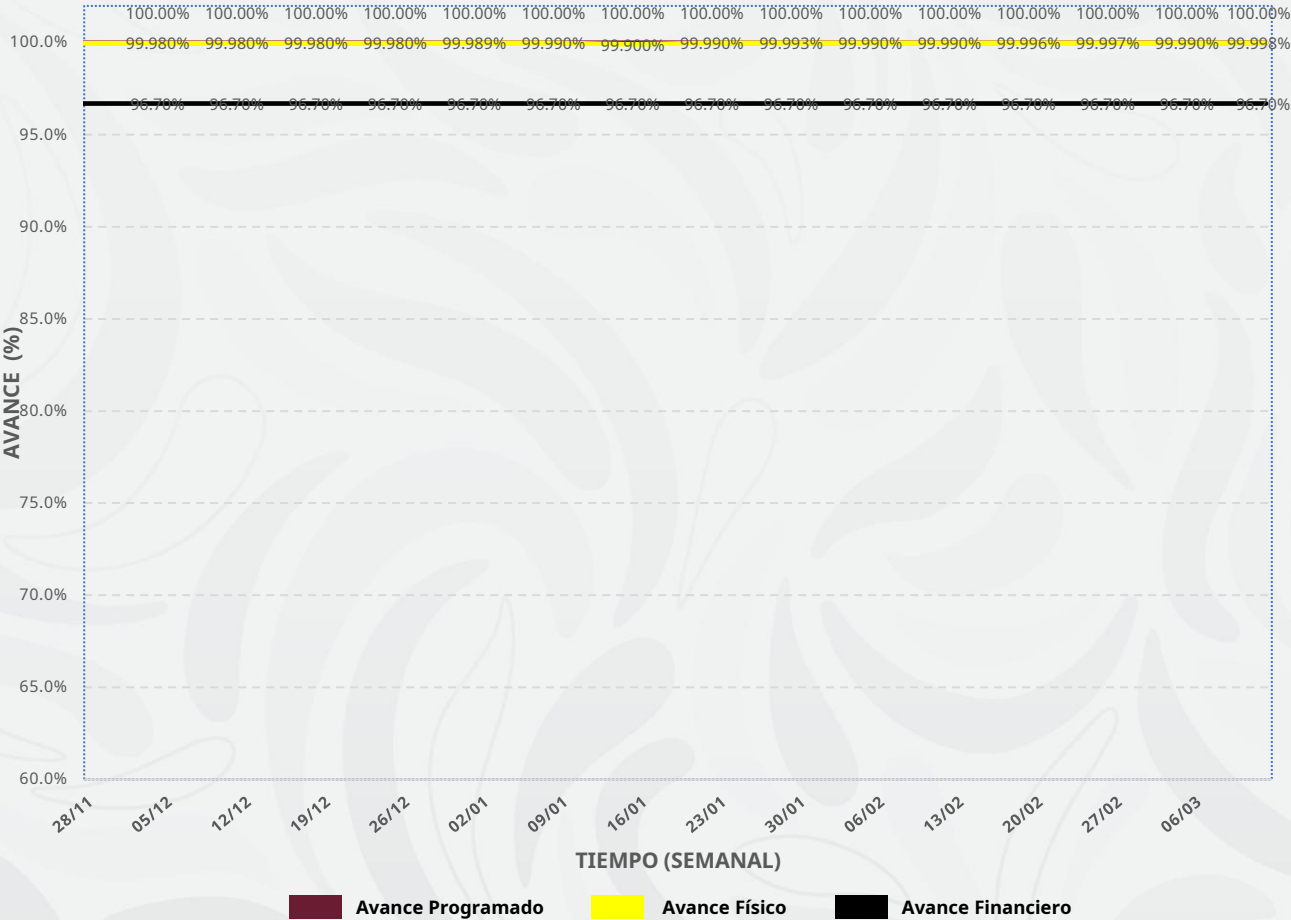

	27 de febrero al 05 de marzo	06 de marzo al 12 de marzo
Fuerza de Trabajo (personas)	200	120
Maquinaria	45	15
Frente de Trabajo	Ramal Aeropuerto, Plaza de Cobro km 05+900	Ramal Aeropuerto, Plaza de Cobro km 05+900
