


# Michoacán

## Modernización Carretera Zitácuaro-Maravatío

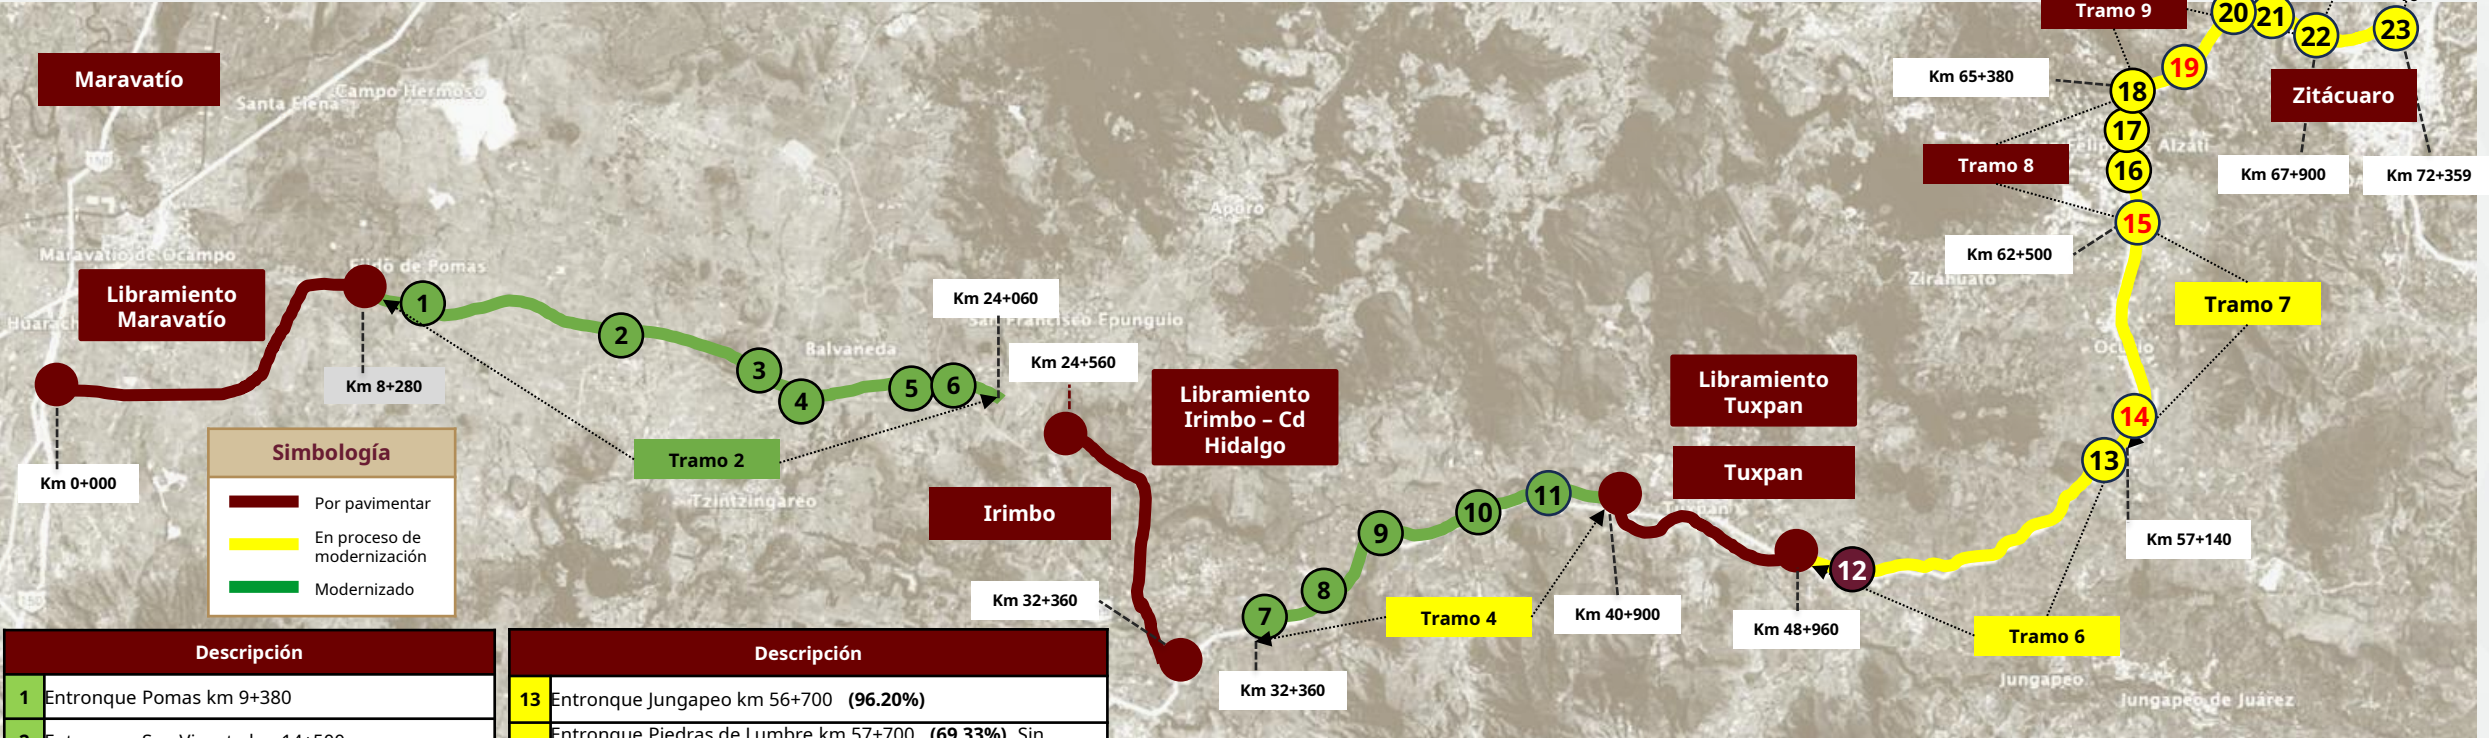

| Descripción |                                              |
|-------------|----------------------------------------------|
| 1           | Entronque Pomas km 9+380                     |
| 2           | Entronque San Vicente km 14+500              |
| 3           | PIP km 18+370                                |
| 4           | Entronque Zinzingareo km 18+700              |
| 5           | Entronque Senguio km 21+280                  |
| 6           | PIP km 22+280                                |
| 7           | Entronque Santa Rosa km 32+420               |
| 8           | Entronque Ziranda-Jaripeo km 33+500          |
| 9           | Puente Turundeo Km 36+460 (100.00%),         |
| 10          | Entronque Turundeo I km 37+550 (100.00%),    |
| 11          | Entronque Turundeo II km 38+780 (100.00%),   |
| 12          | Puente Obispo Km 50+400 (0.00%), Sin Iniciar |

| Descripción |                                                                                                                                 |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13          | Entronque Jungapeo km 56+700 (96.20%)                                                                                           |
| 14          | Entronque Piedras de Lumbre km 57+700 (69.33%), Sin actividad, pendiente suministro de base hidráulica en ampliación de corona. |
| 15          | Entronque Zirahuato km 62+500 (62.01%), Pendiente tendido de base asfáltica en ampliaciones de corona                           |
| 16          | Entronque San Felipe I km 64+400 (32.77%)                                                                                       |
| 17          | Entronque San Felipe II Km 64+640 (32.77%)                                                                                      |
| 18          | Entronque Macutzio km 65+620 (24.60%)                                                                                           |
| 19          | Entronque Valle Verde km 67+220 (71.96%), Falta tendido de carpeta asfáltica.                                                   |
| 20          | Entronque Curungueo I Km 68+240 (75.01%)                                                                                        |
| 21          | Entronque Curungueo II Km 68+780 (75.01%)                                                                                       |
| 22          | Puente San Juan Viejo Km 69+860 (96.49%)                                                                                        |
| 23          | PSV Zitácuaro Km 72+160 (95.49%)                                                                                                |

- Avance físico
- Programado: 59.92% (Reprogramación T8)
  - Real: 62.54%
  - Semanal: 0.37%
  - Financiero: 17.56%

**Nota 1:**  
Los avances se calculan en relación a la Inversión total del Ramal

**Nota 2:**  
Las Estructuras en proceso remarcadas en color rojo, no presentan avance en el periodo semanal, o no han iniciado.



**Inversión:** \$4,575.3 mdp (total Ramal)  
\$3,048.81 mdp (modernización)  
\$1,526.49 mdp (Libramientos)



4,800 empleos generados



**Meta:** 71.3 Km



126,000 habitantes beneficiados



**Inicio:** septiembre 2020  
**Reinicio:** 27 de enero de 2024  
**Término:** 31 de diciembre de 2026



Ahorro en tiempo: 25 min

**Concesionaria:** Red de carreteras de occidente

# Michoacán


## Modernización Carretera Zitácuaro-Maravatío

| TERRACERIAS     |            |            |            |                         |           |               |
|-----------------|------------|------------|------------|-------------------------|-----------|---------------|
| Concepto        | Total      | Ejecutado  | Faltante   | Del 06 mar al 12 mar 26 |           | Observaciones |
|                 |            |            |            | Programado              | Ejecutado |               |
| Cortes (m3)     | 705,558.00 | 764,620.40 | -59,062.40 | 0.00                    | 2,543.46  |               |
| Terraplén (m3)  | 445,687.00 | 437,493.54 | 8,193.46   | 1,489.73                | 3,570.84  |               |
| Subyacente (m3) | 256,097.00 | 264,390.49 | -8,293.49  | 720.46                  | 1,636.18  |               |
| Subrasante (m3) | 170,688.00 | 171,584.35 | -896.35    | 0.00                    | 1,022.41  |               |

| PAVIMENTOS             |            |            |           |                         |           |                                                      |
|------------------------|------------|------------|-----------|-------------------------|-----------|------------------------------------------------------|
| Concepto               | Total      | Ejecutado  | Faltante  | Del 06 mar al 12 mar 26 |           | Observaciones                                        |
|                        |            |            |           | Programado              | Ejecutado |                                                      |
| Base Hidráulica (m3)   | 125,659.04 | 121,340.31 | 4,318.73  | 704.35                  | 863.35    |                                                      |
| Bacheo (m3)            | 1,800.00   | 1,817.25   | -17.25    | 60.00                   | 4.50      | SE ESTÁN TRABAJANDO TRAMOS AISLADOS EN TRAMOS 6 Y 7. |
| Fresado (m3)           | 10,676.00  | 10,724.98  | -48.98    | 23.54                   | 20.37     |                                                      |
| Rayado Carpeta (Ha)    | 30.24      | 29.22      | 1.02      | 0.16                    | 0.05      | EN PROCESO TRAMO 6                                   |
| Base Asfáltica (m3)    | 120,414.05 | 119,996.48 | 417.57    | 916.55                  | 495.44    | SE ESTÁN TRABAJANDO TRAMOS AISLADOS EN TRAMOS 6      |
| Carpeta Asfáltica (m3) | 45,247.80  | 30,635.84  | 14,611.96 | 124.21                  | 408.28    |                                                      |

| ESTRUCTURAS        |              |              |             |                         |           |                                                                     |
|--------------------|--------------|--------------|-------------|-------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------|
| Concepto           | Total        | Ejecutado    | Faltante    | Del 06 mar al 12 mar 26 |           | Observaciones                                                       |
|                    |              |              |             | Programado              | Ejecutado |                                                                     |
| PIV JUNGAPEO       | 1.00         | 1.0088       | 0.0000      | 0.0000                  | 0.0002    | CONFORMACIÓN DE SUBRASANTE Y ESTABILIZACIÓN DE TALUD EN GASA SALIDA |
| PSV SAN FELIPE     | 1.00         | 0.4777       | 0.5223      | 0.0699                  | 0.0318    | CONFORMACIÓN DE TERRACERÍAS                                         |
| PSV SAN JUAN VIEJO | 1.00         | 0.9649       | 0.0351      | 0.0024                  | 0.0011    | APROCHE DE CABEZALES                                                |
| PSV ZITÁCUARO      | 1.00         | 0.9549       | 0.0451      | 0.0654                  | 0.0007    | COLOCACION DE DEFENSA METÁLICA                                      |
| DEFENSA METÁLICA   | 35,327.00 ml | 30,375.42 ml | 4,951.58 ml | 426.23 ml               | 496.50 ml | CONTINÚA LA COLOCACIÓN EN TRAMO 4 Y 10                              |

Avance Programado - Físico - Financiero (%)

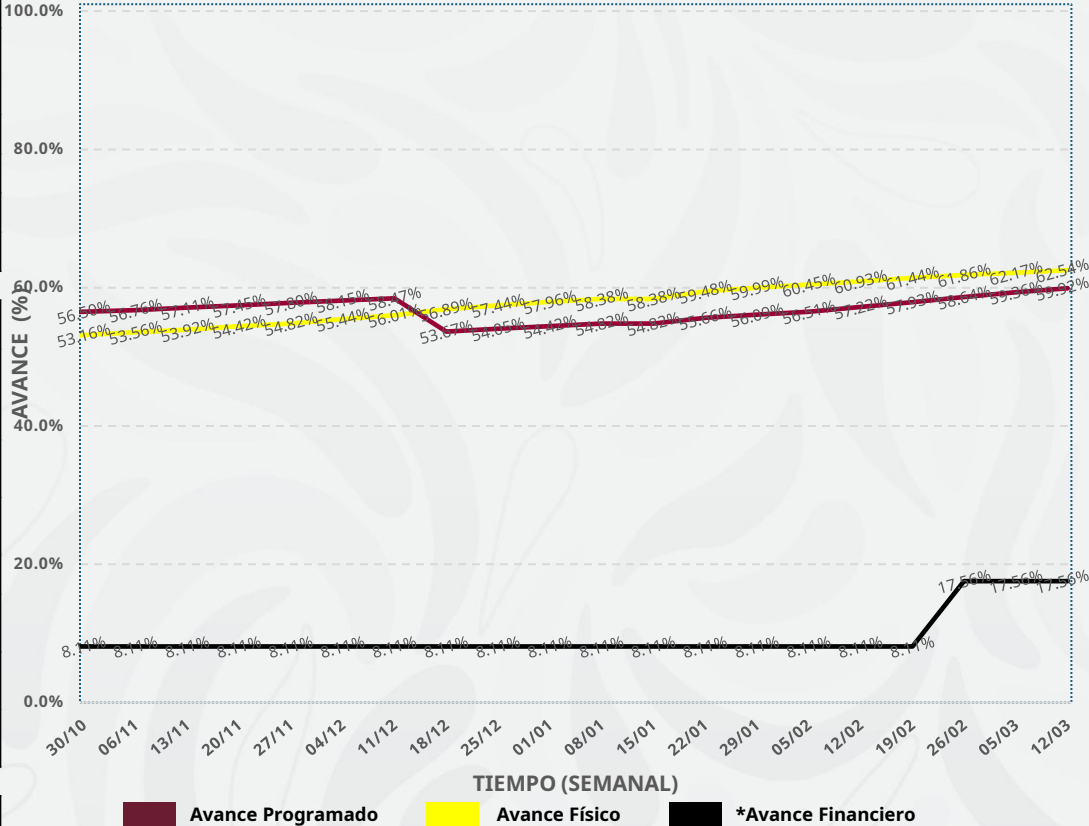

|                              | Del 28 feb al 05 mar 26  | Del 06 al 12 mar 26      |
|------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Fuerza de Trabajo (personas) | 291                      | 290                      |
| Maquinaria                   | 192                      | 191                      |
| tramos activos               | IV, VI, VII, VIII, IX, X | IV, VI, VII, VIII, IX, X |
| Frentes de trabajo (totales) | 29                       | 29                       |
| Terracerías                  | 8                        | 8                        |
| Pavimentos                   | 6                        | 6                        |
| Estructuras                  | 6                        | 6                        |
| ODT's                        | 9                        | 9                        |
