


Colima

Tramo Armería-Manzanillo

Avance físico

- Programado: 100.00%
- Semanal: 0.62%
- Real: 49.08%
- Financiero: 45.06%

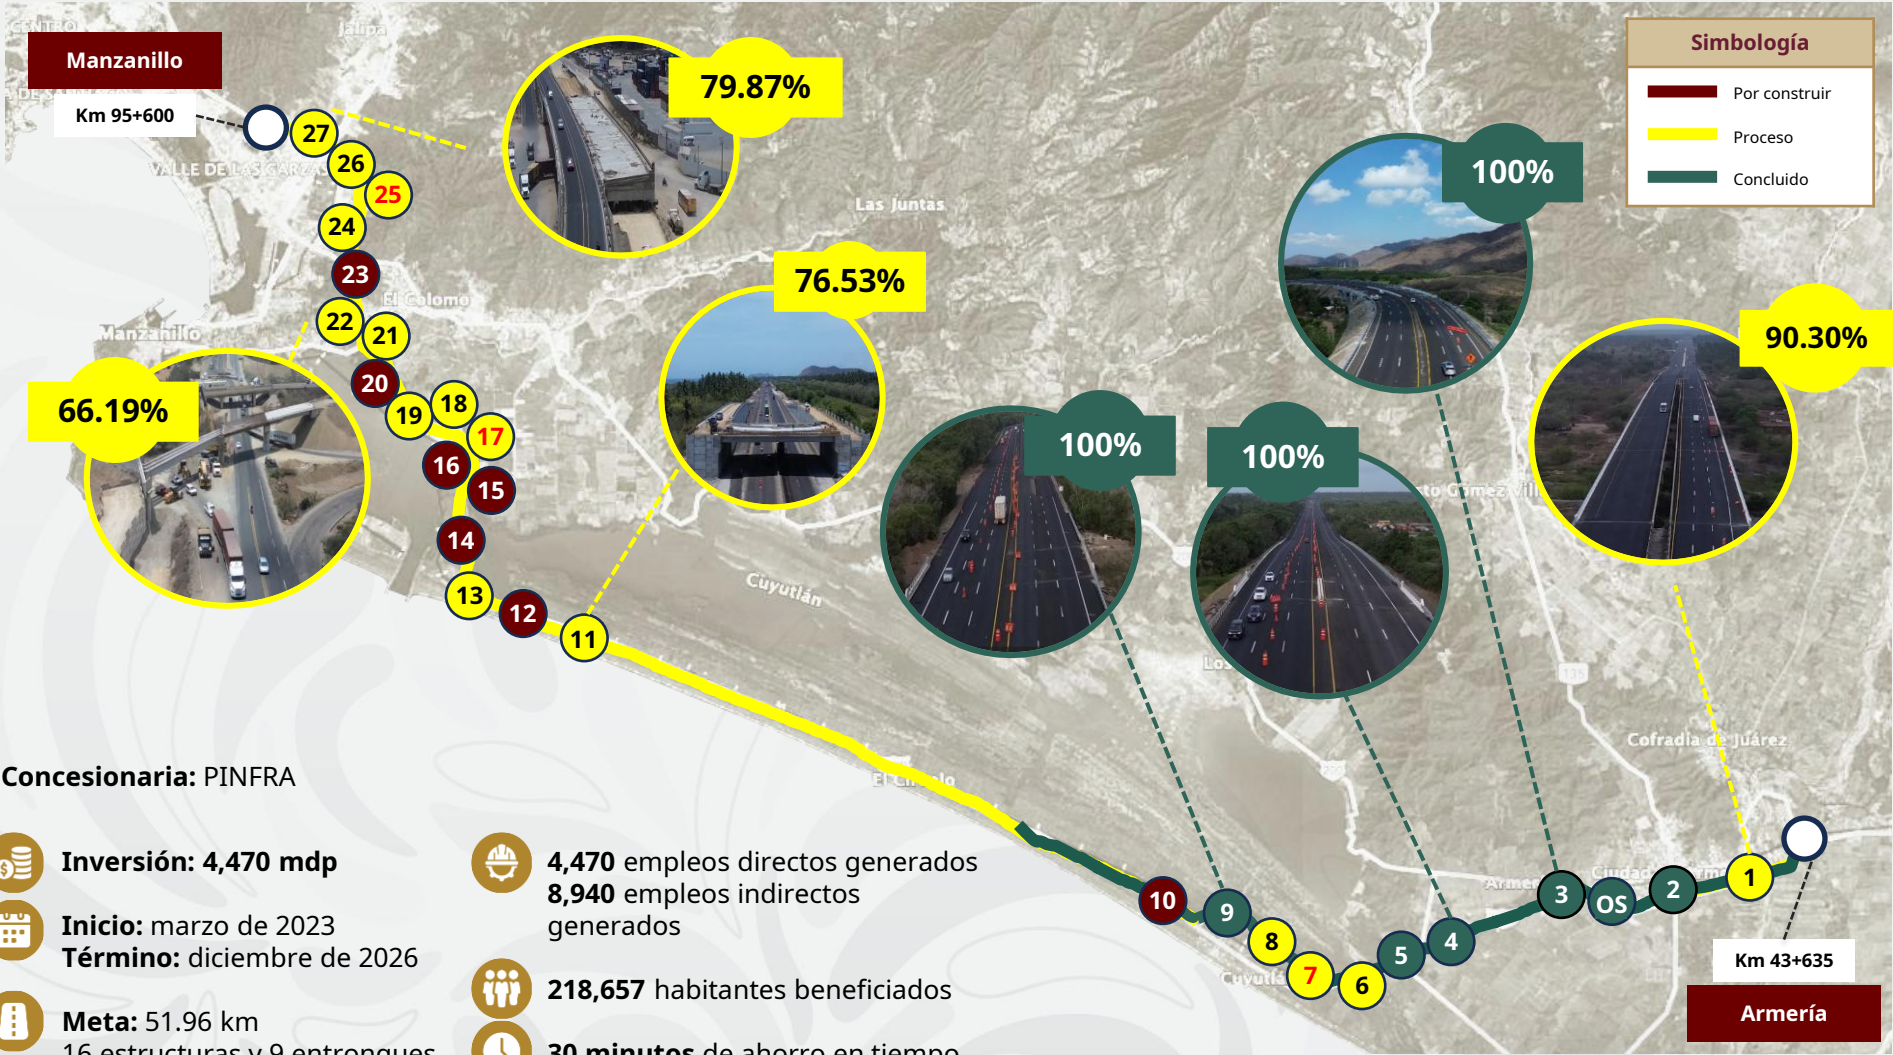

Descripción	
1	Puente Armería I km 45+500 (90.30%)
2	Entronque Paraíso km 47+741
3	PSFFCC Armería II km 50+100
4	PSV Tilapia km 54+350
5	Puente Palo Verde I km 55+950
6	Puente Palo Verde II km 56+650 (92.22%)
7	PIV Ent. Salinero II km 59+500 (88%) (falta fuerza de trabajo)
8	Entronque Salineros km 59+551 (27.45%)
9	PSFFCC Salinero I km 60+500
10	Entronque Cuyutlán km 60+800 (A la espera de regularización de catálogo)
11	PIV Retorno en U km 77+600 (76.53%)
12	Entronque Retorno en U km 77+600 (A la espera de regularización de catálogo)
13	PSFFCC Tepalcates I km 80+240 (59.11%)
14	Entronque Tepalcates I km 79+660 (A la espera de regularización de catálogo)
15	Puente Nuevo Tepalcates II km 81+581
16	Entronque Tepalcates II km 80+500
17	Entronque 83+500 km (42%) (No se tiene Fuerza de Trabajo Suficiente)
18	Puente Adjuntas km 86+420 (93.19%)
19	PSV Panteones km 87+760 (19.24%)
20	Entronque Panteones km 87+760
21	PIV Minatitlán Lib km 92+000 (4.84%)
22	PIV Minatitlán Lib. II km 92+000 (66.19%)
23	Entronque Minatitlán km 92+731
24	PIV Minatitlán Lib I km 93+000 (13.25%)
25	Puente Canal km 93+220 (54%) (Se realizó cambio de tránsito a Cuerpo Derecho)
26	Entronque Jalipa km 94+400 (26.26%)
27	Puente Jalipa km 94+158 (79.87%)
OS	PSV Obra social retorno en U 49+900


Colima

Tramo Armería-Manzanillo

Avance: Programado, Físico y Financiero

Elemento	Intervención	Ejecutado acumulado	Faltante	08/05/26 al 14/05/26		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
Volúmenes de Obra en Troncal						
Cortes (m³)	210,113	289,232	0	0	0	El programa origen para los trabajos que se ejecutan en la troncal llegó a su fin. Se está solicitando a la concesionaria entregue la reprogramación de los trabajos para concluir dentro del plazo establecido
Terraplenes (m³)	813,909	568,055	245,854	0	3,763	
Base y sub base (m³)	260,119	189,046	71,073	0	1,382	

NOTA: Los precios y avances mostrados en este reporte son con respecto a los catálogos y contrato vigente. El volumen programado proviene de un programa provisional. Se está trabajando en un nuevo programa.

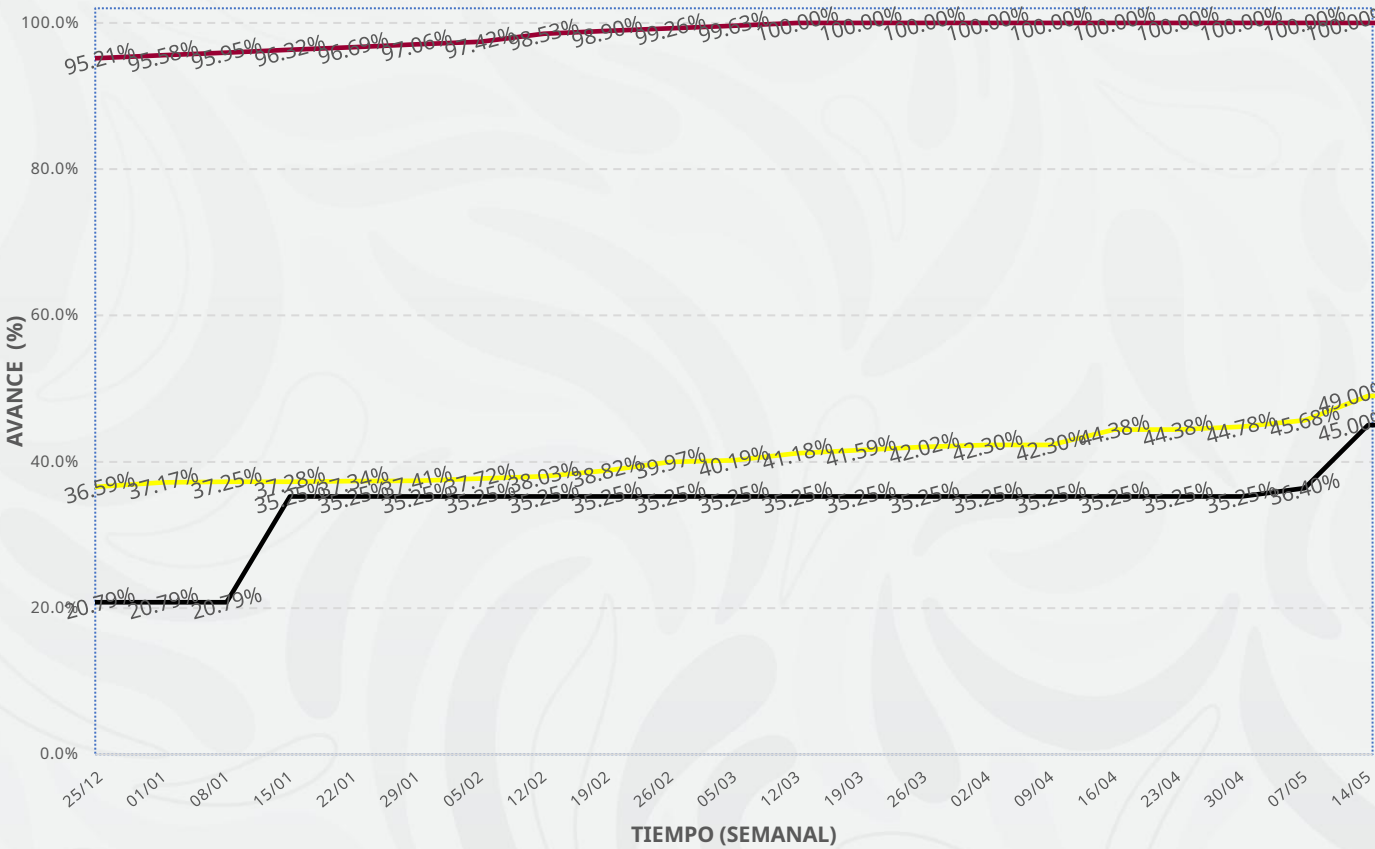

Avance Programado Avance Programado Avance Financiero

	Del 24 de abril al 30 de abril de 2026	Del 01 de mayo al 07 de mayo de 2026
Fuerza de Trabajo (personas)	102	115
Maquinaria	68	68
Frente de trabajo	Del Km 56+000 al Km 57+600 Del Km 66+000 al Km 71+830	Del Km 66+000 al Km 71+830 Del Km 74+000 al Km 79+660
