


Estado de México

Atizapán-Atlacomulco

Avance: Programado, Físico y Financiero

Elemento	Meta	Ejecutado acumulable	Faltante	07/05/2026 al 14/05/2026		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
Pilotes	344	207	137	2	1	• La mano de obra se incrementó un poco para alcanzar las expectativas correspondientes.
Zapatas	86	51	35	1	0.5	
Columnas	96	30	66	1	0.5	
Cabezales	76	14.5	61.5	1	0	
Caballetes	24	9.5	14.5	0	0	
Trabes de concreto	395	8	387	0	0	
Trabes metálicas	29	1.5	27.5	1	0.0	

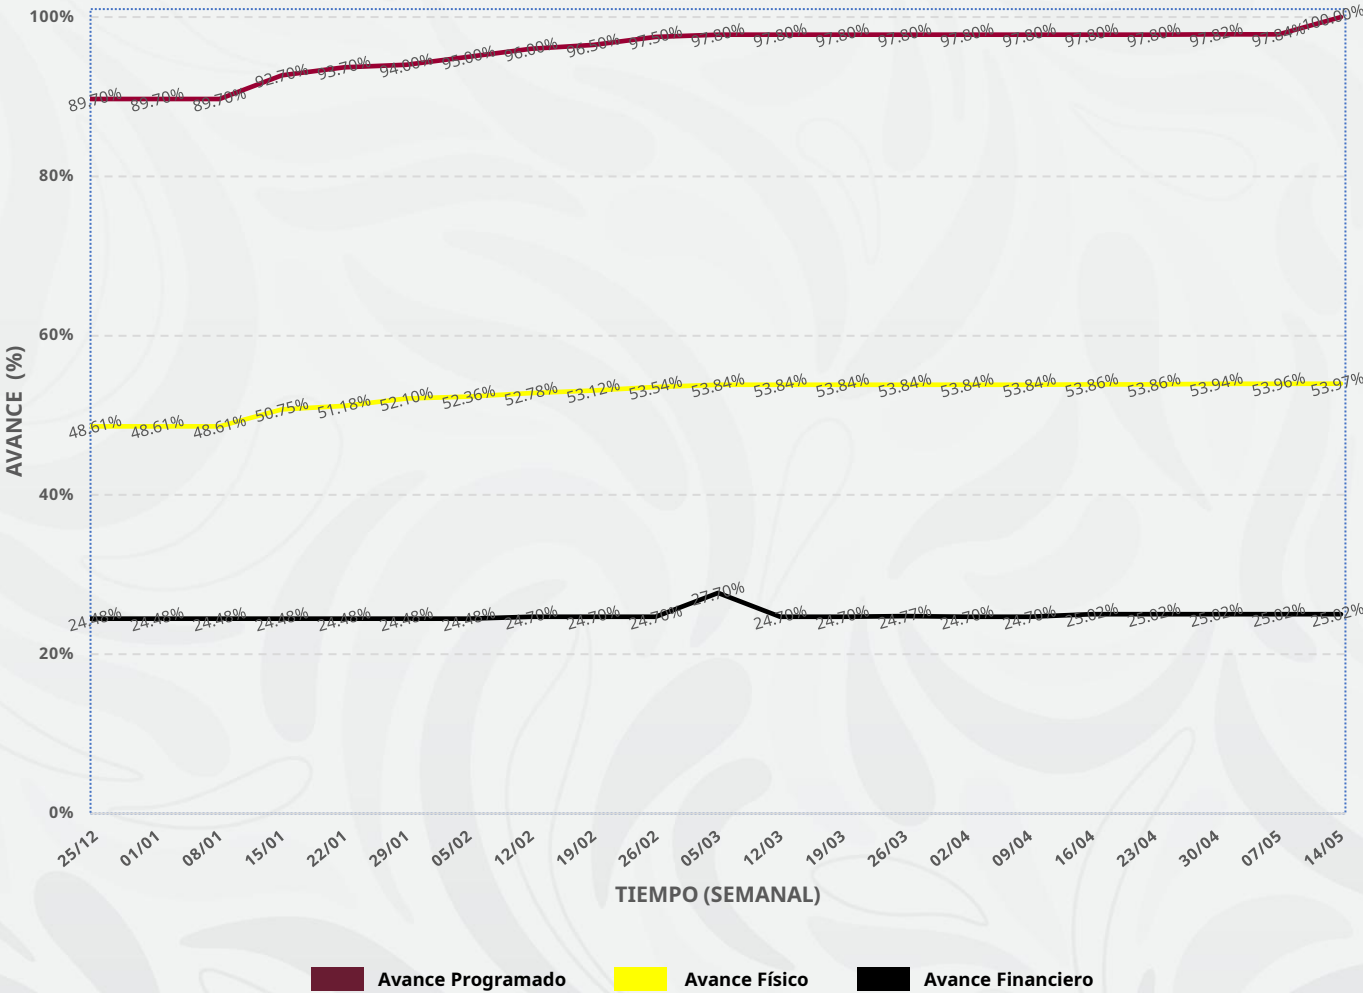

	Del 01 al 07 de mayo de 2026	Del 08 al 14 de mayo de 2026
Fuerza de Trabajo (personas)	2,152	2,360
Maquinaria	472	40
Frentes de trabajo	Tramos 01, 2A y 2B	Tramos 01, 2A y 2B
