

San Luis Potosí

La Pitahaya-Libramiento Oriente de S.L.P. y el Ramal Villa de Reyes

Avance físico • Programado: **9.08%**
• Real: **5.90%**

Avance financiero: **6.67%**

Inversión: 8,331.12 mdp.
Incluye I.V.A.


Inicio: julio 2024
Término: 14 de febrero 2028

Meta: 68.5 km. + 2.4 Km del Ramal
79 Estructuras; Puentes, PSV'S,
PSFCC, PIV'S.
1 Plaza de Cobro, 5 Entronques,
165 ODT'S.

2000 Empleos directos generados
600 Empleos indirectos generados

128 000 habitantes beneficiados

20 minutos de ahorro en tiempo

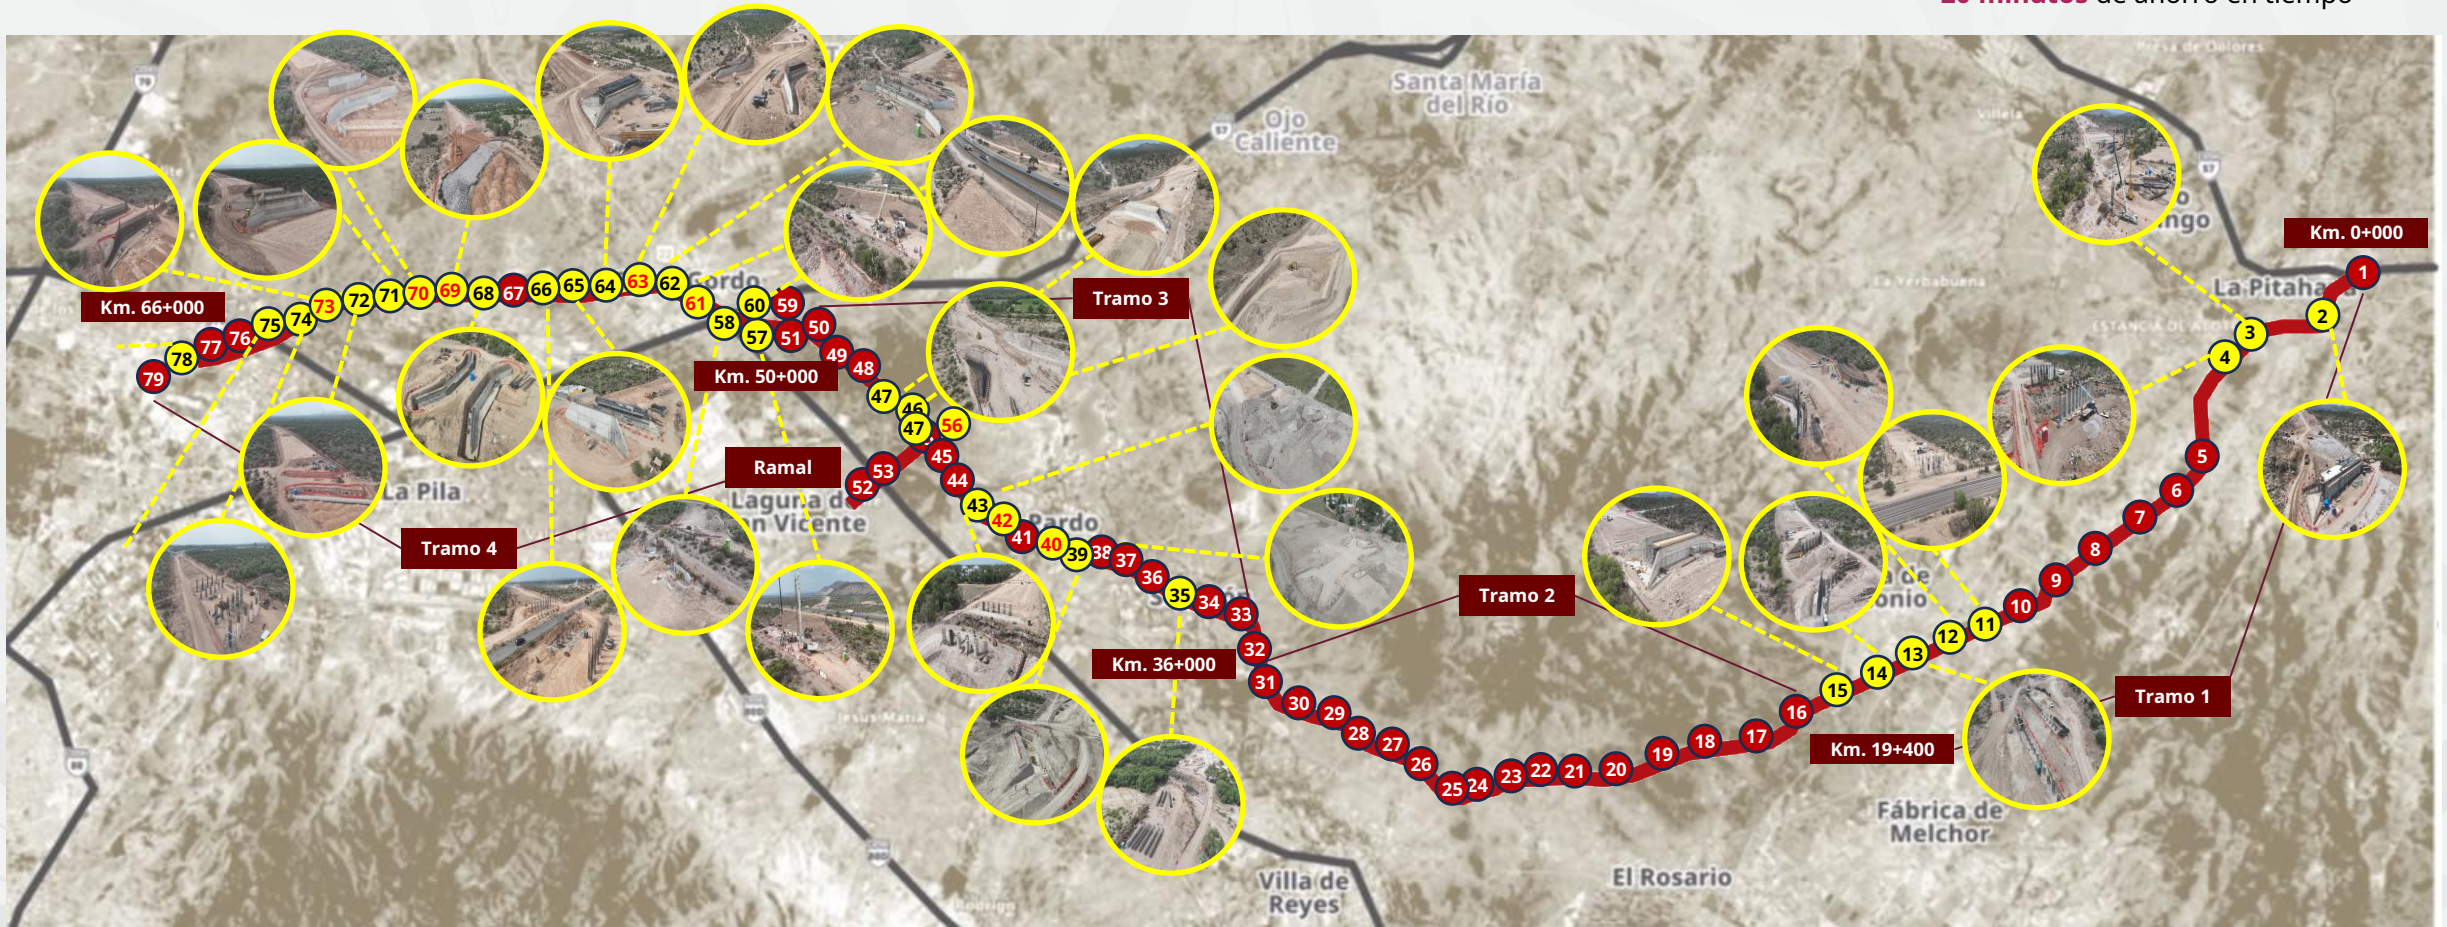

Estructuras Proyectadas por Tramo

Tramo 1

Descripción	Descripción	Descripción
1 Ent. La Pitahaya Km. 0+500	7 PSFFCC Km. 12+780	13 Ducto Km. 18+426 36.00%
2 PSV Km. 2+096.73 80.00%	8 PIV Km. 12+930	14 Puente Km.18+610 43.50%
3 Puente Km. 2+481 5.0%	9 PSV Km. 14+043	15 Dob Ca Km. 18+820 82.50%
4 Ducto Km. 2+680 45.0%	10 PIV Km. 14+810	
5 PIV Km. 9+289.75	11 PSFFCC Km. 16+250 6.80%	
6 Ducto Km. 10+853	12 PIV Km. 17+530 28.50%	

Tramo 2

Descripción	Descripción	Descripción
16 PSG Km.121+870	22 Ducto Km. 129+005	28 Puente Km. 134+662
17 PSV Km. 123+453	23 PSV Km. 130+725	29 PSG Km. 135+950
18 Puente Km. 123+608	24 PSG Km. 131+530	30 PIV Km. 137+310
19 PSV Km. 126+360	25 PSV Km. 132+820	31 Puente Carranco Km. 137+820
20 PSV Km. 128+210	26 Ducto Km. 134+020	
21 Puente Km. 128+420	27 PSV Km. 134+604	

Estructuras Sin Actividad

40	PSG Km. 41+981.48 3.00% (en espera del suministro de acero)
42	PSG Km. 42+650 1.00% (la fuerza de trabajo se movió a otro actividad)
56	Ec. Ind PSV Km18+700 4.80% (la fuerza de trabajo se movió a otro actividad)
61	Ec Carr. 57 Km.51+800 0.01% (la fuerza de trabajo se movió a otro actividad)
63	PIV Km. 53+150.26 46.60% (la fuerza de trabajo se movió a otro actividad)
69	PSV Km. 59+030 2.01% (se esta revisando unas filtraciones)
70	PSV Km. 60+5.79 39.00% (pendiente de autorizar libranza de postes de CFE)
73	PSV Km. 63+517.92 46.60% (estructura sin actividad en espera de la cimbra)

Tramo 3

Descripción	Descripción	Descripción
32 PIV Km. 36+719.53	41 PSV Km. 42+386	50 PIV Km. 49+120
33 PIV Km. 37+739.99	42 PSG Km. 42+650 1.00%	51 PIV Km. 49+900
34 PSV Km. 38+242.30	43 Puente Km. 42+990 18.20%	52 E.c. Car 37 PSV Km. 16+540
35 Puente Altamira Km. 39+520 1.20%	44 PSV Km. 43+456.78	53 PSV Km. 17+040
36 PSG Km. 39+750	45 PSV Km. 43+577.34	54 PSV Km. 17+610
37 PIV Km. 40+349.53	46 PIV Km. 44+243.13 9.50%	55 PIV Km. 18+365
38 PIV Km. 41+119.44	47 PSG Km. 45+380 91.50%	56 Ec.IndPSVKm18+700 4.80%
39 Ducto Km. 41+532.47 2.00%	48 Ducto Km. 45+517	
40 PSG Km. 41+981.48 3.00%	49 PSG Km. 46+930	


Tramo 4

Descripción	Descripción	Descripción
57 Ducto Km. 51+500 15.20%	66 PSV Km. 55+407 19.20%	75 Ducto Km. 65+791.31 42.80%
58 Ducto Km. 10+333 57.20%	67 PIV Km. 56+354.38	76 Ec Lib Ote Km. 66+000
59 PSV Km. 10+500	68 PSV Km. 58+505 39.40%	77 PSV Km. 66+441.21
60 Ducto 20+580 22.10%	69 PSV Km. 59+030 2.01%	78 PSV Km. 66+449.24 10.20%
61 Ec Carr. 57 Km.51+800 0.02%	70 PSV Km. 60+579.85 39.00%	79 PSV Km. 1+412
62 PSG Km. 52+190 35.40%	71 PSV Km. 61+561.78 68.00%	
63 PIV Km. 53+150.26 46.60%	72 PSV Km. 62+398.36 22.80%	
64 PSV Km. 54+424.37 84.20%	73 PSV Km. 63+517.92 46.60%	
65 PSV Km. 54+952.42 69.80%	74 PSV Km. 64+800 31.20%	

Simbología

	Por construir
	En proceso de construcción
	Concluido

Volúmenes de obra					
Tramo I km. 0+000 al Km. 19+400					
Tramo III Km. 36+000 al Km. 50+000					
Tramo IV km. 50+000 al Km. 66+000					
Elemento	Intervención	Ejecutado acumulado	Faltante	Ejecutado	08/05/26 al 14/05/26
Terracerías					
Desmonte, cualquiera que sea su tipo y características en carreteras, sin trasplante,	388.22	266.56	121.66	3.17	
Despalme de espesor variable en corte y terraplén, el material producto	733,873.06	335,218.65	398,654.41	5,466.08	
Excavaciones en cortes y adicionales debajo de la subrasante, cualquiera que sea su	2,860,090.52	292,138.95	2,567,951.57	158.80	
Construcción de terraplenes utilizando materiales compactables procedentes de	3,858,592.51	331,243.68	3,527,348.82	-	
Construcción de terraplenes utilizando materiales compactables procedentes de	3,710,618.07	460,725.34	3,249,892.73	49,452.33	
Formación y compactación de terraplenes utilizando materiales compactables	330,950.70	34,137.25	296,813.45	10,123.50	
Formación y compactación de terraplenes utilizando materiales compactables	1,570,694.98	10,687.90	1,560,007.08	-	
Obras de Drenaje					
Excavación para estructuras u obras de drenaje, cualquiera que sea su clasificación, con una	53,714.94	4,478.65	49,236.29	112.36	
Plantilla de material Granular, P.U.O.T	5,780.69	294.36	5,486.33	-	
Arrope y Relleno con material de calidad de subrasante, compactado al 95% de la	74,713.07	6,657.04	68,056.03	892.07	
Alcantarilla de concreto reforzado de f'c = 280 kg/cm2, en dirección normal de 152 cm	7,394.04	611.95	6,782.09	-	
Concreto hidráulico de f'c= 100 kg/cm2 en plantilla, por unidad de obra terminada.	1,399.10	348.06	1,051.05	15.54	
Concreto hidráulico de f'c=150 kg/cm2, por unidad de obra terminada.	3,314.74	2,549.45	765.29	5.15	
Concreto hidráulico de f'c=200 kg/cm2 en losa, por unidad de obra terminada.	13,274.04	443.43	12,830.61	28.19	
Acero para concreto hidráulico con límite elástico igual o mayor de fy = 4200 kg/cm2	356,544.18	117,429.13	239,115.05	6,242.81	
Malla electrosoldada 6x6 10-10, P.U.O.T	2,330.47	743.72	1,586.75	73.10	
Entronques					
Terracerías					
Despalme de espesor variable en corte y terraplén, el material producto del	61,394.70	44,763.20	16,631.50	2,015.98	
Excavaciones en cortes y adicionales debajo de la subrasante, cualquiera que sea su	848,439.10	121,551.02	726,888.08	-	
Construcción de terraplenes utilizando materiales compactables procedentes de	325,337.10	60,217.89	265,119.21	1,434.07	

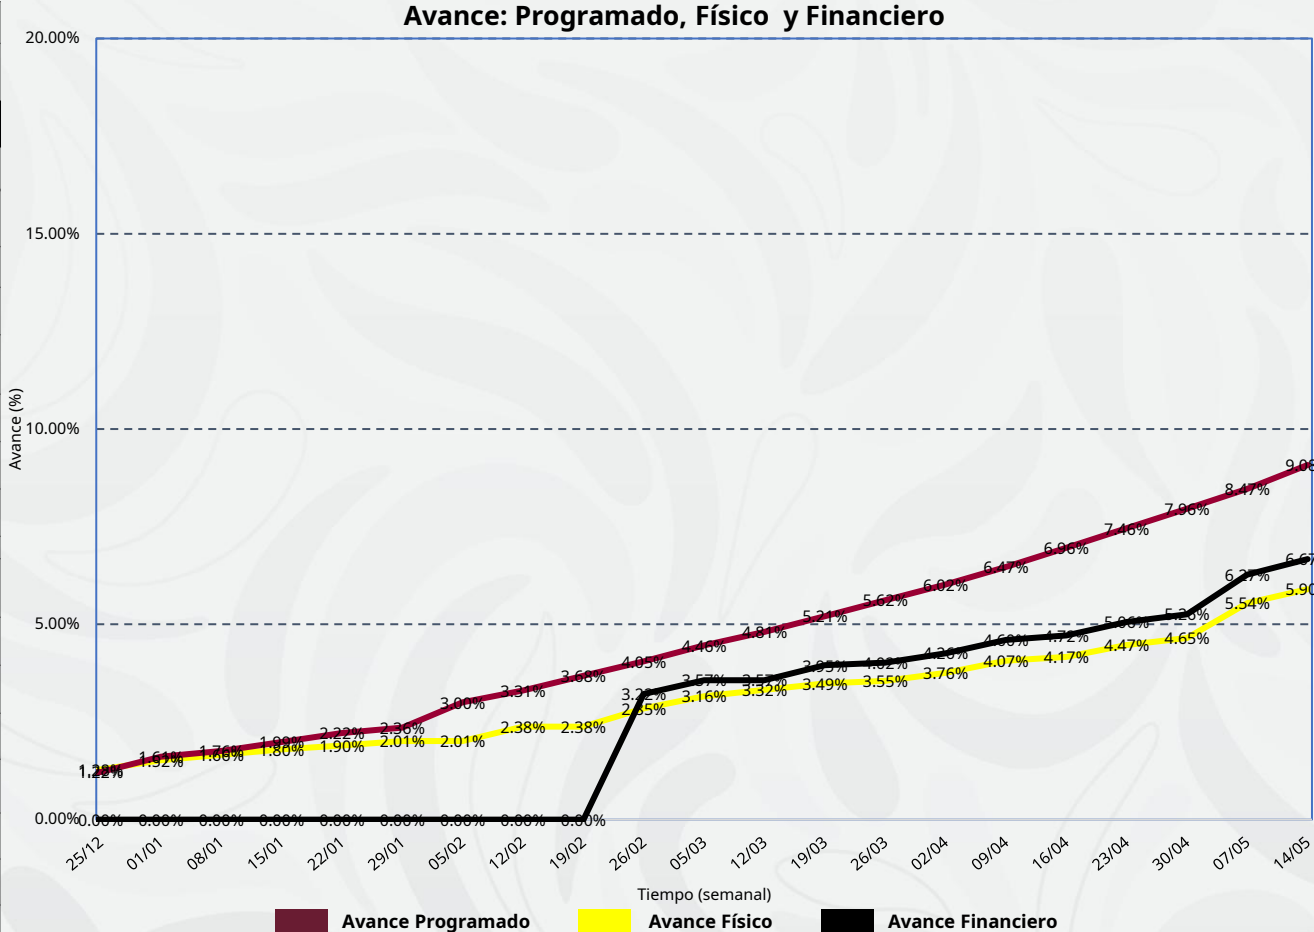

	Del 01 de mayo a 07 de mayo de 2026	Del 08 de mayo a 14 de mayo de 2026
Fuerza de Trabajo (personas)	809	709
Maquinaria	193	179
Frente de Trabajo	Tramo 1/Tramo 3/Tramo 4	Tramo 1/Tramo 3/Tramo 4
