


Jalisco

Ampliación Libramiento Lagos de Moreno

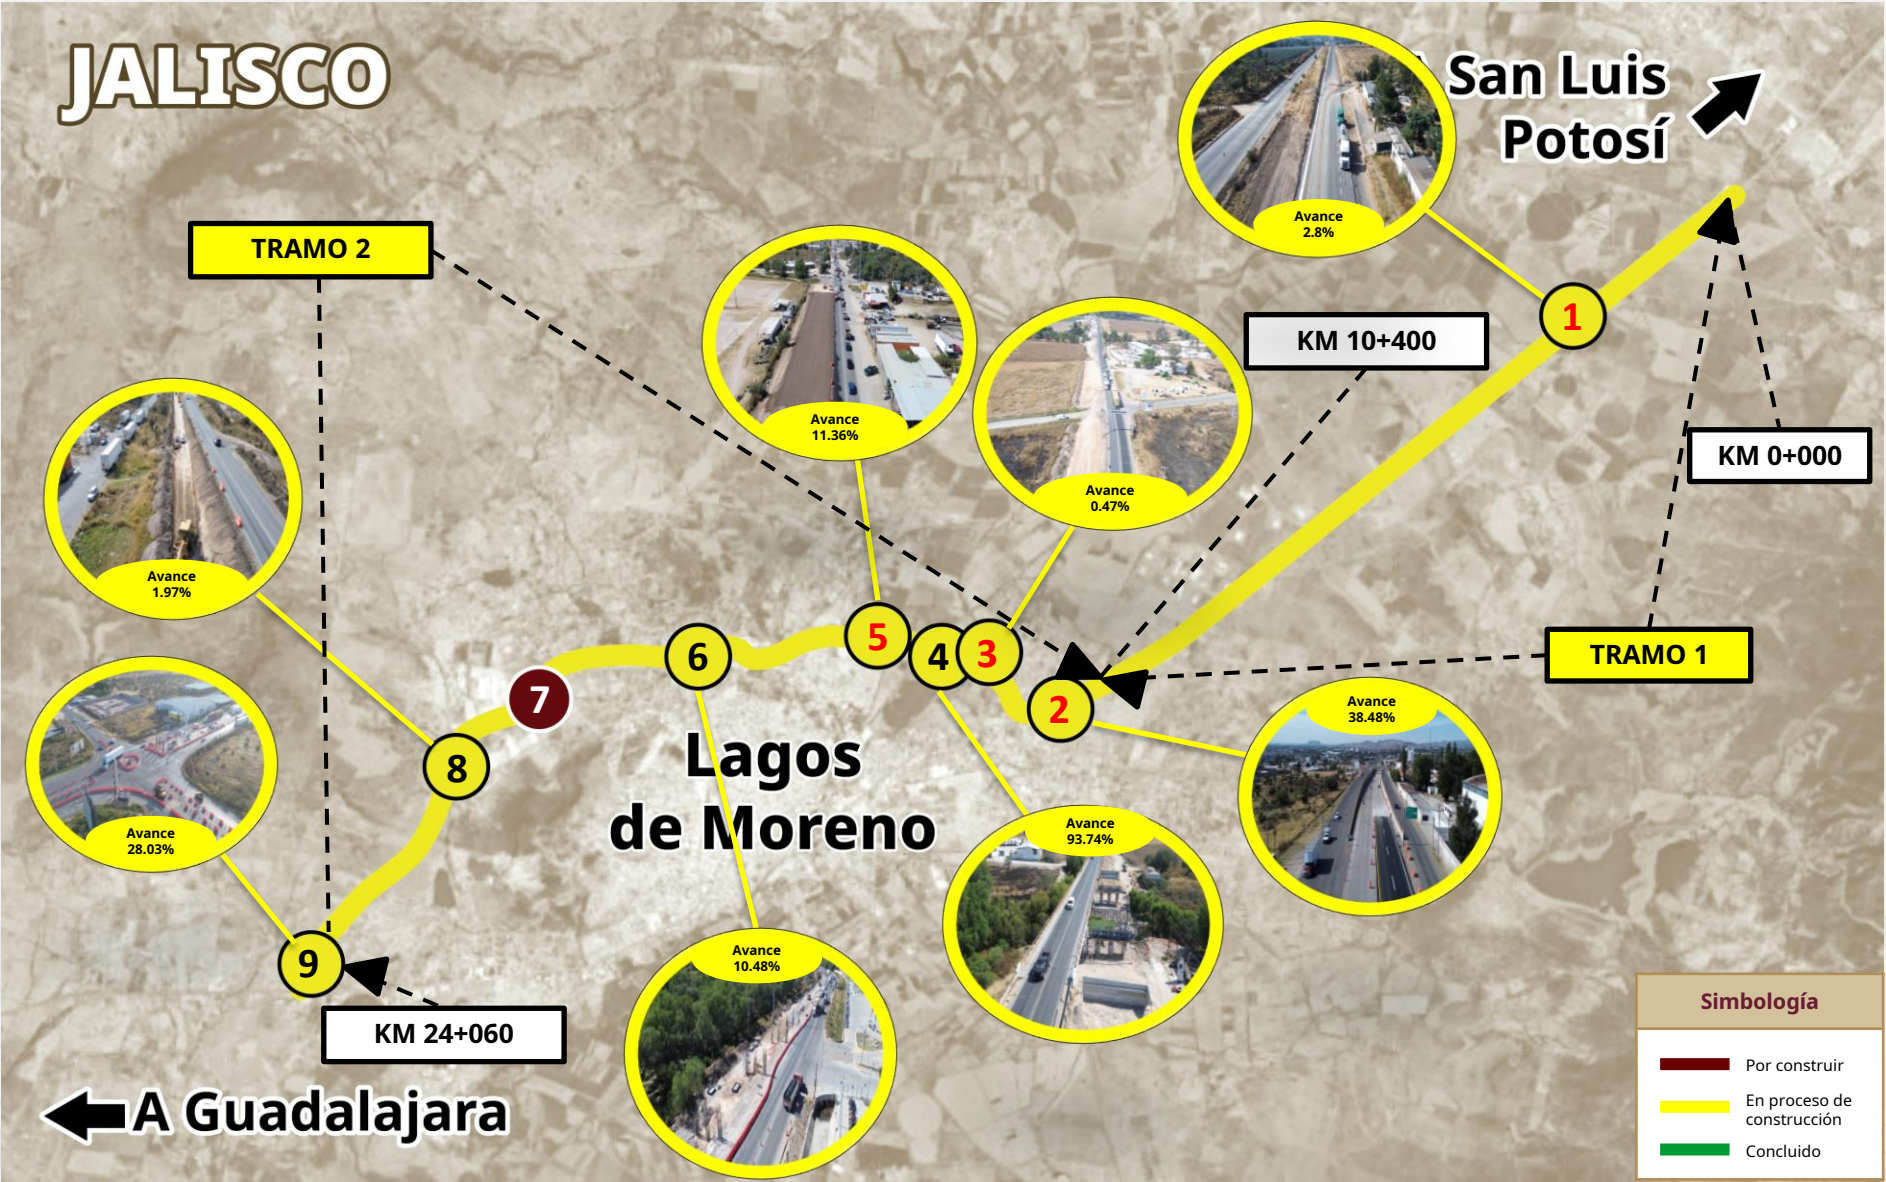


Descripción	
1	PIV con entronque "El Maguey" km 1+300 - Avance 2.8% . Problemas de DDV. (Modificación de proyecto).
2	Entronque a desnivel Lagos de Moreno Este km 11+800 (adecuación)- Avance 38.48% (se movió la fuerza de trabajo)
3	PIV con entronque "Fracc. Andalucía" km 12+120 Avance 0.47% . (se movió la fuerza de trabajo)
4	Puente km 12+450 "Rio Lagos"- Avance 93.74% .
5	PIV con entronque "Sepúlveda" km 13+620 Avance 11.36% . (se movió la fuerza de trabajo)
6	PSV con entronque "DRÄXLMAIER" km 15+900 Avance 10.48%
7	PIV con entronque "Encarnación" km 18+200
8	PSFC con retornos km 19+860 Avance 1.97%
9	PIV con entronque Tipo Glorieta "Lagos de Moreno Oeste" km 23+920 Avance 28.03% .

Jalisco

Ampliación Libramiento Lagos de Moreno

TRAMO 2 - AVANCE TRONCAL Y ENTRONQUES							
Concepto	Unidad	Total	Ejecutado	Faltante	08/05/26 al 14/05/26		Observaciones
					Programado	Ejecutado	
Terracerías Troncal	%	100%	58.02%	41.98%	0.021%	0.31%	En proceso
Obras Inducidas	%	100%	37.08%	62.92%	0.050%	1.66%	En proceso
Entronque 23+920	%	100%	28.03%	71.97%	0.13%	3.76%	En proceso
Entronque km 15+900	%	100%	10.48%	89.52%	0.00%	0.01%	En proceso
PSFC 19+860	%	100%	1.97%	98.03%	0.00%	0.04%	En proceso

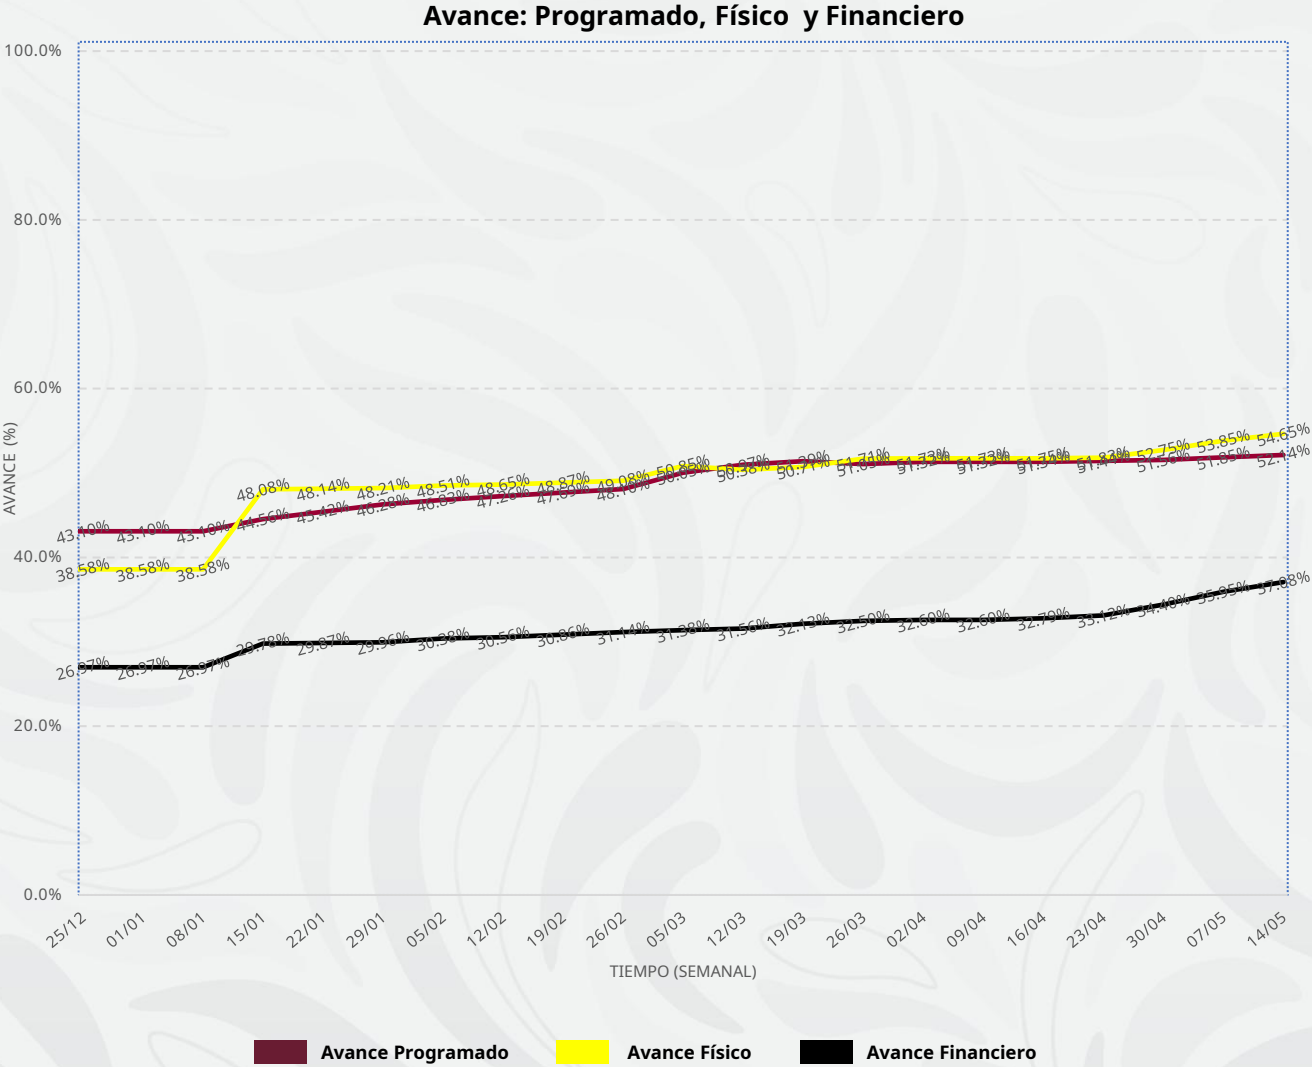

	01 al 07 de mayo 2026	08 al 14 de mayo 2026
Fuerza de Trabajo (personas)	246	246
Maquinaria	69	69
