

Veracruz Autopista Cardel - Poza Rica

Laguna Verde-La Mancha



Descripción	
1	Entronque Laguna Verde II Km 0+000
2	PSMA 1.5 Km 1+555.5
3	PSMA 2.7 Km 2+703.91
4	PIV 3.05 Km 3+041
5	Entronque Laguna Verde I Km 3+041
6	PSMA 3.9 Km 3+900
7	PSMA 6.0 Km 6+080 (100.00%)
8	PIV 6.8 Km 6+806 (96.00%) (se realizan trabajos de armado de acero de refuerzo para obra de drenaje en rampa de acceso).
9	PIV 7.04 Km 7+040 (5.00%) Se continua con la evaluación de la reubicación de la estructura.
10	PUENTE 7.3 Km 7+330 (10.00%) Trabajos de pilas concluidos.
11	PUENTE 7.8 Km 7+815, (61.70%) Se realiza el desvío de línea de media tensión en claro no. 01
12	PLAZA DE COBRO Km 8+300, (16.00%) El proyecto ejecutivo está en revisión en la DGDC.
13	PUENTE 8.7 Km 8+665, (96.00%) a nivel de losa colada
14	PSMA 8.9 Km 8+960, (100.00%)
15	PUENTE 14 Km 14+000
16	PUENTE 14.7 Km 14+700
17	PSV Km 14+900
18	PSMA 15.3 Km 15+370
19	PSV 16.8 Km 16+800
20	ENTRONQUE LA MANCHA Km 19+841

Avance físico

- Programado: 81.91%
- Real: 31.49% Incluye Ent. Chapachapa
- Financiero: 16.23%
- Semanal: 0.63%

 **Inversión: 2,252.78 mdp**

 **Inicio:** Marzo de 2025
Término: Agosto de 2026

 **Meta:** 19.84 km, 5 Puentes, 1 Plaza de Cobro, 3 Entronques, 2 PSVs, 3 PIVs, 6 PSMA, 59 ODTs y el Entronque Chapachapa

 **2,252.78 (1)=2,253** empleos directos generados/millón de inversión
2,252.78 (2)= 4,506 empleos indirectos generados/millón de inversión


 **128,000** habitantes beneficiados

 **45 minutos** de ahorro en tiempo, Tramo 4

Veracruz Autopista Cardel - Poza Rica

Laguna Verde-La Mancha

Elemento	Intervención	Ejecutado acumulado	Faltante	07/05/26 al 14/05/26		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
Tramo 4 Laguna Verde - La Mancha						
Volumenes de obra						
Despalme	229,302.80	92,937.12	136,365.68	7,165.00	7,224.53	El volumen programado corresponde a los 19.8 km y solo se trabaja en 7.9 km.
Corte	1,414,039.20	213,048.92	1,200,990.28	27,193.00	12,087.02	El volumen programado corresponde a los 19.8 km y solo se trabaja en 7.9 km.
Terraplén	1,155,915.50	215,101.02	940,814.48	20,641.00	935.25	El volumen programado corresponde a los 19.8 km y solo se trabaja en 7.9 km.
Base Hidráulica	54,900.80	3,287.93	51,612.87	9,150.13	1,185.46	El volumen programado corresponde a los 19.8 km y solo se trabaja en 7.9 km.
Estructuras Tramo 4 Laguna Verde - La Mancha						
Cargaderos	2	0	2	0	0	Puente 7.3 Km 7+373
Apoyos	2	0	2	0	0	Puente 7.3 Km 7+373
Pilas	12	12	0	0	0	Puente 7.3 Km 7+373

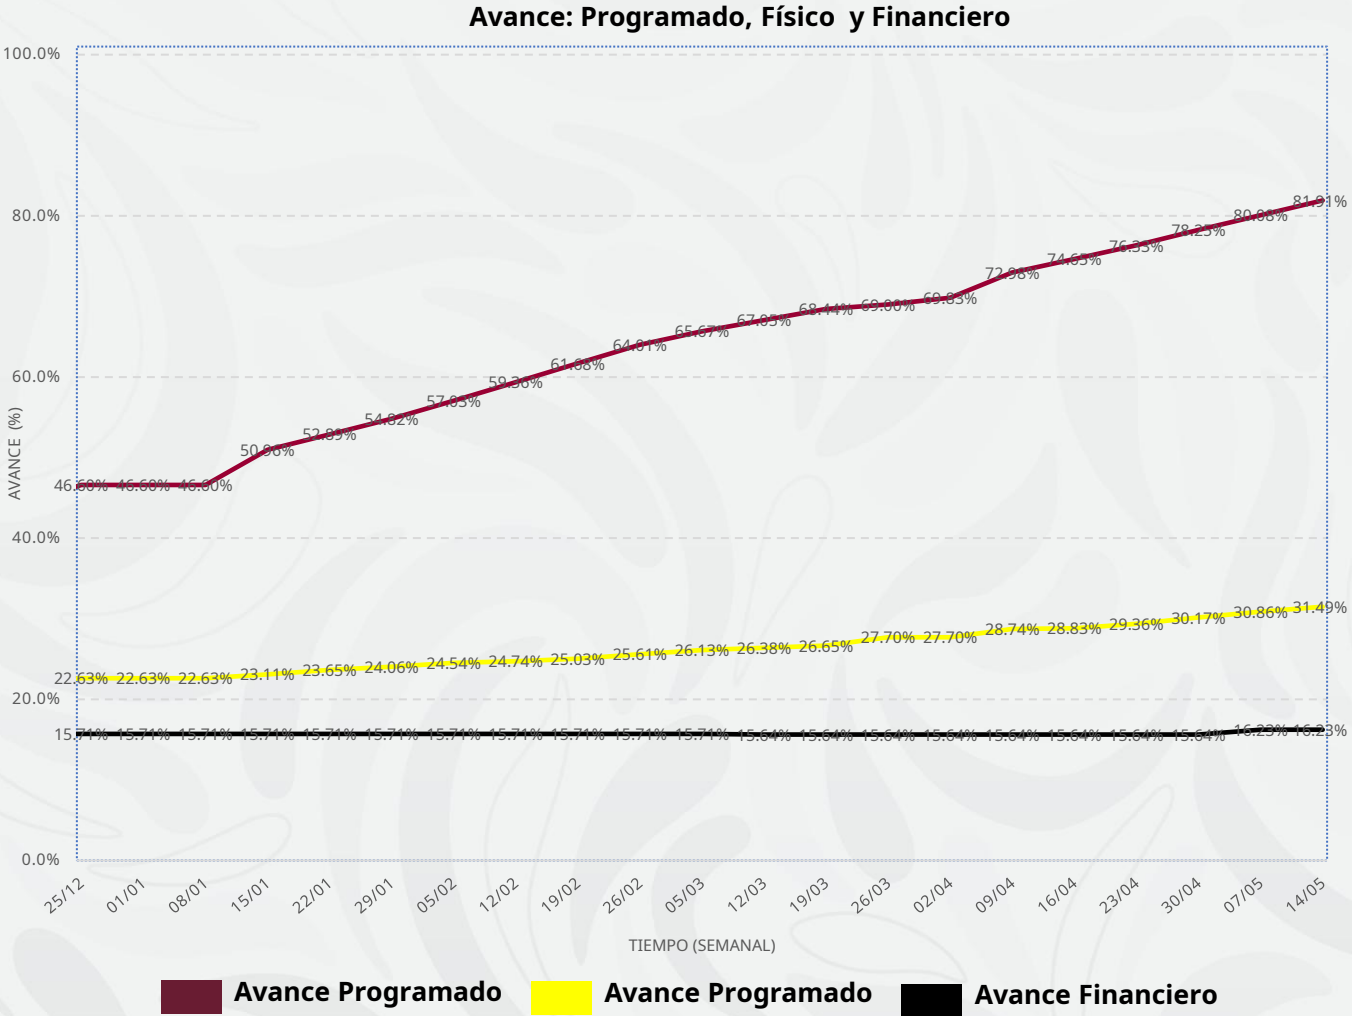

	24 de abril al 30 de abril	01 de mayo al 07 de mayo	08 de mayo al 14 de mayo
Fuerza de Trabajo (personas)	174	180	200
Maquinaria	28	33	37
