


Michoacán

Lázaro Cárdenas-Nueva Italia

Avance físico

- Programado: 0.00%
- Real: 0.10%
- Semanal: 0.01 %
- Financiero: 0.00%

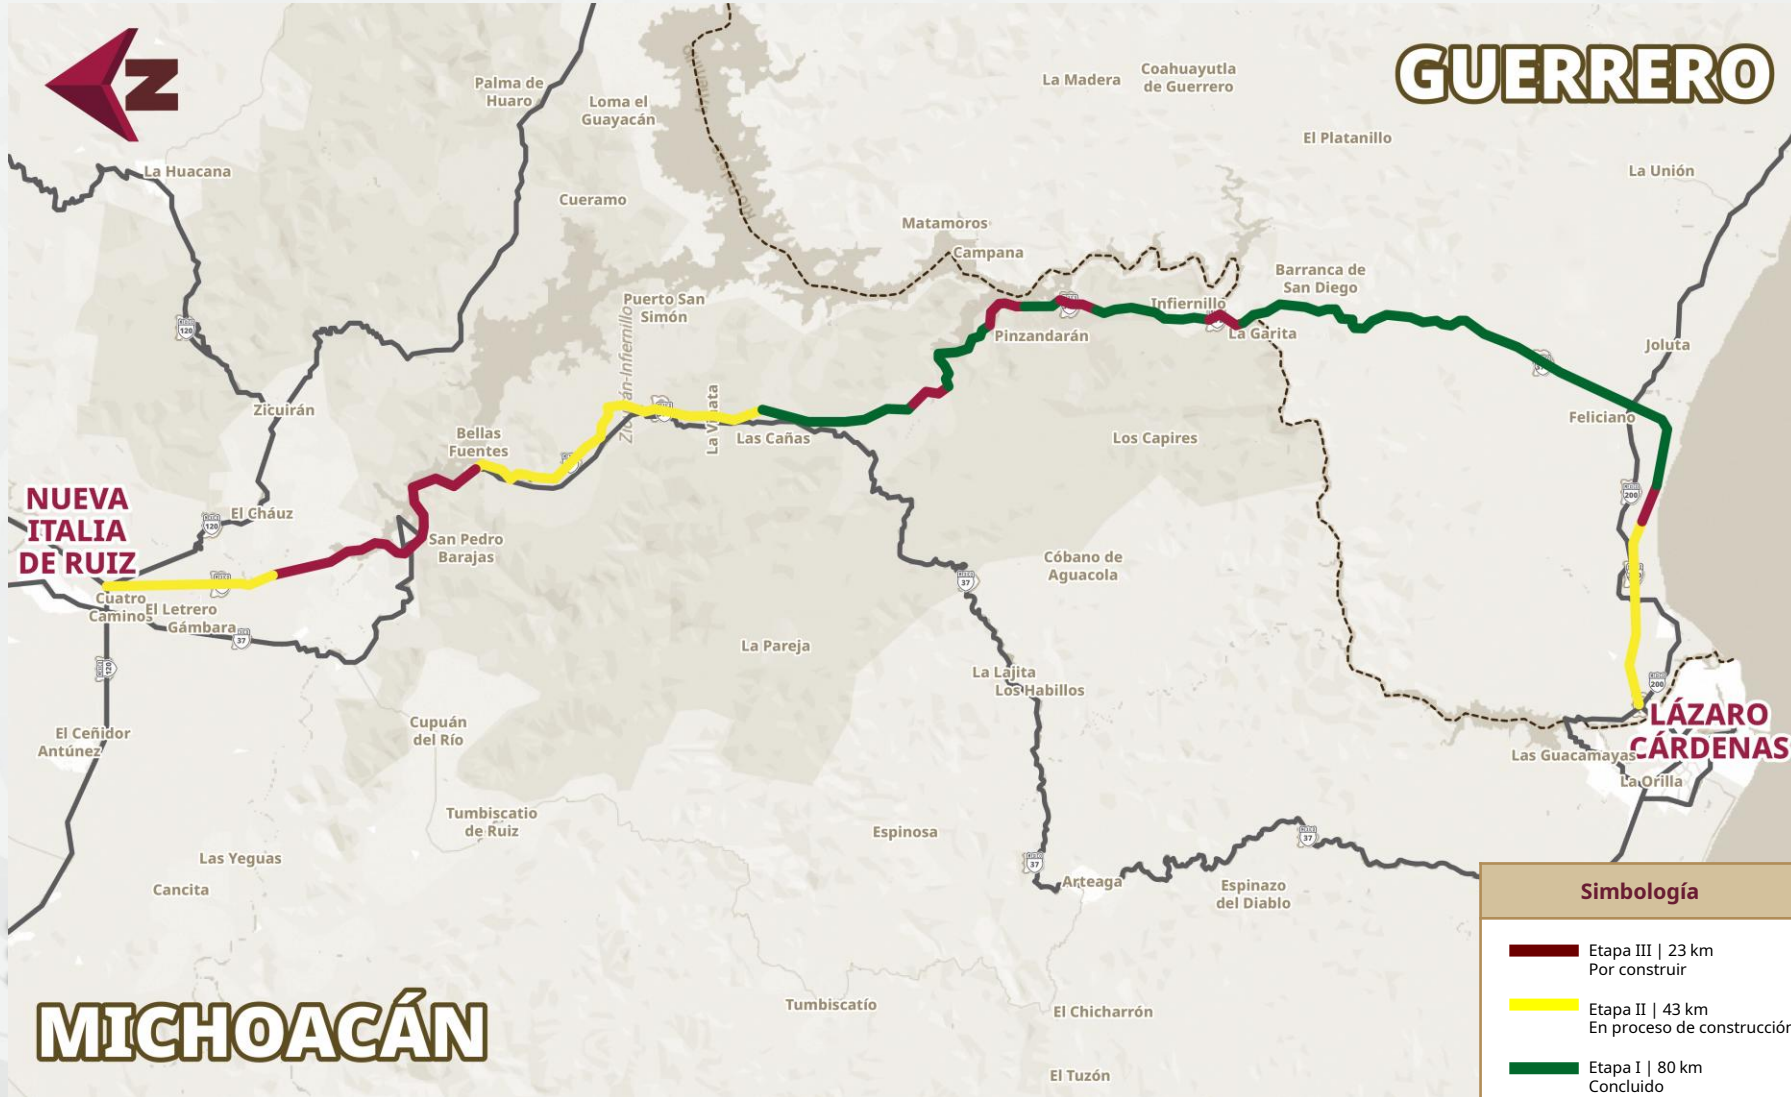


- Inversión: 16,000 mdp**
- Inicio: Marzo 2026**
Término: 2029
- Meta: 146 km**
45 PIV's | 3 PSV's | 28
Puentes de concreto | 5 PSFCC
| 1 Túnel
1 Ampliación de plaza de cobro
3 Puentes de acero (estructuras
complejas)
- 4,123 empleos generados**
- 1,800,000 habitantes
beneficiados**

Michoacán

Lázaro Cárdenas-Nueva Italia

Elemento	Meta	Ejecutado acumulable	Faltante	07/05/2026 al 14/05/2026	
				Programado	Ejecutado
Desmonte	146 km	9.60 km	136.40 km	.100 km	.100 km
Movimiento de tierras	146 km	1.10 km	144.90 km	.100 km	.100 km

Avance: Programado, Físico y Financiero

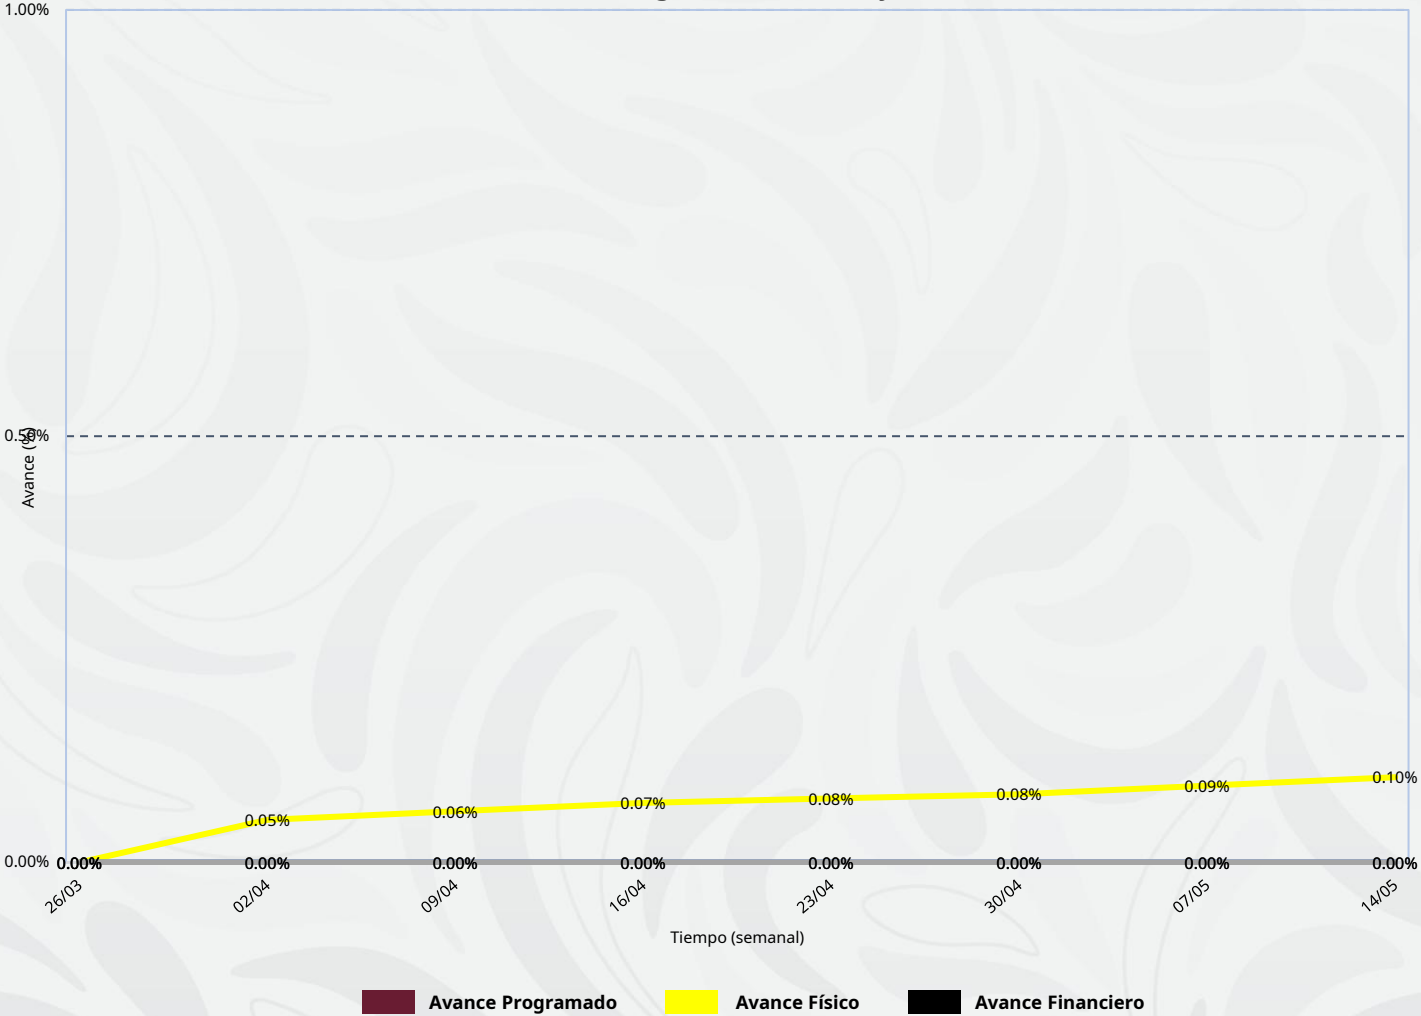

	Del 30 de abril al 07 de mayo de 2026.	Del 07 de mayo al 14 de mayo de 2026.
Fuerza de Trabajo (personas)	50	50
Maquinaria	20	20
Frente de Trabajo	Actividades de deshierbe y desmonte	Actividades de deshierbe y desmonte
