

Colima

Tramo Armería-Manzanillo

Avance físico

• Programado: 100.00%

• Semanal: 1.70%

• Real: 44.38%

• Financiero: 35.25%



Descripción	
1	Puente Armería I km 45+500 (89%) Faltan trabajos de muros pantalla, cono de derrame y muro gavión en cimentación
2	Entronque Paraíso km 47+741 (100%)
3	PSFFCC Armería II km 50+100 (100%)
4	PSV Tilapia km 54+350 (100%)
5	Puente Palo Verde I km 55+950 (100%).
6	Puente Palo Verde II km 56+650 (92%) (se movió la fuerza de trabajo)
7	PIV Ent. Salineros II km 59+500 (88%) (falta fuerza de trabajo)
8	Entronque Salineros km 59+551 (27%) Está pendiente definición de Muros de Contención
9	PSFFCC Salineros I km 60+500 (100%)
10	Entronque Cuyutlán km 60+800 (A la espera de regularización de catálogo)
11	PIV Retorno en U km 77+600 (76%) (sin actividad derivado de periodo vacacional)
12	Entronque Retorno en U km 77+600 (A la espera de regularización de catálogo)
13	PSFFCC Tepalcates I km 80+240(59%) (sin actividad derivado de periodo vacacional)
14	Entronque Tepalcates I km 79+660 (A la espera de regularización de catálogo)
15	Puente Nuevo Tepalcates II km 81+581
16	Entronque Tepalcates II km 80+500
17	Entronque 83+500 km (42%) No se tiene Fuerza de Trabajo Suficiente
18	Puente Adjuntas km 86+420 (93%) (sin actividad derivado de periodo vacacional)
19	PSV Panteones km 87+760 (18%)
20	Entronque Panteones km 87+760
21	PIV Minatitlán Lib km 92+000 (4%) Se detuvieron trabajos por interferencia con instalaciones de CFE.
22	PIV Minatitlán Lib. II km 92+000 (66%) (sin actividad derivado de periodo vacacional)
23	Entronque Minatitlán km 92+731
24	PIV Minatitlán Lib I km 93+000 (13%) (sin actividad derivado de periodo vacacional)
25	Puente Canal km 93+220 (57%) (Se realizó cambio de tránsito a Cuerpo Derecho)
26	Entronque Jalipa km 94+400 (25%) (Se movió la fuerza de trabajo)
27	Puente Jalipa km 94+158 (79%)
OS	PSV Obra social retorno en U 49+900 (100%)


Colima

Tramo Armería-Manzanillo

Avance Programado - Físico - Financiero (%)

Elemento	Intervención	Ejecutado acumulado	Faltante	03/04/26 al 09/04/26		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
Volúmenes de Obra en Troncal						
Cortes (m³)	210,113	289,232	0	0	1,320	El programa origen para los trabajos que se ejecutan en la troncal llegó a su fin. Se está solicitando a la concesionaria entregue la reprogramación de los trabajos para concluir dentro del plazo establecido
Terraplenes (m³)	813,909	571,818	242,091	0	2,996	
Base y sub base (m³)	260,119	190,428	69,691	0	584	

NOTA: Los precios y avances mostrados en este reporte son con respecto a los catálogos y contrato vigente. El volumen programado proviene de un programa provisional. Se está trabajando en un nuevo programa.

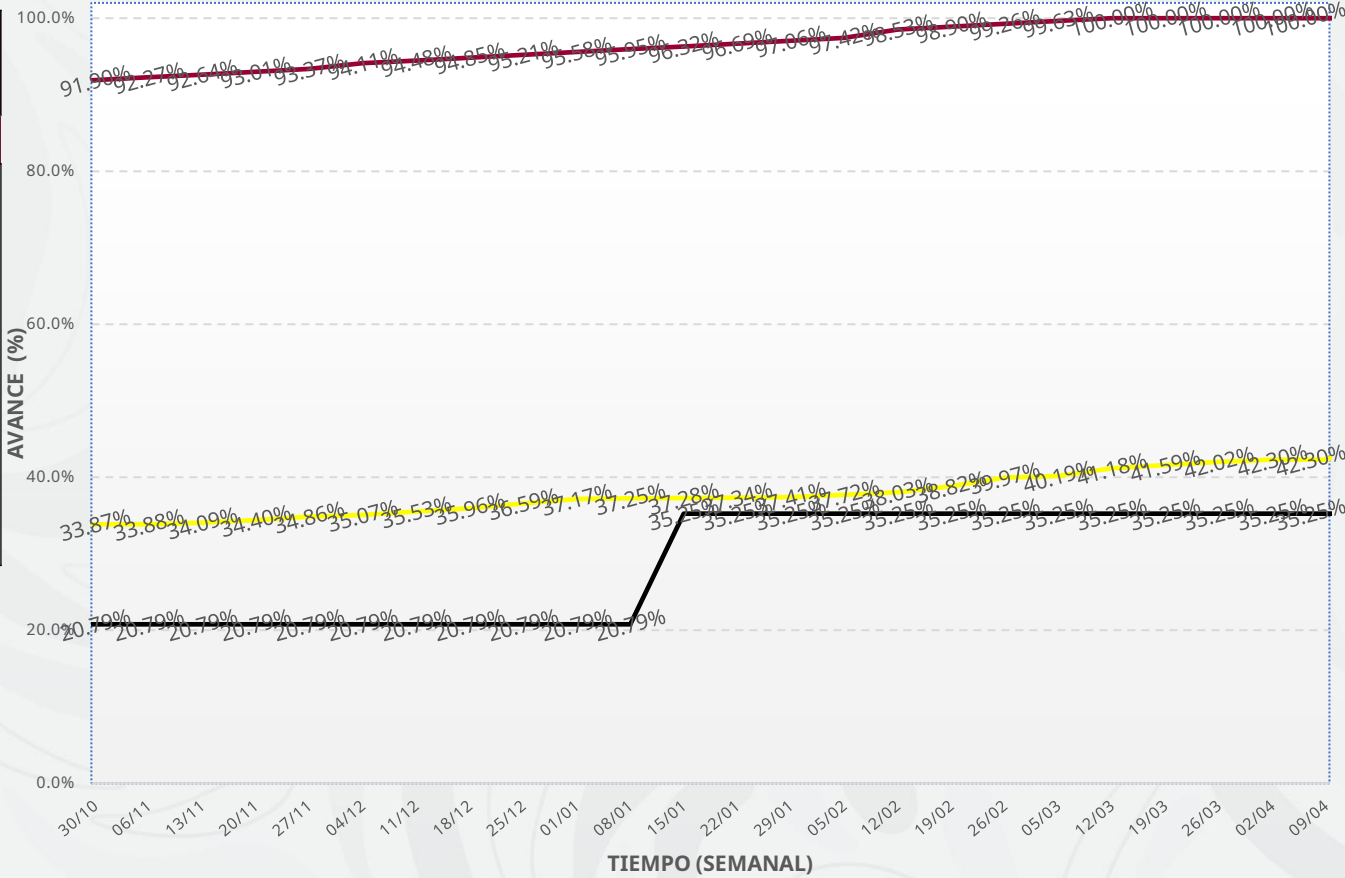

	27 de marzo al 02 de abril	03 de abril al 09 de abril
Fu akerza de Trabajo (personas)	98	105
Maquinaria	68	75
Frente de trabajo	Del Km 74+000 al Km 79+660	Del Km 92+480 a 92+520 Del km 92+520 a 92+600 Del km 86+260 al 86+380
