


Jalisco

Ampliación Libramiento Lagos de Moreno

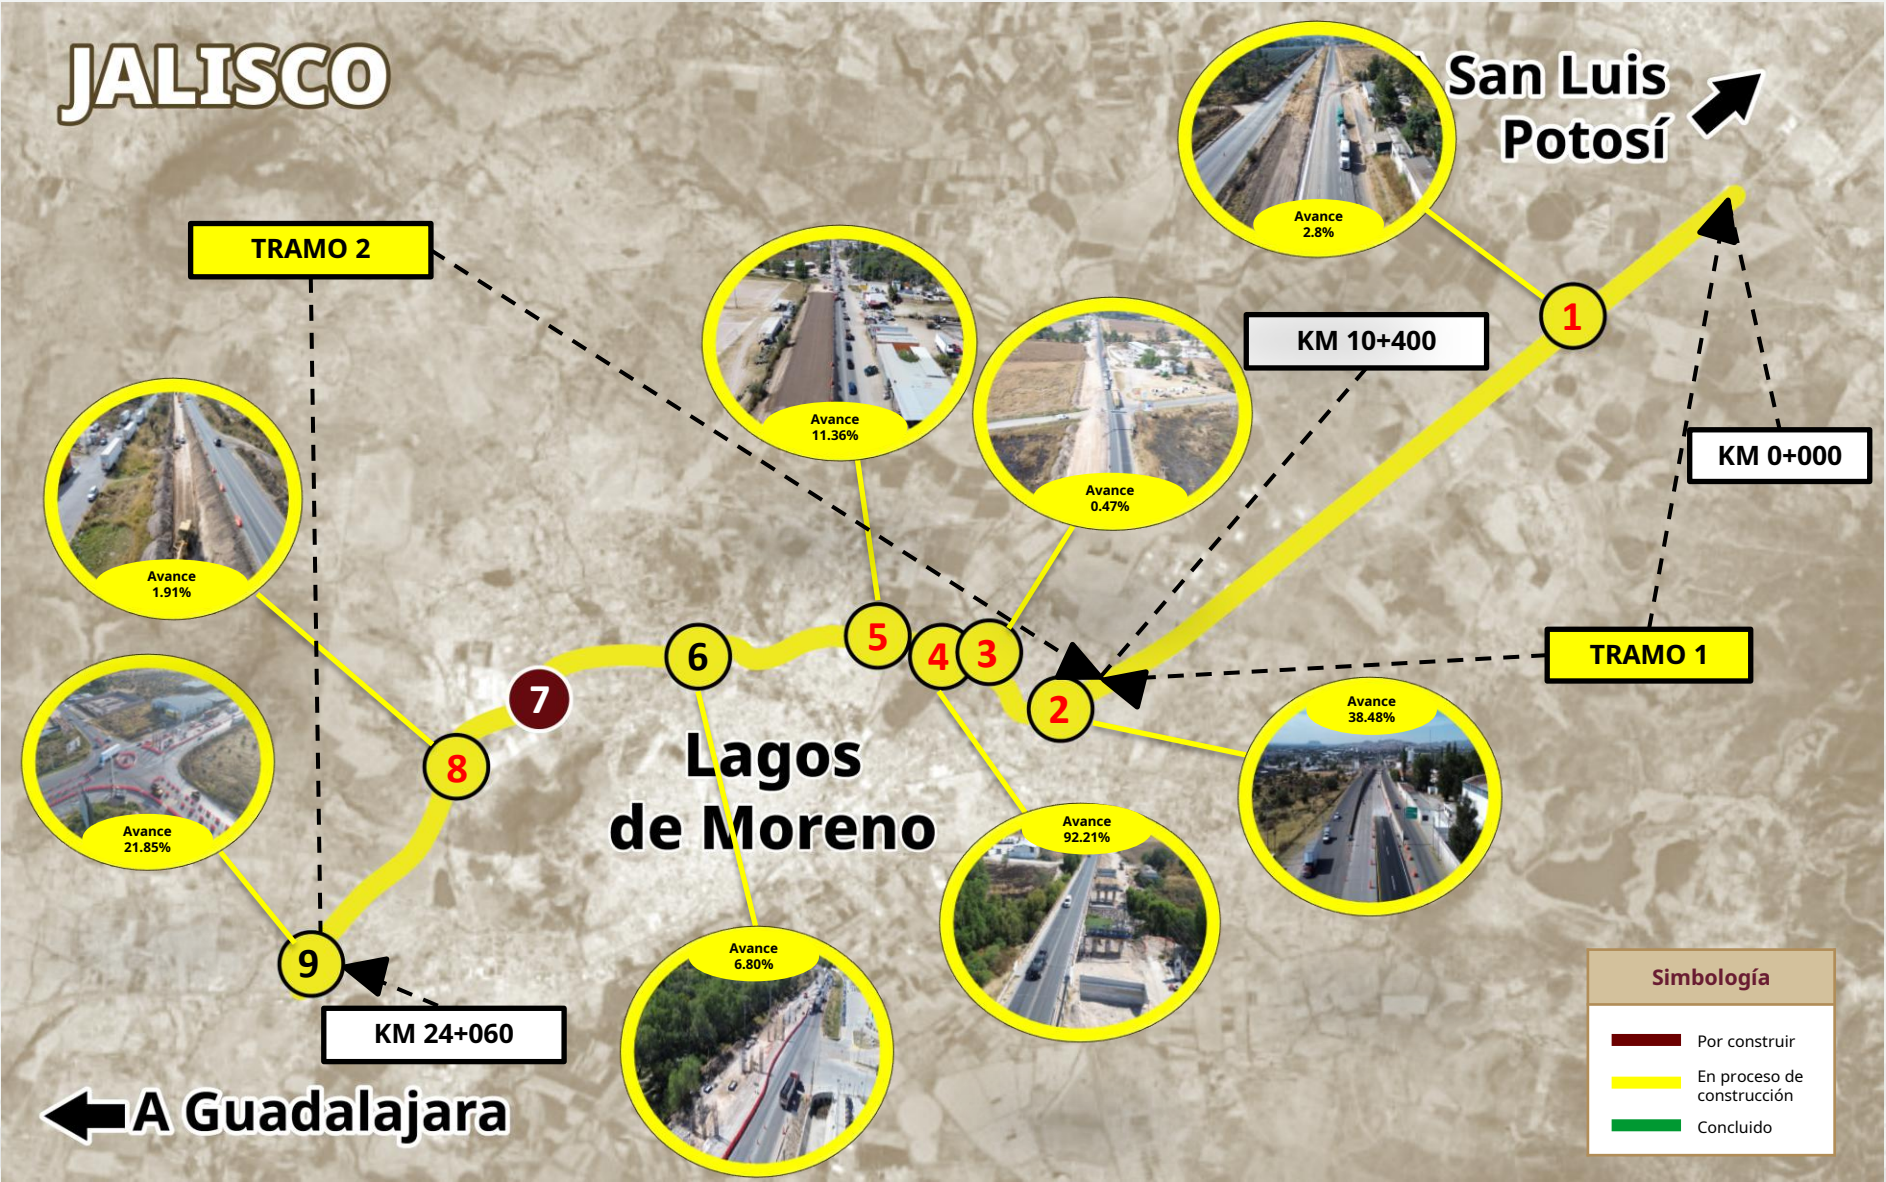

Descripción*	
1	PIV con entronque "El Maguey" km 1+300 - Avance 2.8% . Problemas de DDV. (Modificación de proyecto).
2	Entronque a desnivel Lagos de Moreno Este km 11+800 (adecuación)- Avance 38.48% (Se movió la fuerza de trabajo)
3	PIV con entronque "Fracc. Andalucía" km 12+120 Avance 0.47% . (Se movió la fuerza de trabajo)
4	Puente km 12+450 "Rio Lagos"- Avance 92.21% . (Se movió la fuerza de trabajo)
5	PIV con entronque "Sepúlveda" km 13+620 Avance 11.36% . (Se movió la fuerza de trabajo)
6	PSV con entronque "DRÄXLMAIER" km 15+900 Avance 6.80%
7	PIV con entronque "Encarnación" km 18+200
8	PSFC con retornos km 19+860 Avance 1.91% (Se movió la fuerza de trabajo)
9	PIV con entronque Tipo Glorieta "Lagos de Moreno Oeste" km 23+920 Avance 21.85% .

***Derivado de la Semana Santa las actividades se reactivan el 6 de abril del año en curso**

Avance físico general

- Real: 51.73%
- Programado: 51.32%
- Semanal: 0.07%
- Financiero: 32.60%

 **Inversión: 2,720.20 mdp (C/IVA)**

 **Inicio:** 1 de marzo de 2025
Término: Diciembre 2027

 **Meta:** 24.06 km

 **2,345** empleos directos
4,690 empleos indirectos

 **250,000** habitantes beneficiados


 **20 minutos** de ahorro en tiempo

Jalisco

Ampliación Libramiento Lagos de Moreno

Avance Programado - Físico - Financiero (%)

TRAMO 2 - AVANCE TRONCAL Y ENTRONQUES							
Concepto	Unidad	Total	Ejecutado	Faltante	03/04/26 al 09/04/26		Observaciones
					Programado	Ejecutado	
Terracerías Troncal	%	100%	51.85%	48.15%	0.014	0.65%	En proceso
Obras Inducidas	%	100%	10.61%	89.49%	0.00	0.09%	En proceso
Entronque 23+920	%	100%	21.85%	78.15%	0.00	0.55%	En proceso
Drenaje Troncal	%	100%	16.14%	83.86%	0.00	0.64%	En proceso
Entronque km 15+900	%	100%	6.80%	93.21%	0.00	0.02%	En proceso

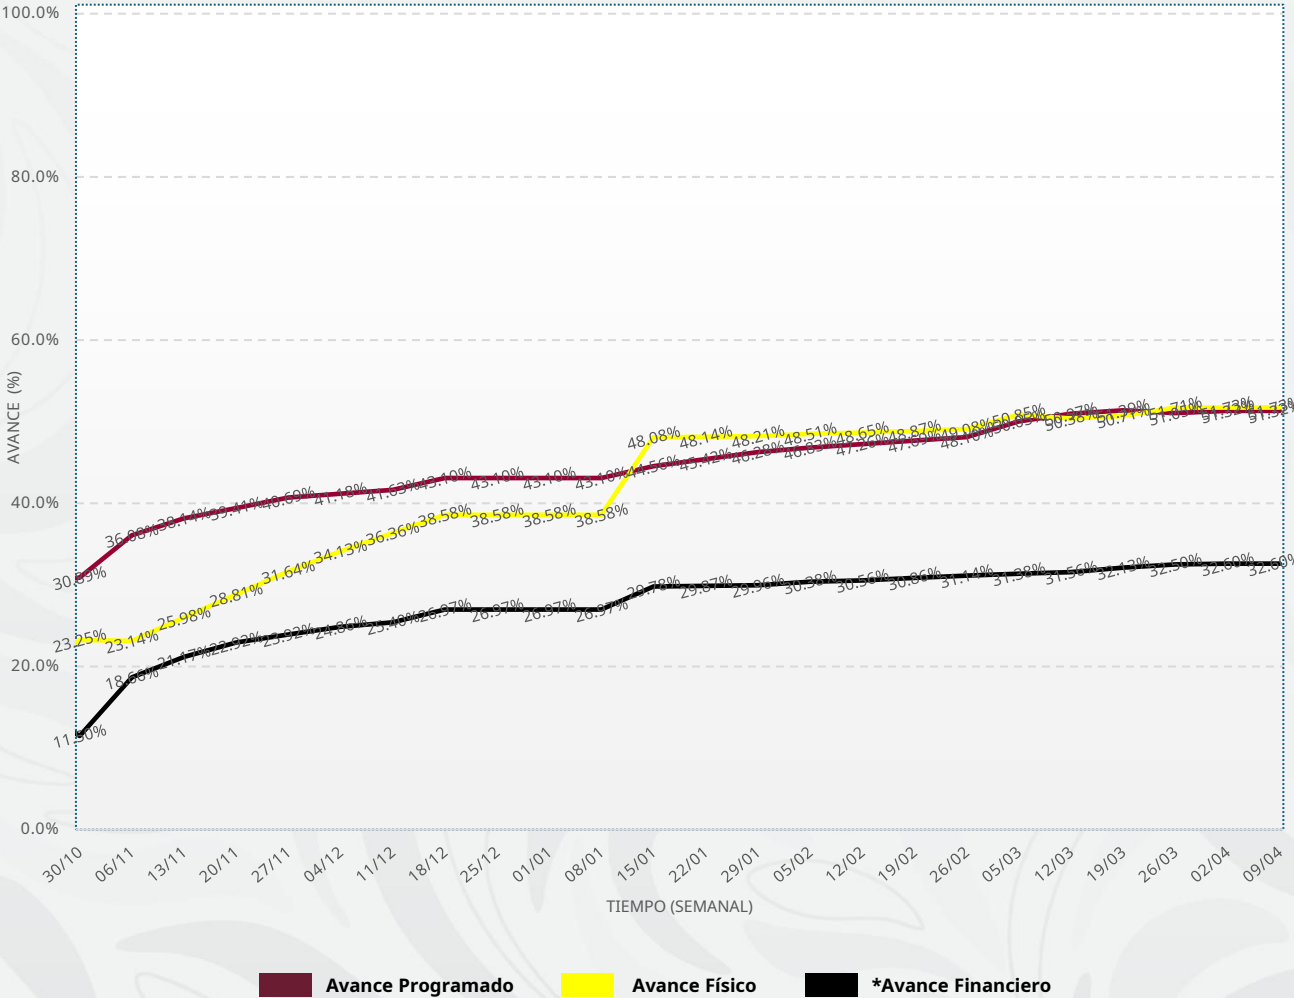

	27 de marzo al 02 de abril	03 de abril al 09 de abril
Fuerza de Trabajo (personas)	246	0
Maquinaria	69	0
