

Veracruz Autopista Cardel - Poza Rica

Laguna Verde-La Mancha



Concesionaria: IDEAL
Constructora: MOTA-ENGIL, S.A. de C.V.

VERACRUZ

PSMA 6.0 4.00X4.50 KM 6+082
obra estructuralmente concluida. En proceso de conformación de enfoque.

PIV 6.8 KM. 6+806
Se observa a nivel de losa colada. se realizan trabajos de colado de losa inferior.


Puente 7.8 km. 7+860
Trabajos de montaje de prelosas en claro nos. 02 al 04. Claro 5 concluido, en proceso de detallado.

Puente 8.7 km. 8+665
a nivel de losa colada.



La Reforma

Soyacautla

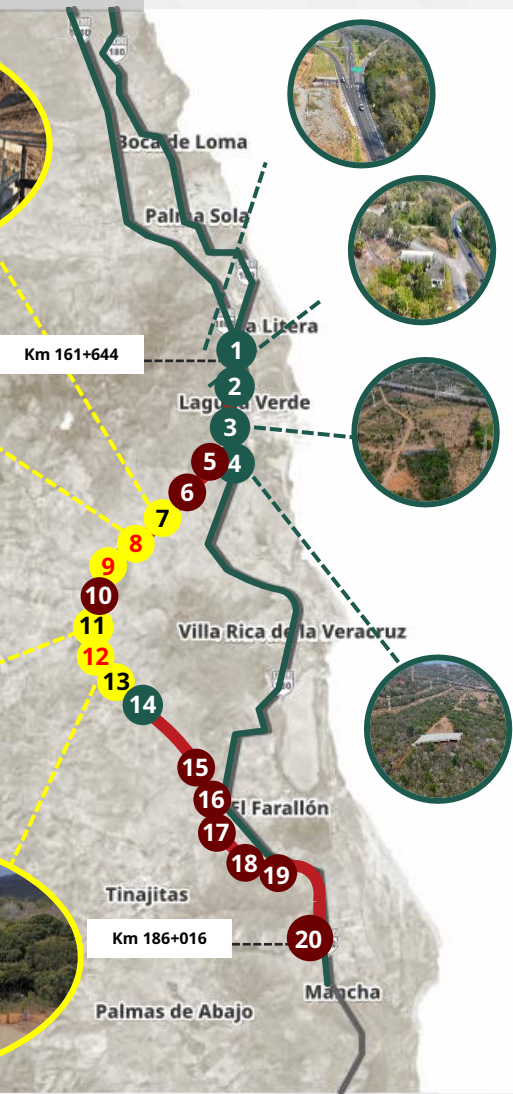

Descripción	
1	Entronque Laguna Verde II Km 0+000
2	PSMA 1.5 Km 1+555.5
3	PSMA 2.7 Km 2+703.91
4	PIV 3.05 Km 3+041
5	Entronque Laguna Verde I Km 3+041
6	PSMA 3.9 Km 3+900
7	PSMA 6.0 Km 6+080 (98.00%)
8	PIV 6.8 Km 6+806 (96.00%) se realizan trabajos de armado de acero de refuerzo para obra de drenaje en rampa de acceso.
9	PIV 7.04 Km 7+040 (5.00%) Se continua con la evaluación de la reubicación de la estructura.
10	PUENTE 7.3 Km 7+330
11	PUENTE 7.8 Km 7+815, (61.70%) Pendiente montaje de trabes en claro no. 01; se realiza el montaje de prelosas en claros nos. 02 al 05.
12	PLAZA DE COBRO Km 8+300, (16.00%) El proyecto ejecutivo está en revisión en la DGDC.
13	PUENTE 8.7 Km 8+665, (96.00%) a nivel de losa colada
14	PSMA 8.9 Km 8+960,
15	PUENTE 14 Km 14+000
16	PUENTE 14.7 Km 14+700
17	PSV Km 14+900
18	PSMA 15.3 Km 15+370
19	PSV 16.8 Km 16+800
20	ENTRONQUE LA MANCHA Km 19+841

Simbología	
	Por construir
	En proceso de construcción
	Concluido

Avance físico

- Programado: 72.98%
- Real: 28.74% Incluye Ent. Chapachapa
- Financiero: 15.64%
- Semanal: 0.45%

Inversión: 2,252.78 mdp

Inicio: Marzo de 2025
Término: Agosto de 2026

Meta: 19.84 km, 5 Puentes, 1 Plaza de Cobro, 3 Entronques, 2 PSVs, 3 PIVs, 6 PSMA, 59 ODTs y el Entronque Chapachapa

2,252.78 (1)=2,253 empleos directos generados/millón de inversión
2,252.78 (2)= 4,506 empleos indirectos generados/millón de inversión

128,000 habitantes beneficiados

45 minutos de ahorro en tiempo, Tramo 4

Veracruz Autopista Cardel - Poza Rica

Laguna Verde-La Mancha

Concesionaria: IDEAL
Constructora: MOTA-ENGIL, S.A. de C.V.



Avance físico

- Real: 100.00%
- Programado: 100.00%
- Financiero: 75.01%
- Semanal: 0.00%


Descripción	
1	Entronque Chapachapa Km 739+733 (Km op. 92+512)
2	ODT 92+827.25
3	PSPyG 92+832.22
4	Ampliación de ODT 100+102,

Veracruz Autopista Cardel - Poza Rica

Laguna Verde-La Mancha

Elemento	Intervención	Ejecutado acumulado	Faltante	02/04/26 al 09/04/26		Observaciones
				Programa do	Ejecutado	
Tramo 4 Laguna Verde - La Mancha						
Volúmenes de obra						
Despalme	229,302.80	74,218.47	155,084.33	7,165.00	1,320.20	El volumen programado corresponde a los 19. 8 km y solo se trabaja en 7.4 km.
Subyacente	162,462.20	61,831.43	100,630.77	27,077.03	3,094.71	El volumen programado corresponde a los 19. 8 km y solo se trabaja en 7.4 km.
Pedraplén	97,038.03	52,313.74	44,724.29	4,043.25	3,059.63	El volumen programado corresponde a los 19. 8 km y solo se trabaja en 7.4 km.
Estructuras Laguna Verde - La Mancha						
Zapata	4	4	0	0	2	PIV 6.8 Km 6+806 Estribo 01 trabajos concluidos.
Losa superior	1	1	0	1	1	PIV 6.8 Km 6+806 a nivel de losa colada.

Avance: Programado, Físico y Financiero (%)

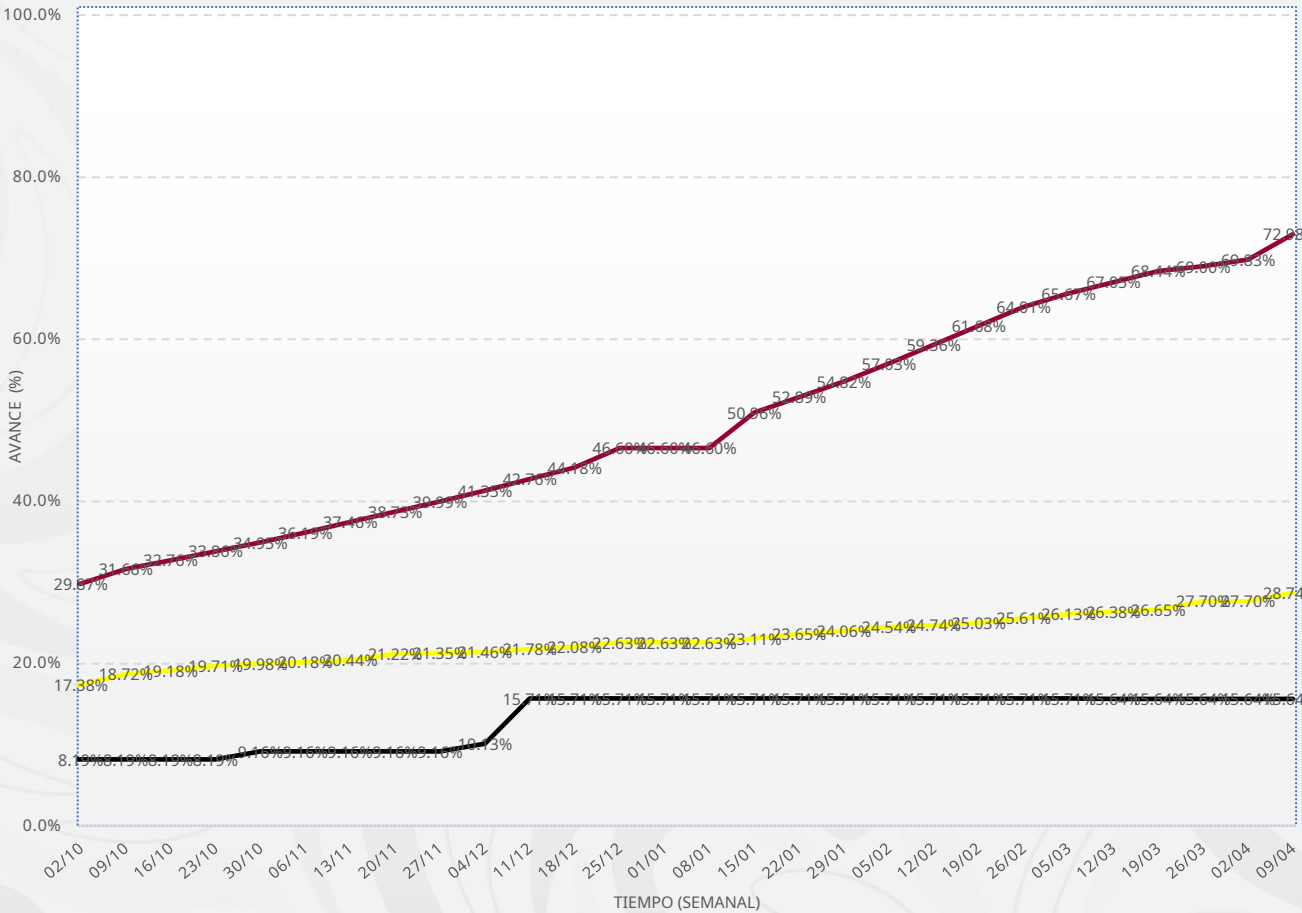

Avance Programado Avance Físico Avance Financiero

	20 de marzo al 26 de marzo	27 de marzo al 02 de abril	03 de abril al 09 de abril
Fuerza de Trabajo (personas)	100	113	113
Maquinaria	18	21	21
