


Michoacán

Lázaro Cárdenas-Nueva Italia

Avance físico

- Programado: 0.00%
 - Real: 0.06%
- Semanal: 0.01 %
 - Financiero: 0.00%

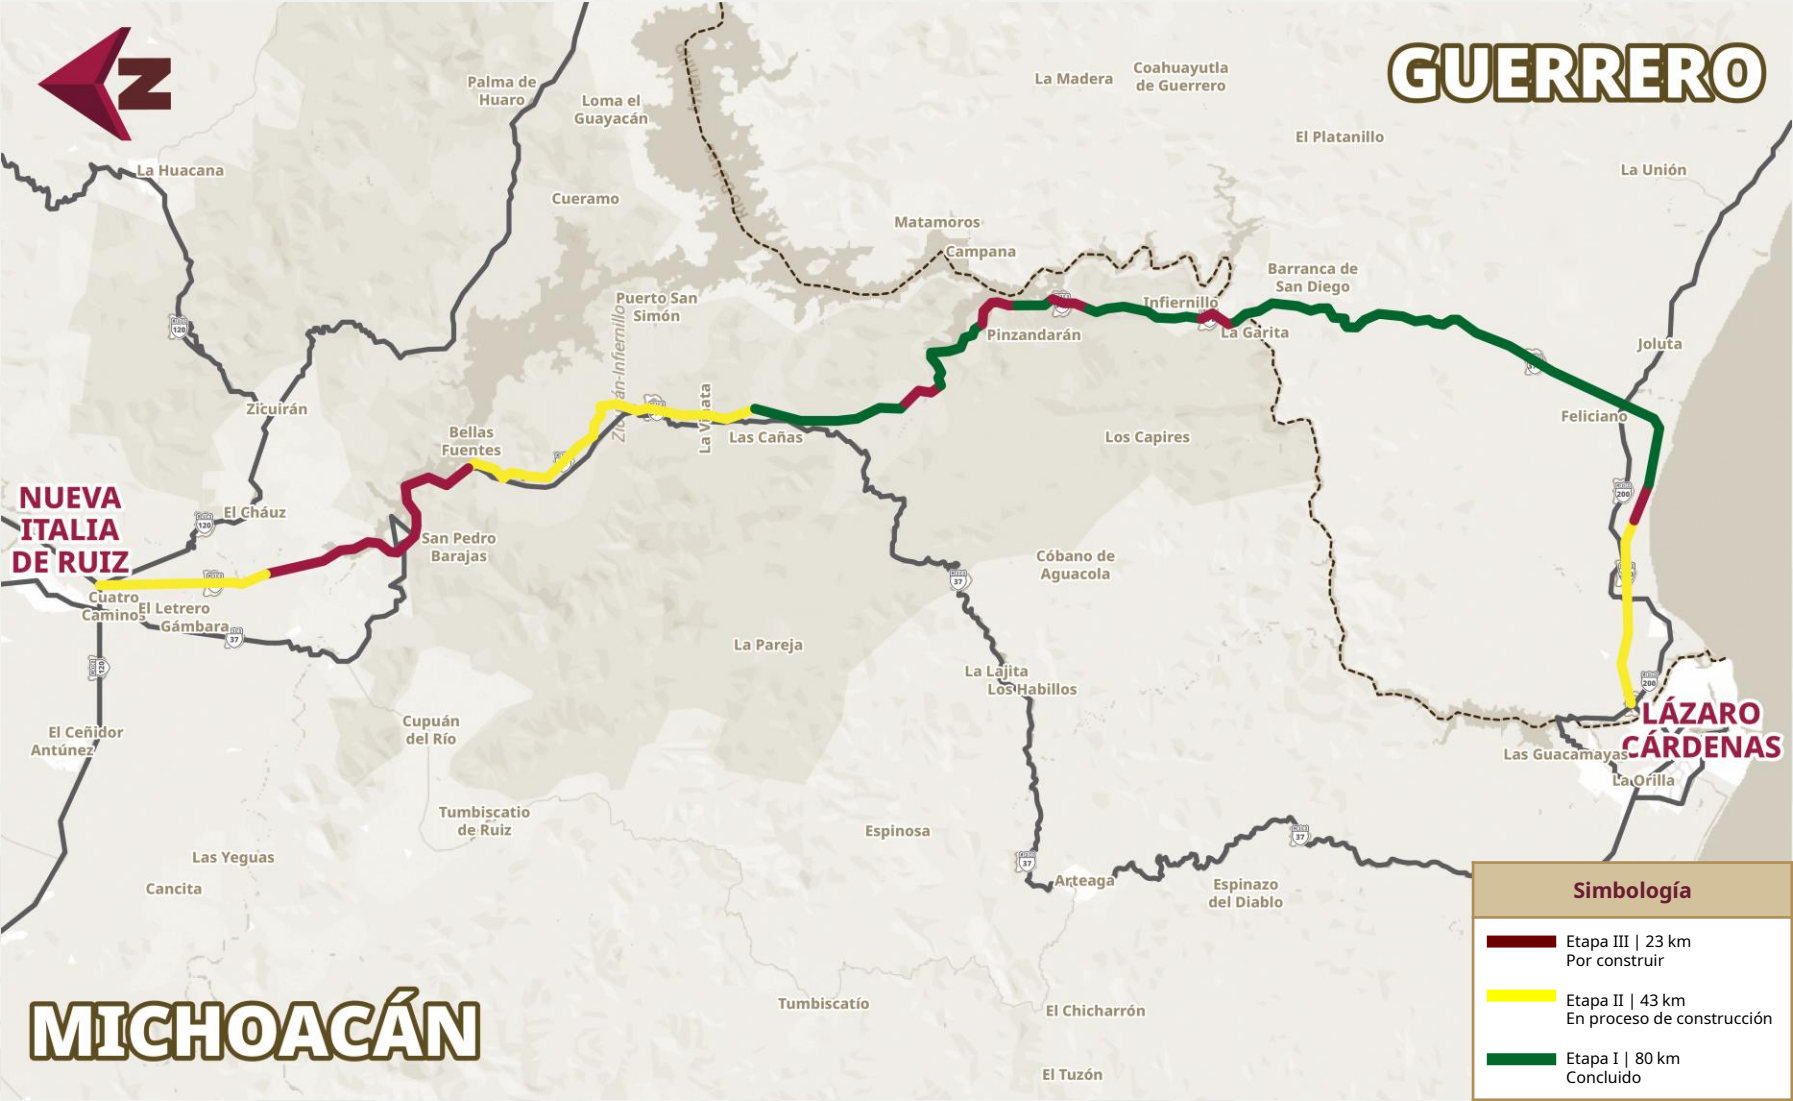

- 

Inversión: 16,000 mdp
- 

Inicio: Marzo 2026
Término: 2029
- 

Meta: 146 km
45 PIV's | 3 PSV's | 28
Puentes de concreto | 5 PSFCC
| 1 Túnel
1 Ampliación de plaza de cobro
3 Puentes de acero (estructuras
complejas)
- 

4,123 empleos generados
- 


**1,800,000 habitantes
beneficiados**

Michoacán

Lázaro Cárdenas-Nueva Italia

Elemento	Meta	Ejecutado acumulable	Faltante	02/04/2026 al 09/04/2026		Observaciones
				Programado	Ejecutado	
Desmante	80.00 km	08.60 km	71.40 km	.300 km	.300 km	

Avance: Programado, Físico y Financiero (%)

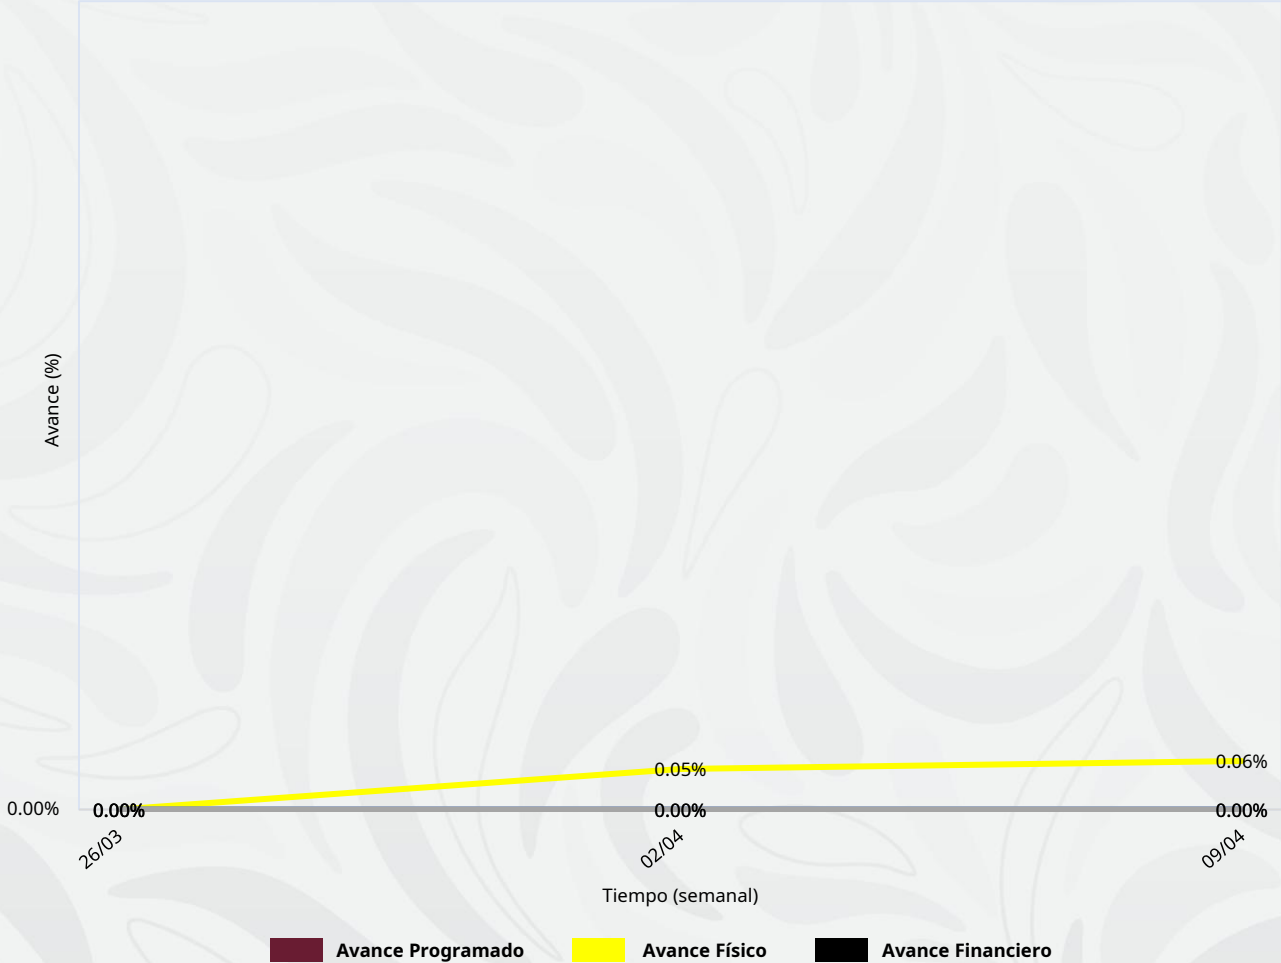

	Del 26 de marzo al 04 de abril de 2026.	Del 02 de abril al 09 de abril de 2026.
Fuerza de Trabajo (personas)	50	50
Maquinaria	20	20
Frente de Trabajo	Actividades de deshierbe y desmante	Actividades de deshierbe y desmante
